

2024—HZZH
0010



徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测总结报告

建设单位：国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司

2024 年 4 月

2024—ZH

0010



徐州平墩 220 伏送出工程项目


水土保持监测总结报告

建设单位：国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司

2024 年 4 月





编号 320100000202107130105



照
执
业
证

统一—社会信用代码

91320100MA1MF6W35M (1/1)

名称 江苏核众环境监测技术有限公司

注册资本 1000万元整

刑 类 有 限 责 任 公 司 (非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 立 法 人 实 体)

成立日期 2016年02月04日

法定代表人 丛俊

营 业 期 限 2016年02月04日至*****

围
抱
背
经

住所 南京市建邺区庐山路168号新地中心二期10层1007室

[illegible]

登记机关

2021年07月13日


[illegible]

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测总结报告


责任页


(江苏核众环境监测技术有限公司)


批准：丛俊（总经理）

核定：张永锦（总工）

审查：戴瑜（高工）

校核：陈学勇（工程师）

项目负责人：樊虹呈（工程师）

编写：樊虹呈（工程师）（参编章节：第 1、2、3、6 章、附图）

黄春清（工程师）（参编章节：第 4、5、7 章、附件）

目 录

前言	1
水土保持监测特性表	3
1 建设项目及水土保持工作概况	5
1.1 建设项目概况	5
1.2 水土流失防治工作情况	8
1.3 监测工作实施情况	14
2 监测内容与方法	19
2.1 扰动土地情况	19
2.2 取土（石、料）、弃土（石、渣）情况	19
2.3 水土保持措施情况	19
2.4 水土流失情况	20
3 重点部位水土流失动态监测	22
3.1 防治责任范围监测	22
3.2 土石方流向情况监测	24
3.3 取土（石、料）监测	27
3.4 弃土（石、料）监测	27
4 水土流失防治措施监测结果	28
4.1 工程措施监测结果	28
4.2 植物措施监测结果	30
4.3 临时措施监测结果	32
4.4 水土保持措施防治效果	34
5 土壤流失情况监测	37
5.1 监测时段划分	37
5.2 水土流失面积	37
5.3 土壤流失量	38
5.4 取土、弃土弃渣潜在土壤流失量	39
5.5 水土流失危害	39
6 水土流失防治效果监测	40

6.1 水土流失治理度	40
6.2 土壤流失控制比	40
6.3 渣土防护率	40
6.4 表土保护率	40
6.5 林草植被恢复率	41
6.6 林草覆盖率	41
7 结论	43
7.1 水土流失动态变化	43
7.2 水土保持措施评价	43
7.3 存在问题及建议	43
7.4 综合结论	44

附件：

- 附件 1 水土保持监测委托函
- 附件 2 水土保持方案批复
- 附件 3 水土保持监测实施方案
- 附件 4 水土保持监测意见书
- 附件 5 水土保持监测季度报告
- 附件 6 水土保持监测影像资料
- 附件 7 项目区施工前后遥感影像对比图

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 线路路径图
- 附图 3 水土保持监测分区及监测点位图

前言

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目位于江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道，为国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司投资建设。本工程为新建输变电工程，工程建设内容为新建架空线路路径长 17.4km，利旧线路路径长约 0.5km，新建杆塔 96 基，拆除杆塔 43 基，新建线路与改造线路均为 220kV 平墩变异地新建配套 110kV 线路工程；新建双回电缆线路路径长 0.1km。具体包括：①110kV 平竹/平沐线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.3km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 11 基；②110kV 平陇 807 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.2km，利旧线路路径长约 0.5km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基；③110kV 平新 805 线/平田线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 18 基，均采用灌注桩基础，新建双回电缆线路路径长 0.1km，采用拉管、电缆沟井的方式敷设，拆除钢管杆 12 基；④110kV 平新 819 线/平马 918 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 16 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 6 基；⑤110kV 平盛线线路改造工程：新建双回架空线路长约 3.3km，新建钢管杆 20 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基。

本工程总投资为 6024 万元（未决算），其中土建投资 1205 万元。本工程总占地面积 42330m²，其中永久占地 2085m²，临时占地 40245m²；本工程土石方挖填总量 30732m³，开挖土石方量 15366m³（其中表土剥离量 8284m³），回填土石方量 15366m³（其中表土回覆量 8284m³），无余方，无借方。本工程于 2023 年 2 月开工，2023 年 11 月完工，总工期 10 个月。

2023 年 1 月，受建设单位国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司委托，江苏核众环境监测技术有限公司（以下简称我单位）承担了本工程的水土保持监测工作。接受委托后，我单位立即组织水土保持监测专业人员成立了水土保持监测小组，全面开展资料收集和现场踏勘，并于 2023 年 1 月编制完成了《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测实施方案》，随后，监测人员按照委托要求和实施方案的相关要求，在国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司、工程监理单位、施工单位及相关部门的大力支持和协助下，通过实地测量、资料分析以及无人机低空遥感监测对工程建设活动造成的地表扰动区域面

积、水土流失状况及其危害情况、水土保持措施实施进度、已有水土保持设施的运行情况及防护效果进行全面监测。

本工程水土保持监测工作于 2024 年 1 月结束，监测人员总计进行现场监测 4 次，出具水土保持监测意见书 4 份，形成监测季度报告表 3 份。监测工作结束后，经过资料整理和分析后，监测组于 2024 年 2 月，编制完成《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测总结报告》。

根据水土保持监测结果，建设单位对施工过程中地表扰动区域实施了相应的水土保持工程措施和临时措施，在施工活动结束后，实施了植物措施，最终形成了工程措施、植物措施、临时措施相结合的水土流失防治体系。根据监测推算，监测期间土壤流失量约为 24.16t，其中施工期约为 23.67t，试运行期约为 0.49t。水土流失六项防治目标实际完成值如下：水土流失治理度为 99.3%，达到 95%的目标值；土壤流失控制比为 1.4，达到 1.0 的目标值；渣土防护率为 99.2%，达到 99%的目标值；表土保护率为 97.2%，达到 95%的目标值；林草植被恢复率为 98.5%，达到 97%的目标值；林草覆盖率为 92.8%，达到 27%的目标值。

根据《水利部办公厅进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）文件内容，在 4 次的监测过程中，我单位对现场监测的三色评价情况进行打分，2023 年第一季度得分为 96 分，2023 年第二季度得分为 94 分，2024 年第一季度得分为 96 分，均为“绿色”评价。

我单位在监测工作中，得到了建设单位以及有关监理单位、施工单位的大力支持和协助，在此谨表谢意！

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标				
项目名称		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目		
建设规模	本工程新建架空线路路径长 17.4km，利旧线路路径长约 0.5km，新建杆塔 96 基，拆除杆塔 43 基；新建双回电缆线路路径长 0.1km。具体包括： ①110kV 平竹/平沐线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.3km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 11 基； ②110kV 平陇 807 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.2km，利旧线路路径长约 0.5km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基； ③110kV 平新 805 线/平田线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 18 基，均采用灌注桩基础，新建双回电缆线路路径长 0.1km，采用拉管、电缆沟井的方式敷设，拆除钢管杆 12 基； ④110kV 平新 819 线/平马 918 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 16 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 6 基； ⑤110kV 平盛线线路改造工程：新建双回架空线路长约 3.3km，新建钢管杆 20 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基。	建设单位、联系人	国网江苏省电力有限公司 徐州供电分公司、 刘新	
		建设地点	江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道	
		所属流域	淮河流域	
		工程总投资	6024 万元（未决算）	
		工程总工期	10 个月/2023.2-2023.11	
水土保持监测指标				
监测单位		江苏核众环境监测技术有限公司	联系人及电话	陈学勇 13905177625
自然地理类型		平原	防治标准	北方土石山区 一级标准
监测内容	监测指标	监测方法（设施）	监测指标	监测方法（设施）
	1.水土流失状况监测	实地测量、资料分析	2.防治责任范围监测	实地测量、资料分析、 无人机低空遥感监测
	3.水土保持措施情况监测	实地测量、资料分析、 无人机低空遥感监测	4.防治措施效果监测	实地测量、资料分析、 无人机低空遥感监测
	5.水土流失危害监测	实地测量、资料分析	水土流失背景值	150t/（km ² ·a）
方案设计防治责任范围		43327m ²	土壤容许流失量	200t/（km ² ·a）
水土保持投资		172.68 万元	侵蚀模数达到值	145t/（km ² ·a）
防治措	分区	工程措施	植物措施	临时措施
	塔基区	表土剥离 7542m ³ 土地整治 24625m ²	撒播草籽 10682m ²	泥浆沉淀池 96 座 密目网苫盖 9000m ²

水土保持监测特性表

施							土质排水沟 1540m 土质沉沙池 24 座	
	牵张场及跨越场区		土地整治 7650m ²		撒播草籽 5053m ²		彩条布铺垫 4100m ² 铺设钢板 3400m ²	
	施工临时道路区		土地整治 3580m ²		撒播草籽 1069m ²		铺设钢板 3100m ²	
	电缆施工区		表土剥离 226m ³ 土地整治 894m ²		撒播草籽 833m ²		泥浆沉淀池 1 座 密目网苫盖 300m ²	
	拆除区		表土剥离 516m ³ 土地整治 4386m ²		撒播草籽 1405m ²		密目网苫盖 2100m ²	
监 测 结 论	防 治 效 果	分类指标	目标值	达到值	实际监测数量			
		水土流失治理度	95%	99.3%	水土流失治理达标面积	42047m ²	水土流失总面积	42330m ²
		土壤流失控制比	1.0	1.4	治理后每平方公里年平均土壤流失量	145t/km ² ·a	容许土壤流失量	200t/km ² ·a
		渣土防护率	99%	99.2%	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量	15250m ³	永久弃渣和临时堆土总量	15366m ³
		表土保护率	95%	97.2%	保护的表土数量	11644m ³	可剥离表土总量	11979m ³
		林草植被恢复率	97%	98.5%	林草类植被面积	19042m ²	可恢复林草植被面积	19325m ²
		林草覆盖率	29%	92.8%	林草类植被面积	19042m ²	防治责任范围总面积（已扣除恢复耕地）	20520m ²
	水土保持治理达标情况		根据实地调查，并结合监测数据统计分析，本工程水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率达等六项防治目标均已达到了水土保持方案的要求。					
	总体结论		各项防治措施实施到位，满足设计要求，达到预期效果。					
主要建议		对已完成的水土流失防治措施加强管护；注意植物养护工作，以保证发挥其水土保持作用。						
水土保持“三色”评价			根据本工程水土保持监测结果，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，在 3 次的监测过程中，2023 年第一季度得分为 96 分，2023 年第二季度得分为 94 分，2024 年第一季度得分为 96 分，本工程总体评价为“绿色”。 					

1 建设项目及水土保持工作概况

1.1 建设项目概况

1.1.1 项目基本情况

1.1.1.1 地理位置

本工程位于江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道。

1.1.1.2 建设性质

本工程属于新建输变电工程。

1.1.1.3 工程规模

本工程共新建架空线路路径长 17.4km，利旧线路路径长约 0.5km，新建杆塔 96 基，拆除杆塔 43 基；新建双回电缆线路路径长 0.1km。具体包括：①110kV 平竹/平沐线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.3km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 11 基；②110kV 平陇 807 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.2km，利旧线路路径长约 0.5km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基；③110kV 平新 805 线/平田线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 18 基，均采用灌注桩基础，新建双回电缆线路路径长 0.1km，采用拉管、电缆沟井的方式敷设，拆除钢管杆 12 基；④110kV 平新 819 线/平马 918 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 16 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 6 基；⑤110kV 平盛线线路改造工程：新建双回架空线路长约 3.3km，新建钢管杆 20 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基。

1.1.1.5 工程占地

本工程分为塔基区、牵张场及跨越场区、施工临时道路区、电缆施工区和拆除区。根据监测结果，工程累计扰动地表 42330m²。其中，永久占地 2085m²，包括塔基区和电缆施工区永久占地；临时占地 40245m²，包括塔基区临时占地、牵张场及跨越场区、施工临时道路区和电缆施工区临时占地。

1.1.1.6 土石方工程量

本工程挖填方总量 30732m³，开挖土石方量 15366m³（其中表土剥离量 8284m³），回填土石方量 15366m³（其中表土回覆量 8284m³），无余方，无借方。

1.1.1.7 工程投资与工期

工程建设总投资 6024 万元（未决算），其中土建投资 1205 万元。本工程由国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司投资建设。本工程于 2023 年 2 月开工，2023 年 11 月完工，共计 10 个月。

1.1.2 项目区概况

1.1.2.1 地形地貌

本工程位于江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道，区域地貌单元为冲积平原，地形平坦，地貌类型单一，地面高程一般为 14.0~55.0m（1985 国家基准高程，下同）。沿线大部分以农田、绿化带和空闲地为主，交通便利。

1.1.2.2 气象

项目区属于暖温带半湿润季风气候，气候温和，冬冷夏热，光照充足，四季分明。根据根据徐州新沂市 1956~2020 年气象资料统计数据，项目区多年气象要素情况如下。

表 1-1 工程项目区域气象特征值一览表

项目	内容		单位	新沂市
气温	平均	全年	°C	14.1
	极值	最高	°C	39.9
		最低	°C	-22.4
降水	平均	多年	mm	867.9
	最大年降水	多年	mm	1356.0
	最大月降水量	多年	mm	565.5
	24 小时最大降雨量	多年	mm	256.7mm
	1 小时最大降雨量	多年	mm	63.5
雷暴日数	平均雷暴日数	多年	d	29.6
相对湿度	多年平均		%	74
风速	多年年均		m/s	2.8
风向	全年主导风向		/	E
无霜期	全年		d	225
积雪深度	最大积雪深度		cm	20

1.1.2.3 水文

新沂市境内流域性河湖有沐河、沂河、新沂河、中运河、骆马湖，俗称“四河一湖”，堤防总长 222km；区域性河道有老沂河、浪青河、新戴运河、新墨河、臧圩河、黄墩河、大沙河、淋头河、白马河、新开河、泥墩沟等 17 条，河道总

长 374km，其中白马河、浪青河、新墨河、臧圩河、黄墩河属郯新边界河，新开河、泥墩沟属新沐边界河。

本工程线路主要跨越臧圩河。臧圩河发源于山东省郯城县袁堂附近，介于柳沟河与老沐河之间，由北向南，流入新沂市，于小马庄附近汇入新墨河，流域面积为 86.5km²，其中省界以下为 42.3km²，河流全长 18.47km，流入该河的支流，省界以上有大房沟、小房沟、羊红公路东沟。

1.1.2.4 地质、地震

本工程所在地地基土主要由第四系全新统及上更新统冲积、湖积成因的粉质黏土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土夹粉砂及粉砂等组成，表层分布人工堆积成因的素填土。

根据《中国地震动参数区划图》的规定，项目区所在场地的基本地震动峰值加速度为 0.20g（相应的地震基本烈度为Ⅶ度），基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.40s。

1.1.2.5 土壤、植被

徐州市地处江苏省西北部、华北平原东南部，地势平缓。通过现场勘察，项目区内土壤类型主要为黄潮土。项目沿线主要占用绿化带、耕地和空闲地，表土厚度约 0.3m，项目区实际可剥离表土面积 41467m²，可剥离表土量为 12440m³。

项目区植被类型以常绿落叶阔叶混交林为主，当地生树种主要有漆树、毛叶欧李、野核桃、羽叶泡桐、无患子、重阳木等。常见树种主要有栎树、石楠、毛白杨、意杨、国槐、臭椿、楝树、黄连木、大叶黄杨、海桐、紫薇、木槿、紫穗槐等。草本植物主要有黑麦草、牛尾草、羊茅、黄背茅、青香茅、白茅、狗尾草等。根据实地调查统计，项目区林草覆盖率约为 40%。

1.1.2.6 水土流失情况

本项目区所在地徐州市新沂市新安街道、墨河街道，根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，项目区属于属于北方土石山区——华北平原区——淮北平原岗地农田防护保土区——徐宿平原土壤保持农田防护区；根据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》的公告（苏水农〔2014〕48 号），新安街道属于江苏省省级水土流失重点治理区，墨河街道属于江苏省省级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目水土流失防治标准应执行北方土石山区一级标准。根据《土

壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），本工程建设区流失的主要类型为水力侵蚀，容许土壤侵蚀模数为 $200t/(km^2 \cdot a)$ 。

根据江苏省水土流失遥感普查成果及区域水土保持规划相关资料，结合现场勘察收集的项目区地形地貌、土地类型、降雨情况、土壤母质、植被覆盖等基本情况，以及向当地水利部门和群众了解情况，综合分析确定该区的平均侵蚀模数为 $150t/(km^2 \cdot a)$ ，属微度水力侵蚀。

1.2 水土流失防治工作情况

1.2.1 建设单位水土保持管理情况

（1）管理机构

项目在建设过程中，成立了以建设单位、设计单位、主体监理单位、水土保持监测和施工单位在内的工程水土保持工作小组。

水土保持工作小组负责本工程水土保持工作实施计划的编制及组织实施；水土保持管理制度的制定；提供相关水土保持设备，协助布设水土保持设施，开展日常水土保持工作，收集有关水土保持数据；统计、分析、审核、汇编水土保持工作成果；定期进行总结报告编写；编写、审核、发送责任范围内的水土保持工作检查。保证各项工作按照批复的水土保持报告表和相关要求贯彻实施。各参建单位设置水土保持专职人员，负责水土保持各项日常管理工作。

表 1-2 水土保持工作小组组成表

工作小组单位			职责
组长	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	建设单位	总体协调、组织
成员	江苏省送变电有限公司	施工单位	水土保持措施施工
	国网经济技术研究院有限公司	设计单位	水土保持措施设计、工艺管控
	国网江苏电力工程咨询有限公司	监理单位	水土保持措施及投资落实情况监管
	江苏核众环境监测技术有限公司	监测单位	水土保持措施落实情况监测

（2）工作制度

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司将水土保持工作当做贯彻落实国家生态绿色工程建设的重要举措，水土保持工作与工程主体工作同等重要。在工程建设过程中，水土保持工作与主体工程贯彻“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”要求。在施工过程中保护生态环境，减少水土流失。

1) 建设单位

本项目建设单位为国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司，建设单位在建设过程中：

①建立健全工程水土保持工作管理体系，配备水土保持管理专职人员，负责本单位及受委托工程建设项目的水土保持管理工作。

②组织招投标工作，与各相关方签订合同。

③制订工程水土保持管理文件，并组织实施；审批业主项目部报审的水土保持管理策划文件；组织水土保持设计审查和交底工作；结合本单位安全质量培训，同步组织水土保持知识培训。

④依据批复的水土保持方案报告以及水土保持方案变更管理办法要求，组织梳理和收集工程重大水土保持变更情况（若有），及时上报重大设计变更情况和变更依据。

⑤组织水土保持专项验收。

⑥对于工程各级水土保持行政主管部门开展的检查，统一组织迎检，对提出的问题，组织限期整改并将整改情况书面报送主管部门。

⑦督促业主项目部落实工程项目的水土保持管理工作，组织或委托业主项目部开展工程项目水土保持管理评价考核工作。

⑧负责工程项目档案管理的日常检查、指导，组织工程项目档案的移交工作。

2) 设计单位

本项目设计单位为国网经济技术研究院有限公司，设计单位在主体工程和水土保持设计过程中：

①建立健全水土保持设计质量管理体系，执行水土保持设计文件的校审和会签制度，确保水土保持设计质量。

②依据批复的工程水土保持方案，与主体设计同时开展水土保持设计工作，设计深度满足水土保持工程建设要求。

③接受项目设计监理的管理，按照设计监理要求开展水土保持设计工作。

④按照批复的水土保持方案和重大水土保持变更管理办法要求，核实主体设计施工图的差异，并对差异进行详细说明，并及时向相关建设管理单位和前期水土保持方案编制单位反馈信息。

⑤在现场开展水土保持竣工自验收时，结合水土保持实施情况，提出水土保持目标实现和工程水土保持符合性说明文件，确保工程水土保持设施符合设计要

求。

⑥配合或参与现场工程水土保持检查、水土保持监督检查、各阶段各级水土保持验收工作、水土保持事件调查和处理等工作。

3) 监理单位

本项目水土保持监理由主体工程监理单位国网江苏电力工程咨询有限公司代为进行，监理单位在建设过程中，严格履行以下职责和制度：

①技术文件审核、审批制度。监理单位应依据合同约定对施工图纸和施工单位提供的施工组织设计、开工申请报告等文件进行审核或审批。

②材料、构配件和工程设备检验制度。监理单位应对进场的材料、苗木、籽种、构配件及工程设备出厂合格证明、质量检测报告进行核查，并责令施工或采购单位负责将不合格的材料、构配件和工程设备在规定时限内运离工地或进行相应处理。

③工程质量检验制度。施工单位每完成一道工序或一个单元、分部工程都应进行自检，合格后方可报监理单位进行复核检验。上一单元、分部工程未经复核检验或复核检验不合格，不应进行下一单元、分部工程施工。

④工程计量与付款签证制度。按合同约定，所有申请付款的工程量均应进行计量并经监理单位确认。未经监理单位签证的工程付款申请，建设单位不应支付。

⑤工地会议制度。工地会议由总监理工程师或总监理工程师代表主持，相关各方参加并签到，形成会议纪要需分发与会各方。工地例会每月定期召开一次，水土保持工程参建各方负责人参加，由总监理工程师或总监理工程师代表主持，并形成会议纪要。会议应通报工程进展情况，检查上一次工地例会中有关决定的执行情况，分析当前存在的问题，提出解决方案或建议，明确会后应完成的任务。监理单位应根据需要，主持召开工地专题会议，研究解决施工中出现的涉及工程质量、工程进度、工程变更、索赔、安全、争议等方面的专门问题。

⑥工作报告制度。监理单位应按双方约定的时间和渠道向建设单位提交项目监理月报（或季报、年度报告）；在单位工程或单项工程验收时提交监理工作报告，在合同项目验收时提交监理工作总结报告。

⑦工程验收制度。在施工单位提交验收申请后，监理单位应对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关规定或合同约定，参与、协助建设单位组织工程验收。

4) 施工单位

本项目主体工程以及水土保持设施施工单位为江苏省送变电有限公司。施工单位有完整的、运转正常的质量保证体系，各项管理制度完整，质检部门的人员配备能满足工程现场质量管理工作的需要；认真执行国家和行业的有关工程质量的监督、检查、验收、评定方面的方针、政策、条例、法规、规程、规范、标准和设计单位提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件等；遵守业主发布的各项管理制度，接受业主、施工监理部的质量监督和检查；做好监理中的配合工作和监理后整改工作；工程开工前有针对性的制定工程的实施方案及实施纲要、施工组织设计（包括总设计、专业设计）、质量验评范围划分表、图纸会审纪要、技术交底记录、质量通病的预防计划（质量工作计划）、重点项目、关键工序的质量保证措施施工方案，上述各项需在开工前提交给施工监理部审核，监理部在开工前送业主审批，以取得业主的认可，经监理部、业主认可方可进行正式施工；在进场后施工前向施工监理部报送质保体系和质检人员的名单和简历、特种作业和试验人员的名单及持证证号，以备案与复查；按规定做好施工质量的分级检验工作，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法；按规定做好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，并努力做到施工计量器具与检验计量器具分开；对业主和施工监理部发出的《工程质量问题通知单》、《不符合项通知单》等整改性文件认真及时处理，并按规定的程序，及时反馈；按规定做好质量记录事故的登录、一般质量事故的调查、分析、处理和重大质量事故的上报工作；及时做好各项工程施工质量的统计工作，并在规定时间内送往施工监理部审阅，施工监理部汇总后报送业主，其内容包括质量验评、技术检验和试验、施工质量问题、设备与原材料质量问题以及次月质量工作计划。

5) 监测单位

本项目水土保持监测单位为江苏核众环境监测技术有限公司。水土保持监测单位按照水土保持有关技术标准和水土保持方案的要求，根据不同生产建设项目的特点，明确监测内容、方法和频次，调查获取项目区水土流失背景值，定量分析评价自项目动土至投产使用过程中的水土流失状况和防治效果，及时向生产建设单位提出控制施工过程中水土流失的意见建议。

(3) 执行情况

1) “三同时”制度落实情况

根据水土保持方案与主体工程同步实施的原则，本工程水土保持方案与主体工程同时设计。参照主体工程施工进度，国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司将各项水土保持措施的实施进度与相应的主体工程进度相衔接，使各防治区内的水土保持措施与主体工程同时实施，相互协调，有序进行。由于水土保持措施的实施有些受季节因素影响，水土流失的发生在不同部位、不同时段具有不同的特点，因此以工程措施为先，植物措施随后。通过合理安排，水土保持设施与主体工程同时完工，同时投产。

2) 管理制度落实情况

本工程实行项目经理负责制，现场成立施工项目部，建立工程现场管理组织机构，组织建立相关施工责任制和各种专业管理体系并组织落实各项管理组织和资源配置，制订了施工制度、安全、质量及造价管理实施计划，对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等有关要求执行情况进行了检查、分析及纠偏。并组织落实了安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求，保障了项目各项管理活动的开展和落实。受国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司委托，由主体工程监理单位国网江苏电力工程咨询有限公司代为进行本项目水土保持监理工作。监理部实行总监负责制，监理部在管理模式上采用组织机构，实行总监理工程师负责制。工程开工时监理小组即入驻现场，同时开展水土保持专项监理工作。工程自开工以来，监理小组定期对施工现场水土保持工作开展情况进行专项检查，检查内容通过监理通知单形式要求施工单位进行整改，以设计图纸为准侧，深入施工现场开展质量管控，重点对雨水排水系统以及场地恢复情况等方面进行了质量管控。严格监理制度的实施，确保了工程建设过程各项水土保持措施的顺利落实。

1.2.2 水土保持方案编制与报送情况

2021 年 12 月，国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司委托江苏辐环环境科技有限公司负责本工程水土保持方案编报工作。

2022 年 5 月，编制单位完成了《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持方案报告表》，并送省库专家函审。根据函审意见，编制单位对报告进行了修改，最后形成《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持方案报告表》报批稿。

2022 年 5 月 24 日，新沂市行政审批局以《关于准予徐州平墩 220 千伏变

江苏核众环境监测技术有限公司

站 110 千伏送出工程项目水土保持方案的行政许可决定》（新行审批〔2022〕水保 21 号）文件，对本工程水土保持方案进行了批复。

1.2.3 水土保持后续设计及变更情况

（1）后续设计情况

本工程水土保持方案编制设计为初步设计阶段。建设单位坚持贯彻执行水土保持“三同时”制度，将已批复的水土保持方案报告表中的各项水土保持措施纳入施工图设计中，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）变更情况

依据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）对本项目变更情况进行了筛查，从筛查结果看，本项目不涉及重大变更，筛查结果详见表 1-3。

表 1-3 项目水土保持变更情况筛查情况表

序号	《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）	方案设计情况	本工程实际情况	变化是否达到变更报批条件
1	第十六条：水土保持方案经批准后存在下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报原审批部门审批	/	/	/
1.1	工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的	本工程不涉及	项目地点未发生变化，本工程不涉及。	项目地点未发生变化，涉及相关区域与批复的方案一致，未达到变更报批条件
1.2	水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上的	方案设计水土流失防治责任范围为 43327m ² ；方案设计的开挖填筑土石方总量为 31136m ³ 。	实际水土流失防治责任范围为 42330m ² ；实际开挖填筑土石方总量为 30732m ³ 。	水土流失防治责任范围较方案设计减少了 997m ² 、减少了 2.30%，未达到变更报批条件；开挖填筑土石方总量较方案设计减少了 404m ³ 、减少了 1.30%，未达到变更报批条件
1.3	线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过 300 米的长度累计达到该部分线路长度 30%以上的	不涉及	不涉及	未达到变更报批条件
1.4	表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上的	方案设计表土剥离量为 8296m ³ ；方案设计植物措施总面积为 20106m ² 。	实际表土剥离量为 8284m ³ ；实际植物措施总面积为 19042m ² 。	表土剥离量较方案设计减少了 12m ³ 、减少了 0.14%，未达到变更报批条件；植物措施总面积较方案设计减少了 1064m ² 、减少了 5.29%，未达到变更报批条件
1.5	水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的	方案设计工程措施、植物措施和临时措施相结合	经验收组现场核查，实际水土保持重要单位工程措施体系较为完善，不存在可能导致水土保持功能显著降低或丧失的变化	未达到变更报批条件
2	第十七条 在水土保持方案确定的弃渣场以外新设	本工程不涉及弃渣场	本工程不涉及弃渣场	未达到变更报批条件

序号	《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）	方案设计情况	本工程实际情况	变化是否达到变更报批条件
	弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批。			

1.2.4 水土保持监测意见落实情况

2023年2月-2024年1月，我单位进行了4次现场监测，给建设单位提交了4份现场监测意见书，列出我单位现场监测中发现的良好现状以及不足之处。

表 1-4 现场监测意见及整改落实情况表

监测情况		整改情况	
监测日期	监测意见	整改日期	整改内容
2023.1.15	现场未开工，项目区地貌单元为冲积平原，沿线主要占地类型为耕地、交通运输用地和其他土地，现场植被情况良好。	/	/
2023.3.19	塔基正在基础施工，现场施工情况良好。	/	/
2023.5.8	塔基正在基础施工，临时堆土及现场裸露地表未及时苫盖。	2023.5.11	施工回复：已对现场临时堆土及裸露地表增加苫盖
2024.1.15	现场已完工，场地已进行恢复，各防治分区土地整治后进行了复耕及植被恢复，目前植被恢复良好。	/	/

我单位列出在4次现场监测中发现的良好现状以及不足之处，向建设单位提交了4份现场监测意见书。建设单位在收到监测意见书后，通知施工单位针对现场监测中不足之处作出整改，整改后现场情况良好。

1.2.5 水行政部门监督检查意见落实情况

本工程施工过程未收到水行政部门监督检查意见。

1.2.6 重大水土流失危害事件处理情况

本工程建设过程中建设单位加强管理，施工活动对周边造成的影响较小，未造成水土流失危害事件。

1.3 监测工作实施情况

1.3.1 监测实施方案编制与实施

2023年1月，国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司委托我单位开展水土保持监测工作。接受委托后，我单位领导高度重视，立即组织人员成立监测项目组，并及时赴项目所在地进行现场查勘，收集工程的相关基础资料。在参考本江苏核众环境监测技术有限公司

工程水土保持方案后，依据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）等法规标准的要求，监测小组于 2023 年 1 月编制完成了《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测实施方案》，随之开展水土保持监测工作。

在监测过程中，通过现场调查监测和查阅施工监理资料，了解并掌握项目区水土流失与水土保持状况，在此基础上，整理分析，编制完成水土保持监测总结报告。

1.3.2 监测项目部与监测人员

为做好该工程水土保持监测，保证监测质量，该工程水土保持监测实施项目负责人负责制，项目组成员分工负责制。该工程水土保持监测项目部设总监测工程师 1 名，监测工程师 1 名，监测员 1 名。监测成员统计见表 1-5：

表 1-5 监测项目组成员及分工

职位名称	姓名	职称	职责
总监测工程师	戴 瑜	高级工程师	项目组负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量。
监测工程师	樊虹呈	工程师	负责数据的采集汇总、校核和分析。
监测员	黄春清	工程师	完成监测数据的采集和整理。

1.3.3 监测点布设

水土保持监测实施中的监测点位布设结合水土流失防治分区选取易产生水土流失，且具有一定代表性的部位进行重点监测。监测点布设如下：

（1）塔基区：在塔基区采取实地测量、资料分析和无人机低空遥感监测，主要监测该区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。

（2）牵张场及跨越场区：在牵张场及跨越场区采取实地测量、资料分析和无人机低空遥感监测，主要监测该区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。

（3）施工临时道路区：在施工临时道路区采取实地测量、资料分析和无人机低空遥感监测，主要监测该区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。

（4）电缆施工区：在电缆施工区采取实地测量、资料分析和无人机低空遥感监测，主要监测该区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水

土流失防治效果、后期植被恢复等内容。

(5) 拆除区：在拆除区采取实地测量、资料分析和无人机低空遥感监测，主要监测该区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。

各区监测点布设见表 1-7。

表 1-7 本工程水土保持监测点位布设表

序号	监测分区	监测方法	监测点性质	监测内容
1	塔基区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测塔基区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
2	牵张场及跨越场区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测牵张场及跨越场区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
3	施工临时道路区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测施工临时道路区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
4	电缆施工区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测电缆施工区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复等内容。
5	拆除区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测拆除区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。

1.3.4 监测设施设备

根据《实施方案》及现场水土保持监测需要，本次水土保持监测工作中有针对性投入了各类监测设备和交通辅助设备，这些设备充分满足了本工程水土保持监测工作的需要，具体监测设备投入统计情况见表 1-6。

表 1-6 本工程水土保持监测设备表

序号	设备	单位	数量	备注
1	个人便携式电脑	台	3	笔记本 3 台
2	数码相机	台	2	
3	数码摄像机	套	1	摄像机、存储介质
4	激光打印机	台	2	黑白、彩色各 1 台
5	记录本、笔	套	10	

序号	设备	单位	数量	备注
6	标识牌	副	2	
7	GPS 面积测量仪	部	1	
8	无人机低空遥感监测设备	套	1	大疆精灵 4Pro
9	无人机低空遥感监测成图软件	套	1	PIX4Dmapper
10	安全帽	顶	3	
11	越野车	台	1	

1.3.5 监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定要求，结合项目区的地形、地貌及侵蚀类型，采用实地测量、资料分析以及无人机低空遥感监测等方法。

（1）实地测量

根据主体工程建设进度，通过现场实地勘测，采用 GPS 面积测量仪、数码相机等工具按标段测定不同类型的地表扰动面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施实施情况。

（2）资料分析

收集项目区气象资料以及主体工程设计、施工以及监理等资料，并对资料进行分析，于现场监测情况进行复核，确定水土保持措施类型、工程量等。

（3）无人机低空遥感监测

利用 pix4Dcapture 软件编辑无人机飞行任务，将编辑好的任务保存后上传到无人机云台，通过现场无人机飞行获取详细航拍照片，飞行结束后将无人机照片导入电脑特定文件夹，利用 pix4Dmapper 软件完成拼接，随后利用 Arc GIS 软件进行项目区扰动面积解译。基于高分辨率遥感影像，通过现场勾绘和人机交互解译，对工程建设的扰动范围、强度、土石方量、水土流失程度及区域生态环境影响等进行宏观监测。

1.3.6 监测成果提交情况

在监测过程中，监测人员进场 4 次，编制完成水土保持监测季度报告表 3 份，出具水土保持监测意见书 4 份，现场监测记录资料以及现场影像资料若干。根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号），水土保持监测实施方案在 2023 年 1 月提交给建设单位；

水土保持监测季度报告在每季度结束后一个月内提交给建设单位；水土保持监测意见则在每次监测结束后 7 天内提交给建设单位。

截至目前已完成的主要阶段性监测成果资料如下：

（1）《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测实施方案》（2023 年 1 月）

（2）《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测季报（2023 年第一季度）》

（3）《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测季报（2023 年第二季度）》

（4）《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测季报（2024 年第一季度）》

（5）《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测意见书》

（6）《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目》高精度影像资料

除以上成果之外，还包括现场照片等。监测工作结束后，经过资料整理和分析后，监测人员在 2024 年 2 月编制完成《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持监测总结报告》。

1.3.7 重大水土流失危害事件处理情况

经调查，本工程在施工及试运行期间未发生水土流失危害事件。

2 监测内容与方法

2.1 扰动土地情况

扰动土地情况采用实地测量、资料分析与遥感监测相结合的方法。根据水土保持方案，结合施工组织设计和平面布置图，利用 GPS 面积测量仪等工具，实地测量沿线各防治分区的扰动面积、位置，同时使用无人机低空遥感监测，并利用软件对影像资料进行解译，通过对比工程施工、监理等资料，经过复核后，最终得出总扰动面积。

扰动土地监测情况详见表 2-1。

表 2-1 扰动土地情况的监测一览表

防治分区	监测频次	监测方法
塔基区	共计 4 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
牵张场及跨越场区	共计 2 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
施工临时道路区	共计 4 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
电缆施工区	共计 2 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
拆除区	共计 2 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析

2.2 取土（石、料）、弃土（石、渣）情况

本工程未设置取土场和弃土场，所需的回填土方均来自工程各个区域本身的挖方。现场监测主要对土方的挖填数量、堆放地方、堆放高度以及土方利用去向等采用了资料分析和实地量测等方法。

表 2-2 弃渣情况监测一览表

序号	监测指标	监测方法
1	开挖土方数量、位置、面积	实地测量、资料分析
2	挖方去向	实地测量、资料分析
3	土方临时堆放位置	实地测量、资料分析
4	堆土数量及堆高	实地测量、资料分析
5	土方回填数量、位置、面积	实地测量、资料分析

2.3 水土保持措施情况

（1）工程措施监测

在查阅施工（竣工）图、施工组织设计、工程监理等资料基础上，结合水土保持方案，进行实地调查，核查各监测分区是否按照水土保持方案实施排水、土地整治等水土保持工程措施；对已实施工程措施现场查勘完好程度、水土流失防治效果和运行状况等。

(2) 植物措施监测

包括植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率。在查阅施工（竣工）图、施工组织设计、工程监理等资料基础上，结合水土保持方案，进行实地调查，核查各监测分区是否按照水土保持方案实施绿化、植被恢复等水土保持植物措施；选择有代表性的地块布设监测样地，现场调查成活率、保存率、覆盖度等指标。

项目区林草覆盖度利用高精度 GPS 定位，结合 GIS 分析技术，采用抽样调查和测量等方法进行监测。即选择有代表性的地块，确定调查地样方，先现场量测、计算植被覆盖度，再计算出场地的林草覆盖度。

(3) 临时措施监测

根据收集施工阶段过程影像资料 and 施工组织设计，结合水土保持方案，通过实地调查，查阅施工组织设计等资料确认施工进度和工程量，及时掌握临时措施的类型、位置、数量和防治效果等。

2.4 水土流失情况监测

2.4.1 土壤侵蚀及土壤流失量监测

通过实地调查、遥感监测法监测，结合施工、监理资料，对监测区内不同施工工艺的区域进行调查，并在平面布置图中进行标注，反映内容包括土壤侵蚀类型、形式和分布情况。

结合施工组织方案，通过现场实地勘测，结合地形图、遥感监测，按不同地貌类型分区测定扰动地表类型及扰动面积，调查施工阶段每个扰动类型区的基本特征（扰动土地类型、开挖面坡长、坡度）及水土保持措施（排水沟、沉沙池、土地整治工程、植被恢复等）实施情况。

2.4.2 水土流失危害监测

水土流失危害数量监测采实地调查、询问的方法。通过对比分析相关指标，评价和估算危害大小。水土流失状况监测包括水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；各监测分区及其重点对象的土壤流失量等。通过实地调查、遥感监测，结合现场调查监测成果，及工程施工布置图，对监测区内不同施工工艺的区域进行调查，反映内容包括土壤侵蚀类型、形式和分布情况。

表 2-3 水土流失情况的监测内容方法

监测指标	监测频次	监测方法
水土流失类型、形式	共计 1 次	实地测量、资料分析
水土流失面积	共计 4 次	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
土壤流失量	共计 4 次	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
水土流失危害	灾害事件发生后 1 周内	实地测量、资料分析

2.4.3 无人机低空遥感监测

本项目主要采用无人机对工程现场进行清晰的影像采集,后期通过监测影像的对比分析,了解项目水土流失现状及水土保持措施实施的情况。此法可大大提高监测效率及监测安全性,并可提供良好的全覆盖监测视角,使监测工作更加全面。通过遥感影像解译,获取各分区不同时段扰动范围,为确定工程防治责任范围提供帮助。

2.4.4 监测频次

我公司于 2023 年 1 月开始开展水土保持监测工作,监测人员总计进行现场监测 4 次,本工程水土流失主要采用实地测量、资料分析和无人机低空遥感监测的监测方法,监测该区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复。

表 2-4 各防治分区监测内容、方法及频次

防治分区	监测频次	监测内容	监测方法
塔基区	共 4 次	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
牵张场及跨越场区	共 2 次	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
施工临时道路区	共 4 次	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
电缆施工区	共 2 次	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复等内容。	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
拆除区	共 2 次	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测

3 重点部位水土流失动态监测

3.1 防治责任范围监测

3.1.1 方案确定的防治责任范围

根据新沂市行政审批局批复的水土保持方案报告表,本工程水土流失防治责任范围为 43327m²,包括塔基区、牵张场及跨越场区、施工临时道路区、电缆施工区和拆除区。

表 3-1 水土保持方案确定的防治责任范围 单位: m²

防治分区	永久占地	临时占地	防治责任范围	占地类型		
				耕地	交通运输用地	其他土地
塔基区	2251	24121	26372	14010	3297	9065
牵张场及跨越场区	0	9000	9000	3000	0	6000
施工临时道路区	0	3440	3440	2400	0	1040
电缆施工区	2	513	515	0	0	515
拆除区	0	4000	4000	2800	0	1200
合计	2253	41074	43327	22210	3297	17820

3.1.2 监测实际防治责任范围

本工程建设过程中,防治责任范围动态监测主要对工程建设中永久占地和临时占地的面积进行跟踪监测。监测方法主要采用实地测量、料分析和无人机低空遥感影像解译对项目防治责任范围进行全面调查。根据现场实地勘查,结合工程施工图设计及征占地资料查阅,本工程实际扰动面积为 42330m²。各分区实际扰动面积详见表 3-2。

表 3-2 实际发生的防治责任范围 单位: m²

防治分区	永久占地	临时占地	防治责任范围	占地类型		
				耕地	交通运输用地	其他土地
塔基区	2081	23735	25816	13930	3019	8867
牵张场及跨越场区	0	7650	7650	2550	0	5100
施工临时道路区	0	3580	3580	2468	0	1112
电缆施工区	4	894	898	0	0	898
拆除区	0	4386	4386	2958	0	1428
合计	2085	40245	42330	21906	3019	17405

注:本工程占用的其他土地为空闲地;耕地为旱地;交通运输用地为绿化带。

3.1.3 防治责任范围变化情况

实际发生的工程水土流失防治责任范围较新沂市行政审批局批复方案界定

的防治范围减少了 997m²。项目水土流失防治责任范围情况详见表 3-3。

表 3-3 水土流失防治责任范围变化情况表 单位: m²

防治分区	方案设计 (①)			监测结果 (②)			增减情况 (②-①)		
	永久占地	临时占地	防治责任范围	永久占地	临时占地	防治责任范围	永久占地	临时占地	防治责任范围
塔基区	2251	24121	26372	2081	23735	25816	-170	-386	-556
牵张场及跨越场区	0	9000	9000	0	7650	7650	0	-1350	-1350
施工临时道路区	0	3440	3440	0	3580	3580	0	140	140
电缆施工区	2	513	515	4	894	898	2	381	383
拆除区	0	4000	4000	0	4386	4386	0	386	386
合计	2253	41074	43327	2085	40245	42330	-168	-829	-997

各区变化原因如下:

(1) 塔基区

方案编制阶段考虑新建 20 基角钢塔, 76 基钢管杆, 塔基区占地 26372m²。实际施工阶段, 新建 18 基角钢塔, 78 基钢管杆, 由于杆塔型号发生变化, 且用于堆放施工材料及土方的区域面积减少, 因此该区占地面积较方案设计减少了 556m²。

(2) 牵张场及跨越场区

方案编制阶段牵张场及跨越场区占地 9000m², 计划布设牵张场 6 处, 占地面积为 1200m²; 计划布设跨越场 15 处, 占地面积为 120m²。实际施工阶段, 布设牵张场数量与方案一致, 施工时严格控制地面扰动, 平均每处占地面积为 1000m²; 布设跨越场数量与方案一致, 平均每处占地为 110m², 因此最终该区占地面积较方案设计减少了 1350m²。

(3) 施工临时道路区

方案编制阶段开辟施工临时道路长 860m, 宽 4m, 施工临时道路区占地 3440m²。实际施工阶段, 由于新增 3 基杆塔拆除, 开辟的临时道路长 895m, 较方案设计增加 35m, 宽度不变; 因此该区占地面积较方案设计增加了 140m²。

(4) 电缆施工区

方案编制阶段电缆施工区占地 515m²。实际施工阶段, 拉管两端由于施工的需求, 用于堆放施工材料及土方的区域面积增加, 施工扰动范围增大, 因此最终该区占地面积较方案设计增加了 383m²。

(5) 拆除区

方案编制阶段拆除区占地 4000m^2 。实际施工阶段，新增 3 基杆塔拆除，施工扰动范围增大，因此最终该区占地面积增加 386m^2 。

3.1.4 防治责任范围遥感监测情况



图 3-1 塔基区施工范围遥感影像

3.2 土石方流向情况监测

3.2.1 方案设计弃土弃渣情况

根据已批复的水土保持方案报告表，该工程共计挖方量为 15568m^3 （含表土剥离量 8296m^3 ，基础开挖量 7272m^3 ），填方量 15568m^3 （含表土回覆量 8296m^3 ，基础回填量 7272m^3 ），无余方，无借方。项目区土石方平衡情况见表 3-4。

表 3-4 项目区土石方平衡情况表 单位： m^3

防治分区	挖方量			填方量			余方量	借方量
	表土剥离	基础开挖	合计	表土回覆	基础回填	合计		
塔基区	7661	6149	13810	7661	6149	13810	0	0
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0
施工临时道路区	0	0	0	0	0	0	0	0
电缆施工区	155	203	358	155	203	358	0	0
拆除区	480	920	1400	480	920	1400	0	0
合计	8296	7272	15568	8296	7272	15568	0	0

3.2.2 土石方流向监测结果

本项目土石方挖填总量为 30732m^3 ，其中挖方 15366m^3 （表土剥离量 8284m^3 ，基础开挖量 7082m^3 ），填方 15366m^3 （表土回覆量 8284m^3 ，基础回填量 7082m^3 ），无余方，无借方。

项目区土石方平衡监测情况见表 3-5。

表 3-5 项目分区土石方平衡监测结果一览表 单位: m³

防治分区	挖方量			填方量			余方量	借方量
	表土剥离	基础开挖	合计	表土回覆	基础回填	合计		
塔基区	7542	5890	13432	7542	5890	13432	0	0
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0
施工临时道路区	0	0	0	0	0	0	0	0
电缆施工区	226	203	429	226	203	429	0	0
拆除区	516	989	1505	516	989	1505	0	0
合计	8284	7082	15366	8284	7082	15366	0	0

3.2.3 土石方变化情况

设计和实际监测结果详细对比情况见表 3-6。

表 3-6 方案设计土石方情况与实际监测情况对比表 单位: m³

分区	方案设计①						监测结果②						增减情况②-①					
	开挖		合计	回填		合计	开挖		合计	回填		合计	开挖		合计	回填		合计
	表土剥离	基础开挖		表土回覆	基础回填		表土剥离	基础开挖		表土回覆	基础回填		表土剥离	基础开挖		表土回覆	基础回填	
塔基区	7661	6149	13810	7661	6149	13810	7542	5890	13432	7542	5890	13432	-119	-259	-378	-119	-259	-378
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施工临时道路区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电缆施工区	155	203	358	155	203	358	226	203	429	226	203	429	71	0	71	71	0	71
拆除区	480	920	1400	480	920	1400	516	989	1505	516	989	1505	36	69	105	36	69	105
小计	8296	7272	15568	8296	7272	15568	8284	7082	15366	8284	7082	15366	-12	-190	-202	-12	-190	-202

各防治分区土石方变化原因如下：

(1) 塔基区

实际施工阶段，由于该区占地面积减少，施工中对植被良好的区域进行表土剥离，表土剥离面积减少，因此实际表土剥离量为 7542m^3 ，较方案设计减少了 119m^3 ；剥离的表土全部回填，表土回覆量较方案设计减少 119m^3 ；实际施工时，由于杆塔型式发生变化，2 基角钢塔调整为钢管杆，基础挖方量为 5890m^3 ，较方案设计减少了 259m^3 ；基础开挖的土方全部回填，基础回填量较方案设计减少 259m^3 ；综上所述塔基区实际挖方量和回填量均较方案设计减少 378m^3 。

(2) 电缆施工区

实际施工阶段，由于该区占地面积增加，虽然施工中仅对占用植被良好的区域进行表土剥离，对占压区域进行苫盖，但表土剥离总面积增加，因此实际表土剥离量为 226m^3 ，较方案设计增加了 71m^3 ，剥离的表土全部回填，因此表土回覆量增加了 71m^3 ；实际施工时，新建电缆土建通道长度不变，因此基础挖方量和回填量与方案一致；综上所述电缆施工区实际挖方量和回填量均较方案设计增加 71m^3 。

(3) 拆除区

实际施工阶段，由于该区占地面积增加，施工中对植被良好的开挖区域进行表土剥离，表土剥离面积增加，因此实际表土剥离量为 516m^3 ，较方案设计增加了 36m^3 ，剥离的表土全部回填，因此表土回覆量增加 36m^3 ；实际施工时，由于新增 3 基杆塔拆除，基础挖方量为 989m^3 ，较方案设计增加了 69m^3 ，基础开挖的土方全部回填，因此基础回填量增加 69m^3 ；综上所述拆除区实际挖方量和回填量均较方案设计增加 105m^3 。

3.3 取土（石、料）监测

本工程回填所需土方均来自工程本身的基础开挖方，不设置专门的取土场。

3.4 弃土（石、料）监测

本工程开挖土方均回填于工程防治责任范围内，未产生弃方，不设置弃渣场。

4 水土流失防治措施监测结果

4.1 工程措施监测结果

4.1.1 工程措施设计情况

根据《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持方案报告表》，项目各分区工程措施设计情况如下：

表 4-1 工程措施方案设计情况统计表

防治分区	措施内容	单位	工程量设计情况
塔基区	表土剥离	m ³	7661
	土地整治	m ²	25163
牵张场及跨越场区	土地整治	m ²	9000
施工临时道路区	土地整治	m ²	3440
电缆施工区	表土剥离	m ³	155
	土地整治	m ²	513
拆除区	表土剥离	m ³	480
	土地整治	m ²	4000

4.1.2 工程措施实施情况

根据施工组织设计资料及现场调查监测分析，本工程水土保持工程措施实施情况表 4-2。

表 4-2 工程措施实施情况监测结果统计表

防治分区	措施内容	单位	工程量实施情况
塔基区	表土剥离	m ³	7542
	土地整治	m ²	24625
牵张场及跨越场区	土地整治	m ²	7650
施工临时道路区	土地整治	m ²	3580
电缆施工区	表土剥离	m ³	226
	土地整治	m ²	894
拆除区	表土剥离	m ³	516
	土地整治	m ²	4386

4.1.3 监测结果及变化原因分析

4.1.3.1 监测结果

经现场勘察，建设单位对本工程各分区实施了相关水土保持工程措施，具体实施情况与方案设计对比情况见表 4-3，相关工程措施实施效果见图 4-1。

表 4-3 工程措施实施变化情况

防治分区	措施内容	单位	方案设计	实际实施	增减情况	实施位置	实施时间
塔基区	表土剥离	m ³	7661	7542	-119	植被良好的区域	2023.2-2023.7
	土地整治	m ²	25163	24625	-538	除硬化外裸露地表	2023.7-2023.10
牵张场及跨越场区	土地整治	m ²	9000	7650	-1350	全区	2023.9-2023.10
施工临时道路区	土地整治	m ²	3440	3580	140	全区	2023.7-2023.10
电缆施工区	表土剥离	m ³	155	226	71	植被良好的区域	2023.7-2023.8
	土地整治	m ²	513	894	381	除硬化外裸露地表	2023.10
拆除区	表土剥离	m ³	480	516	36	植被良好的开挖区域	2023.8-2023.9
	土地整治	m ²	4000	4386	386	全区	2023.9-2023.10



图 4-1 工程措施实施照片

4.1.3.2 变化原因分析

(1) 塔基区

实际施工阶段，由于该区占地面积减少，施工中对植被良好的区域进行表土剥离，表土剥离面积减少，因此实际表土剥离量为 7542m³；实际施工阶段，由于杆塔型号发生变化，施工扰动范围减少，因此土地整治面积较方案设计减少 538m²。

(2) 牵张场及跨越场区

实际施工阶段，布设牵张场数量与方案一致，施工时严格控制扰动范围，平均每处占地面积为 1000m²，较方案设计减少 200m²；布设跨越场数量与方案一致，

平均每处占地为 110m^2 ，较方案设计减少 10m^2 ；该区占地面积减少了 1350m^2 ，因此后期土地整治面积较方案设计减少 1350m^2 。

（3）施工临时道路区

实际施工阶段，新增 3 基杆塔拆除，开辟的临时道路长 895m ，较方案设计增加 35m ，宽度不变，该区占地面积增加 140m^2 ，因此后期土地整治面积较方案设计增加 140m^2 。

（4）电缆施工区

实际施工阶段，由于该区占地面积增加，虽然施工中仅对植被良好的区域进行表土剥离，对占压区域进行苫盖，但是表土剥离总面积增加，因此最终表土剥离量较方案设计增加 71m^3 ；实际施工时，由于施工扰动范围增大，施工后期对除硬化外裸露区域全部进行了土地整治，因此最终土地整治面积较方案设计增加 381m^2 。

（5）拆除区

实际施工阶段，由于该区占地面积增加，虽施工中对植被良好的区域进行表土剥离，表土剥离面积增加，因此实际表土剥离量为 516m^3 ，较方案设计增加了 36m^3 ；实际施工时，由于新增 3 基杆塔拆除，施工扰动范围增大，施工后期对裸露区域全部进行了土地整治，因此最终土地整治面积较方案设计增加 386m^2 。

4.2 植物措施监测结果

4.2.1 植物措施设计情况

根据《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持方案报告表》，项目各分区植物措施设计情况如下：

表 4-4 植物措施方案设计情况统计表

防治分区	措施内容	单位	工程量设计情况
塔基区	撒播草籽	m^2	11353
牵张场及跨越场区	撒播草籽	m^2	6000
施工临时道路区	撒播草籽	m^2	1040
电缆施工区	撒播草籽	m^2	513
拆除区	撒播草籽	m^2	1200

4.2.2 植物措施实施情况

根据查阅施工组织设计资料及现场调查监测分析，工程水土保持植物措施实

施情况表 4-5。

表 4-5 植物措施实施情况监测结果统计表

防治分区	措施内容	单位	工程量实施情况
塔基区	撒播草籽	m ²	10682
牵张场及跨越场区	撒播草籽	m ²	5053
施工临时道路区	撒播草籽	m ²	1069
电缆施工区	撒播草籽	m ²	833
拆除区	撒播草籽	m ²	1405

4.2.3 监测结果及变化原因分析

4.2.3.1 监测结果

工程建设过程中，建设单位参照水土保持方案设计，对本工程各个分区实施了相关水土保持植物措施，具体实施情况与方案设计对比情况见表 4-6，相关植物措施实施效果见图 4-2。

表 4-6 植物措施实施变化情况

防治分区	措施内容	单位	方案设计	实际实施	增减情况	实施位置	实施时间
塔基区	撒播草籽	m ²	11353	10682	-671	占用绿化带和空闲地除硬化外区域	2023.9-2023.11
牵张场及跨越场区	撒播草籽	m ²	6000	5053	-947	占用空闲地区域	2023.10-2023.11
施工临时道路区	撒播草籽	m ²	1040	1069	29	占用空闲地区域	2023.9-2023.11
电缆施工区	撒播草籽	m ²	513	833	320	占用空闲地除硬化外区域	2023.11
拆除区	撒播草籽	m ²	1200	1405	205	占用空闲地区域	2023.11

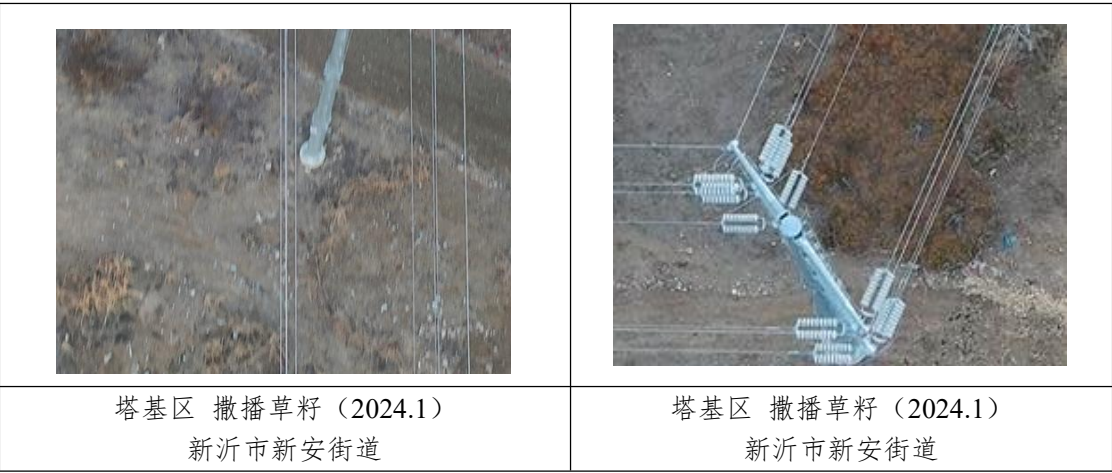


图 4-2 植物措施实施照片

4.2.3.2 变化原因分析

(1) 塔基区

实际施工阶段，该区占地面积减少，占用绿化带和空闲地区域面积减少，可恢复植被面积减少，因此撒播草籽面积较方案设计减少 671m²。

(2) 牵张场及跨越场区

实际施工阶段，该区占地面积减少，占用空闲地区域面积减少，可恢复植被面积减少，因此撒播草籽面积较方案设计减少 947m²。

(3) 施工临时道路区

实际施工阶段，该区占地面积增加，占用空闲地区域面积增加，可恢复植被面积增加，因此撒播草籽面积较方案设计增加 29m²。

(4) 电缆施工区

实际施工阶段，该区占地面积增加，占用空闲地区域面积增加，可恢复植被面积增加，因此撒播草籽面积较方案设计增加 320m²。

(5) 拆除区

实际施工阶段，该区占地面积增加，占用空闲地区域面积增加，可恢复植被面积增加，因此撒播草籽面积较方案设计增加 205m²。

4.3 临时措施监测结果

4.3.1 临时措施设计情况

根据《徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持方案报告表》，项目各分区临时措施设计情况如下：

表 4-7 临时措施方案设计情况统计表

防治分区	措施内容	单位	工程量设计情况
塔基区	泥浆沉淀池	座	96
	彩条布苫盖	m ²	12000
	临时堆土拦挡	m ³	1440
	土质排水沟	m	6160
	土质沉沙池	座	96
牵张场及跨越场区	彩条布铺垫	m ²	4500
	铺设钢板	m ²	4000
施工临时道路区	铺设钢板	m ²	2000
电缆施工区	泥浆沉淀池	座	1
	彩条布苫盖	m ²	260

	临时堆土拦挡	m ³	4
	土质排水沟	m	10
	土质沉沙池	座	1
拆除区	彩条布苫盖	m ²	2000

4.3.2 临时措施实施情况

根据查阅施工组织设计资料及现场调查监测分析,本工程水土保持临时措施实施情况表 4-8。

表 4-8 临时措施实施情况监测结果统计表

防治分区	措施内容	单位	工程量实施情况
塔基区	泥浆沉淀池	座	96
	密目网苫盖	m ²	9000
	土质排水沟	m	1540
	土质沉沙池	座	24
牵张场及跨越场区	彩条布铺垫	m ²	2600
	铺设钢板	m ²	3400
施工临时道路区	铺设钢板	m ²	3100
电缆施工区	泥浆沉淀池	座	1
	密目网苫盖	m ²	300
拆除区	密目网苫盖	m ²	2100

4.3.3 监测结果及变化原因分析

4.3.3.1 监测结果

工程建设过程中,建设单位参照水土保持方案设计,对本工程各个分区实施了相关水土保持临时措施。具体实施情况与方案设计对比情况见表 4-9,相关临时措施实施效果见图 4-3。

表4-9 临时措施实施变化情况

防治分区	措施内容	单位	方案设计	实际实施	增减情况	实施位置	实施时间
塔基区	泥浆沉淀池	座	96	96	0	灌注桩基础旁	2023.2-2023.7
	彩条布苫盖	m ²	12000	0	-12000	/	/
	密目网苫盖	m ²	0	9000	9000	裸露地表及临时堆土区域	2023.2-2023.8
	临时堆土拦挡	m ³	1440	0	-1440	/	/
	土质排水沟	m	6160	1540	-4620	塔基区四周	2023.6-2023.7
	土质沉沙池	座	96	24	-72	排水沟末端	2023.6-2023.7
牵张场及跨越场区	彩条布铺垫	m ²	4500	2600	-1900	裸露地表	2023.8-2023.9
	铺设钢板	m ²	4000	3400	-600	机器占压区域	2023.8-2023.9
施工临时道路区	铺设钢板	m ²	2000	3100	1100	松软路面区域	2023.2-2023.9
电缆施工区	泥浆沉淀池	座	1	1	0	拉管施工区域	2023.7-2023.8
	彩条布苫盖	m ²	260	0	-260	/	/
	密目网苫盖	m ²	0	300	300	裸露地表及临时堆土区域	2023.7-2023.9
	临时堆土拦挡	m ³	4	0	-4	/	/
	土质排水沟	m	10	0	-10	/	/
	土质沉沙池	座	1	0	-1	/	/
拆除区	彩条布苫盖	m ²	2000	0	-2000	/	/
	密目网苫盖	m ²	0	2100	2100	裸露地表及临时堆土区域	2023.8-2023.9

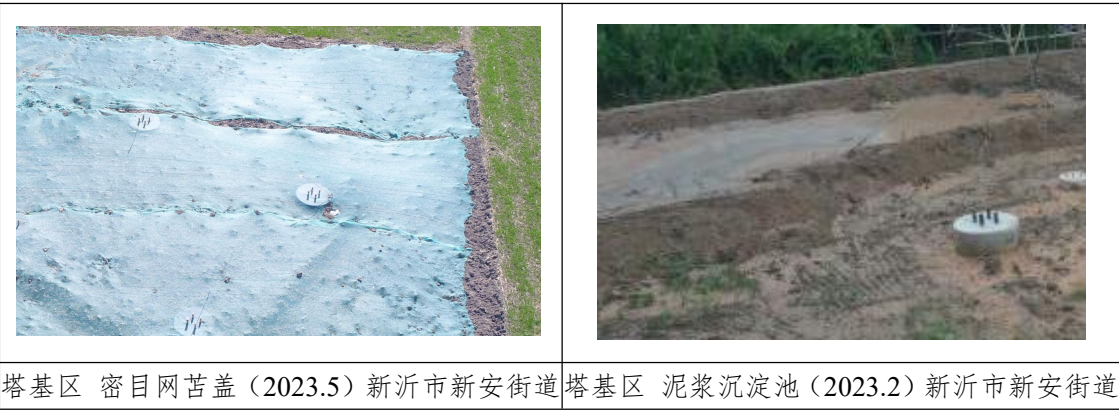


图 4-3 临时措施实施照片

4.3.3.2 变化原因分析

(1) 塔基区

实际施工阶段，仅对裸露地表和临时堆土区域进行苫盖，且采用更经济但防护效果相当的密目网进行苫盖，因此彩条布苫盖面积较方案设计减少 12000m²，

新增密目网苫盖 9000m^2 ；由于塔基基础施工时间较短，临时堆土时间短，故未实施临时堆土拦挡措施；大部分塔基不在雨季施工，雨季期间共施工 24 基杆塔，故布设排水沟 1540m ，沉沙池 24 座，因此排水沟长度较方案设计减少 4620m ，土质沉沙池较方案设计减少 72 座。

（2）牵张场及跨越场区

实际施工阶段，该区占地面积减少，且跨越场采取搭竹架的方式，因此彩条布铺垫面积较方案设计减少 1900m^2 ，铺设钢板面积较方案设计减少了 600m^2 。

（3）施工临时道路区

实际施工阶段，开辟的施工临时道路长度较方案设计有所增加，总占地面积增加，松软路面区域面积增加，因此铺设钢板面积较方案设计增加 1100m^2 。

（4）电缆施工区

实际施工阶段，由于该区占地面积增加，苫盖面积增加，且采用更经济但防护效果相当的密目网进行苫盖，因此，彩条布苫盖面积较方案设计减少 260m^2 ，新增密目网苫盖 300m^2 ；由于电缆基础施工时间较短且采用抽水排水的方式，因此排水沟长度较方案设计减少 10m ，沉沙池数量较方案设计减少 1 座，临时堆土拦挡较方案设计减少 4m^3 ，泥浆沉淀池数量与方案设计数量一致。

（5）拆除区

实际施工阶段，由于该区占地面积增加，苫盖面积增加，且采用更经济但防护效果相当的密目网进行苫盖，因此，彩条布苫盖面积较方案设计减少 2000m^2 ，新增密目网苫盖 2100m^2 。

4.4 水土保持措施防治效果

本工程在建设过程中，各区域大多采取了比较适宜的水土保持措施，措施形式多样、数量大、工程质量较高、防治效果较好。

通过对项目建设区现场调查监测分析，各防治区在采取水土保持措施后，水土流失防治效果均比较明显，且土壤侵蚀强度和水土流失面积及水土流失量均随着工程措施的完善和植物措施防治水土流失功能的发挥而逐渐下降。监测结果表明：

工程措施：表土剥离 8284m^3 ，土地整治 41135m^2 。各分区水土保持防治的工程措施基本能够满足相关水土保持的要求。水土保持工程措施防治责任基本得

到落实。工程措施已按照相应的设计标准进行了施工，符合有关标准要求，能够起到良好的水土保持作用。

植物措施：撒播草籽 19042m²。已按照相应的技术标准进行了施工，符合有关标准要求，能够起到良好的水土保持作用，最大限度地发挥林草的涵养水源、保持土壤的功能。

临时防护措施：泥浆沉淀池 97 座，密目网苫盖 11400m²，土质排水沟 1540m，土质沉沙池 24 座，彩条布铺垫 2600m²，铺设钢板 6500m²。总体上，各分区水土保持防治的临时措施基本已按照水土保持方案设计进行实施。水土保持临时措施对工程施工过程中的临时堆土防护可大幅减小施工可能产生水土流失影响。本工程在施工阶段按照相应的设计标准进行了施工，符合水土保持临时防护要求，起到了良好的水土保持作用。

5 土壤流失情况监测

5.1 监测时段划分

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目监测时段划分为施工期和试运行期。各分区监测时段划分如下：

(1) 塔基区

施工期：2023 年 2 月-2023 年 11 月；

试运行期：2023 年 12 月-2024 年 1 月。

(2) 牵张场及跨越场区

施工期：2023 年 8 月-2023 年 11 月；

试运行期：2023 年 12 月-2024 年 1 月。

(3) 施工临时道路区

施工期：2023 年 2 月-2023 年 11 月；

试运行期：2023 年 12 月-2024 年 1 月。

(4) 电缆施工区

施工期：2023 年 7 月-2023 年 11 月；

试运行期：2023 年 12 月-2024 年 1 月。

(5) 拆除区

施工期：2023 年 8 月-2023 年 11 月；

试运行期：2023 年 12 月-2024 年 1 月。

在接受国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司的委托后，我单位于 2023 年第一季度、2023 年第二季度、2024 年第一季度前往徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目进行了现场监测。

5.2 水土流失面积

5.2.1 施工建设期水土流失面积

通过现场调查及测量结合查阅施工组织设计资料及施工单位相关现场资料分析，工程施工建设期水土流失总面积为 42330m²，其中，塔基区土壤流失面积为 25816m²，牵张场及跨越场区土壤流失面积为 7650m²，施工临时道路区土壤流失面积为 3580m²，电缆施工区土壤流失面积为 898m²，拆除区土壤流失面积为 4386m²。

表 5-1 施工期土壤流失面积统计表 单位: m²

监测分区	时段	土壤流失面积
塔基区	2023.2-2023.11	25816
牵张场及跨越场区	2023.8-2023.11	7650
施工临时道路区	2023.2-2023.11	3580
电缆施工区	2023.7-2023.11	898
拆除区	2023.8-2023.11	4386
合计		42330

5.2.2 试运行期水土流失面积

本阶段主体工程均已完工,通过现场调查及测量,土壤流失面积共计 19325m²。其中,塔基区土壤流失面积为 10791m²,牵张场及跨越场区土壤流失面积为 5100m²,施工临时道路区土壤流失面积为 1112m²,电缆施工区土壤流失面积为 894m²,拆除区土壤流失面积为 1428m²。

表 5-2 试运行期土壤流失面积统计表 单位: m²

监测分区	时段	土壤流失面积
塔基区	2023.12-2024.1	10791
牵张场及跨越场区	2023.12-2024.1	5100
施工临时道路区	2023.12-2024.1	1112
电缆施工区	2023.12-2024.1	894
拆除区	2023.12-2024.1	1428
合计		19325

5.3 土壤流失量

本工程建设过程中,土壤流失量为 24.16t,其中施工期 23.67t,试运行期 0.49t。施工期因降水量大而集中,项目区开挖土石方经降雨径流流失较多;试运行期因植被恢复较好,土壤流失显著降低。

5.3.1 施工期土壤流失量分析

通过调查监测,在结合本次监测时段内的降雨和扰动情况综合分析监测数据合理性的基础上,得出总体监测结果评价及水土流失量。本阶段土壤流失量为 23.67t,其中,塔基区 19.28t,牵张场及跨越场区为 1.26t,施工临时道路区为 1.49t,电缆施工区为 0.34t,拆除区为 1.30t。详见表 5-3。

表 5-3 施工期土壤流失量监测表

监测分区	时段	土壤流失面积 (m ²)	时段 (a)	流失量 (t)
塔基区	2023.2-2023.11	25816	0.83	19.28
牵张场及跨越场区	2023.8-2023.11	7650	0.33	1.26
施工临时道路区	2023.2-2023.11	3580	0.83	1.49
电缆施工区	2023.7-2023.11	898	0.42	0.34
拆除区	2023.8-2023.11	4386	0.33	1.30
合计		42330	/	23.67

5.3.2 试运行期土壤流失量分析

通过调查监测,在结合本次监测时段内的降雨和扰动情况综合分析监测数据合理性的基础上,得出总体监测结果评价及水土流失量。本阶段试运行期的土壤流失量为 0.49t。详见表 5-4。

表 5-4 试运行期土壤流失量监测表

监测分区	时段	土壤流失面积 (m ²)	时段 (a)	流失量 (t)
塔基区	2023.12-2024.1	10791	0.17	0.27
牵张场及跨越场区	2023.12-2024.1	5100	0.17	0.13
施工临时道路区	2023.12-2024.1	1112	0.17	0.03
电缆施工区	2023.12-2024.1	894	0.17	0.02
拆除区	2023.12-2024.1	1428	0.17	0.04
合计		19325	/	0.49

5.4 取土、弃土弃渣潜在土壤流失量

本项目土石方挖填总量为 30732m³,其中挖方 15366m³(表土剥离量 8284m³,基础开挖量 7082m³),填方 15366m³(表土回覆量 8284m³,基础回填量 7082m³),无余方,无借方,因此无取土、弃土弃渣潜在土壤流失量。

5.5 水土流失危害

由于工程建设过程中重视水土保持工作,严格执行“三同时”制度,及时落实水土保持方案的各项措施,并根据现场情况优化和及时补充相应的防治措施,因工程建设产生的水土流失得到有效治理,未发生水土流失灾害事件。

6 水土流失防治效果监测

6.1 水土流失治理度

本项目扰动土地面积 42330m²，水土流失面积 42330m²，水土流失治理达标面积 42047m²。经计算，水土流失治理度为 99.3%，达到方案要求的 95%的目标值。各防治分区情况详见表 6-1。

表 6-1 各防治分区水土流失治理情况表

防治分区	扰动土地面积 (m ²)	水土流失面积 (m ²)	水土流失治理达标面积 (m ²)				水土流失治理度 (%)	防治标准 (%)	是否达标
			建筑物及场地道路硬化面积	工程措施	植物措施	小计			
塔基区	25816	25816	1191	13834	10682	25707	99.3	95	达标
牵张场及跨越场区	7650	7650	0	2550	5053	7603			
施工临时道路区	3580	3580	0	2468	1069	3537			
电缆施工区	898	898	4	0	833	837			
拆除区	4386	4386	0	2958	1405	4363			
合计	42330	42330	1195	21810	19042	42047			

注：治理达标面积中，工程措施和植物措施重合部分不再重复计列。

6.2 土壤流失控制比

工程区域容许土壤流失量为 200t/(km²·a)。根据水土保持监测结果显示，在施工过程中基础施工阶段土壤侵蚀量比较大。但由于工程各个区域在整个工程施工完毕后被建筑物覆盖或者植被覆盖，工程结束后，水土流失量逐渐变小，场地绿化工程等各项水土保持措施水土保持效益日趋显著。工程完工后，整个项目区治理后每平方公里年平均土壤流失量达到 145t/(km²·a)，各项水土保持措施较好地发挥了防治作用。土壤流失控制比约为 1.4，达到方案设计 1.0 的防治目标。

6.3 渣土防护率

通过调查分析，本工程永久弃渣和临时堆放的土方采取了苫盖等措施，不设弃渣场。本工程临时堆土总量 15366m³，实际挡护临时堆土数量 15250m³，渣土防护率为 99.2%，达到方案要求的 99%的目标值。

6.4 表土保护率

根据查阅施工组织设计资料及施工单位相关现场资料分析，通过调查分析，本工程对剥离的表土进行了苫盖等临时措施。项目区实际可剥离表土面积

39930m²，可剥离表土量为 11979m³；实际通过剥离保护的表土面积为 27614m²，实际剥离保护的表土量为 8284m³；通过苫盖和铺垫保护的表土面积为 11200m²，实际通过苫盖保护的表土量为 3360m³，表土保护率 97.2%，达到方案要求的 95% 的防治目标。

6.5 林草植被恢复率

本工程项目建设区内可恢复林草植被面积 19325m²，林草类植被面积 19042m²。经计算，林草植被恢复率为 98.5%，达到方案要求的 97% 的目标值。各分区情况详见表 6-2。

表 6-2 林草植被恢复率统计表

防治分区	可恢复植被面积 (m ²)	林草类植被面积 (m ²)	林草植被恢复率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	10791	10682	98.5	97	达标
牵张场及跨越场区	5100	5053			
施工临时道路区	1112	1069			
电缆施工区	894	833			
拆除区	1428	1405			
合计	19325	19042			

6.6 林草覆盖率

本工程项目建设区面积为 42330m²，恢复耕地面积 21810m²，扣除恢复耕地后面积 20520m²，林草类植被面积 19042m²，经计算，林草覆盖率为 92.8%，达到方案要求的 29% 的目标值。各分区情况详见表 6-3。

表 6-3 林草覆盖率统计表

防治分区	项目区面积 (m ²)	恢复耕地面积 (m ²)	扣除恢复耕地后面积 (m ²)	林草类植被面积 (m ²)	林草覆盖率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	25816	13834	11982	10682	92.8	29	达标
牵张场及跨越场区	7650	2550	5100	5053			
施工临时道路区	3580	2468	1112	1069			
电缆施工区	898	0	898	833			
拆除区	4386	2958	1428	1405			
合计	42330	21810	20520	19042			

综合以上分析，水土流失防治目标均已经达到了水土保持方案的要求，对比情况见表 6-4。

表 6-4 防治目标达标情况表

序号	六项指标	方案目标值	实际达到值	是否达标
1	水土流失治理度（%）	95	99.3	达标
2	土壤流失控制比	1.0	1.4	达标
3	渣土防护率（%）	99	99.2	达标
4	表土保护率（%）	95	97.2	达标
5	林草植被恢复率（%）	97	98.5	达标
6	林草覆盖率（%）	29	92.8	达标

7 结论

7.1 水土流失动态变化

7.1.1 防治责任范围

监测结果表明，工程水土流失防治责任范围为 42330m²。

7.1.2 土壤流失量

工程实际发生土壤流失总量 24.16t，工程实际土壤流失总量与水土保持方案预测量（101.29t）相比减少了 77.13t。主要因为工程建设过程中，水土保持措施布设较为完善，很大程度上避免了水土流失。

7.1.3 水土流失治理达标情况

截止 2024 年 1 月，各项水土保持措施的落实情况良好，六项指标已达到防治标准的目标值。具体情况详见表 7-1。

表 7-1 水土保持防治指标监测结果表

指标名称	设计值	监测结果	评价
水土流失治理度（%）	95	99.3	达标
土壤流失控制比	1.0	1.4	达标
渣土防护率（%）	99	99.2	达标
表土保护率（%）	95	97.2	达标
林草植被恢复率（%）	97	98.5	达标
林草覆盖率（%）	29	92.8	达标

7.2 水土保持措施评价

施工期主要采取临时措施进行防护，有效防治了水土流失；施工结束后，对易产生水土流失区域及时采取防护措施，按方案设计要求采取土地整治等工程措施和撒播狗牙根草籽等植物措施相结合的方式，起到了较好的水土保持效果，水土流失面积得到全面治理，随着绿化逐渐恢复，各区域未见明显土壤侵蚀，生态环境得到较大的改善。综上，本工程的水土保持措施体系完整，起到了防治水土流失的作用。

7.3 存在问题及建议

7.3.1 存在问题

本工程不存在水土保持问题。

7.3.2 建议

(1) 建设单位进一步加强水土保持宣传，提高水土流失防治意识。

(2) 建设单位继续严格落实水土保持方案，加强工程运行期隐患巡查，对发现损毁的水土保持设施应予以及时补修，加强植被管护，全面提高水土流失防治效益。

7.4 综合结论

监测结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局基本合理，达到并超过了水土保持方案报告表的要求。施工期因工程建设活动产生了新的水土流失，但通过采取各类水土保持工程措施、植物措施和临时措施，工程建设造成的水土流失基本得到控制，取得了较好的生态效益。

综上所述，监测结果表明：本工程已基本完成水土保持方案报告表确定的防治任务，水土保持设施的完好率较高，已初步发挥其水土保持效益。

附件
1

水土保持监测委托函

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测任务委托书


江苏核众环境监测技术有限公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）等的要求，我单位拟开展徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目的水土保持监测。

现委托贵公司进行该工程的水土保持监测并出具监测报告，请严格按照有关法律法规及标准规范的要求，结合工程建设实际情况，尽快开展现场监测及水土保持监测报告编制工作。

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

2023 年 1 月



附件
2

水土保持方案批复

新沂市行政审批局文件

新行审批〔2022〕水保 21 号

关于准予徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目水土保持 方案的行政许可决定

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司：

你公司关于徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目的《水土保持方案申请书》、《水土保持方案报告表》等材料已收悉。经审查，符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款和《江苏省水土保持条例》第十九条的规定，决定准予行政许可。

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目位于新沂市新安街道、墨河街道。项目总占地面积 43327m²，其中，永久占地 2253m²，临时占地 41074m²。本工程新建 110kV 线路 5 条，路径总长 17.80km。工程挖方 15568m³，填方 15568m³。工程总投资 6877 万元，其中，土建投资 1710 万元。工程计划于 2023 年 1 月开工建设，2023 年 12 月完工，总工期 12 个月。

水土保持方案行政许可的具体内容为：

一、水土流失防治责任范围

同意方案确定的水土流失防治责任范围，面积为 43327m²。

二、水土流失防治目标

本工程水土流失防治执行建设类一级标准，设计水平年防治目标为：水土流失治理度 95%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 29%。

三、水土保持投资估算

同意方案确定的水土保持工程总投资 173.54 万元，其中，工程措施费 25.08 万元，植物措施费 2.68 万元，临时措施费 119.73 万元，独立费用 12.14 万元，基本预备费 9.58 万元，水土保持补偿费 43327 元。

四、其他

（一）根据《江苏省水土保持补偿费征收使用管理办法》的规定，在项目开工前一次性缴纳水土保持补偿费。按照《省政府办公厅印发关于有效应对疫情新变化新冲击进一步助企纾困政策措施的通知》（苏政办发〔2022〕25 号）要求，按现行标准的 80%收取水土保持补偿费，实施期限自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）按照批准的水土保持方案做好水土保持的后续设计，加强施工组织和管理工作的，切实落实水土保持“三同时”制度，并接受水行政主管部门的检查。

（三）项目的地点、规模、建设内容如发生重大变更，须报本局重新审批。

（四）项目建设如涉及取水、占用河道管理范围等以及其他部门行政许可事项的，须到有管辖权的部门办理相应审批手续。

新沂市行政审批局
2022 年 5 月 24 日

附件 3

水土保持监测实施方案

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测实施方案

建设单位：国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司

2023 年 1 月

目 录

1	建设项目及项目区概况	1
1.1	项目概况	1
1.2	项目区概况	1
1.3	水土流失防治布局	3
2	水土保持监测布局	5
2.1	监测目标与任务	6
2.2	监测范围与分区	6
2.3	监测重点与布局	6
2.4	监测时段与监测频率	7
3	监测内容和方法	8
3.1	施工准备期	8
3.2	工程建设期	8
3.3	自然恢复期	8
4	预期成果及形式	9
4.1	监测记录表	9
4.2	水土保持监测报告	9
4.3	附件	9
5	监测工作组织与质量保证	10
5.1	监测项目部及人员组成	10
5.2	监测质量控制体系	10

1 建设项目及项目区概况

1.1 项目概况

本工程位于江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道。本工程共新建架空线路路径长 17.4km，利旧线路路径长约 0.5km，新建杆塔 96 基，拆除杆塔 43 基；新建双回电缆线路路径长 0.1km。具体包括：①110kV 平竹/平沐线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.3km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 11 基；②110kV 平陇 807 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 4.2km，利旧线路路径长约 0.5km，新建角钢塔 9 基、钢管杆 12 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基；③110kV 平新 805 线/平田线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 18 基，均采用灌注桩基础，新建双回电缆线路路径长 0.1km，采用拉管、电缆沟井的方式敷设，拆除钢管杆 12 基；④110kV 平新 819 线/平马 918 线线路改造工程：新建双回架空线路长约 2.8km，新建钢管杆 16 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 6 基；⑤110kV 平盛线线路改造工程：新建双回架空线路长约 3.3km，新建钢管杆 20 基，均采用灌注桩基础，拆除钢管杆 7 基。

本工程建设单位为国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司，水土保持方案编制单位为江苏辐环环境科技有限公司，水土保持监测单位为江苏核众环境监测技术有限公司。

根据水土保持方案报批稿及批复，本工程总占地面积 43327m²，其中，永久占地 2253m²，临时占地 41074m²；本工程土石方挖填方总量为 31136m³，其中挖方总量 15568m³，填方总量 15568m³，无借方，无余方。

本工程计划于 2023 年 2 月开工，于 2023 年 11 月完工。

1.2 项目区概况

（1）地形地貌

本工程位于江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道，区域地貌单元为冲积平原，地形平坦，地貌类型单一，地面高程一般为 14.0~55.0m（1985 国家基准高程，下同）。沿线大部分以农田、绿化带和空闲地为主，交通便利。

（2）水系情况

新沂市境内流域性河湖有沐河、沂河、新沂河、中运河、骆马湖，俗称“四

河一湖”，堤防总长 222km；区域性河道有老沂河、浪青河、新戴运河、新墨河、臧圩河、黄墩河、大沙河、淋头河、白马河、新开河、泥墩沟等 17 条，河道总长 374km，其中白马河、浪青河、新墨河、臧圩河、黄墩河属郯新边界河，新开河、泥墩沟属新沐边界河。

本工程线路主要跨越臧圩河。臧圩河发源于山东省郯城县袁堂附近，介于柳沟河与老沐河之间，由北向南，流入新沂市，于小马庄附近汇入新墨河，流域面积为 86.5km²，其中省界以下为 42.3km²，河流全长 18.47km，流入该河的支流，省界以上有大房沟、小房沟、羊红公路东沟。

(3) 气候

项目区属于暖温带半湿润季风气候，气候温和，冬冷夏热，光照充足，四季分明。根据根据徐州新沂市 1956~2020 年气象资料统计数据，多年气象要素情况如下。

表 1-1 工程项目区域气象特征值一览表

项目	内容		单位	新沂市
气温	平均	全年	°C	14.1
	极值	最高	°C	39.9
		最低	°C	-22.4
降水	平均	多年	mm	867.9
	最大年降水	多年	mm	1356.0
	最大月降水量	多年	mm	565.5
	24 小时最大降雨量	多年	mm	256.7mm
	1 小时最大降雨量	多年	mm	63.5
雷暴日数	平均雷暴日数	多年	d	29.6
相对湿度	多年平均		%	74
风速	多年年均		m/s	2.8
风向	全年主导风向		/	E
无霜期	全年		d	225
积雪深度	最大积雪深度		cm	20

(4) 地质地震

本工程所在地地基土主要由第四系全新统及上更新统冲积、湖积成因的粉质黏土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土夹粉砂及粉砂等组成，表层分布人工堆积成因的素填土。

根据《中国地震动参数区划图》的规定，项目区所在场地的基本地震动峰值

加速度为 0.20g（相应的地震基本烈度为Ⅶ度），基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.40s。

（5）土壤植被

徐州市地处江苏省西北部、华北平原东南部，地势平缓。通过现场勘察，项目区内土壤类型主要为黄潮土。项目沿线主要占用绿化带、耕地和空闲地。

项目区植被类型以常绿落叶阔叶混交林为主，当地生树种主要有漆树、毛叶欧李、野核桃、羽叶泡桐、无患子、重阳木等。常见树种主要有栎树、石楠、毛白杨、意杨、国槐、臭椿、楝树、黄连木、大叶黄杨、海桐、紫薇、木槿、紫穗槐等。草本植物主要有黑麦草、牛尾草、羊茅、黄背茅、青香茅、白茅、狗尾草等。根据实地调查统计，项目区林草覆盖率约为 40%。

1.3 水土流失防治布局

1.3.1 水土流失防治责任范围

根据新沂市行政审批局的水土保持方案，本工程水土流失防治责任范围为 43327m²，其中，永久占地 2253m²，临时占地 41074m²。

各防治分区及相应面积见表 1-2 所示。

表 1-2 水土流失防治责任范围汇总表 单位：m²

防治分区	永久占地	临时占地	防治责任范围	占地类型		
				耕地	交通运输用地	其他土地
塔基区	2251	24121	26372	14010	3297	9065
牵张场及跨越场区	0	9000	9000	3000	0	6000
施工临时道路区	0	3440	3440	2400	0	1040
电缆施工区	2	513	515	0	0	515
拆除区	0	4000	4000	2800	0	1200
合计	2253	41074	43327	22210	3297	17820

1.3.2 水土保持措施布局

根据苏州市水务局批复的水土保持方案，本工程水土保持措施如下表：

表 1-3 水土流失分区防治措施总体布局表

分区	措施类别	内容
塔基区	工程措施	表土剥离、土地整治
	植物措施	撒播草籽
	临时措施	彩条布苫盖、土质排水沟、土质沉沙池、泥浆沉淀池、临时堆土拦挡

分区	措施类别	内容
牵张场及跨越场区	工程措施	土地整治
	植物措施	撒播草籽
	临时措施	彩条布铺垫、铺设钢板
施工临时道路区	工程措施	土地整治
	植物措施	撒播草籽
	临时措施	铺设钢板
电缆施工区	工程措施	表土剥离、土地整治
	植物措施	撒播草籽
	临时措施	彩条布苫盖、土质排水沟、土质沉沙池、泥浆沉淀池、临时堆土拦挡
拆除区	工程措施	表土剥离、土地整治
	植物措施	撒播草籽
	临时措施	彩条布苫盖

1.3.3 水土流失重点区域和重点阶段

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀。根据现场踏勘调查情况以及输变电项目的建设特征，本工程水土流失重点区域是塔基区，施工期是工程建设过程中产生水土流失最为严重的时期。

1.3.4 水土流失防治目标

本工程水土流失防治目标最终修正值见表 1-4。

表 1-4 水土流失防治目标值

防治指标	目标值
水土流失治理度 (%)	95
土壤流失控制比	1.0
渣土防护率 (%)	99
表土保护率 (%)	95
林草植被恢复率 (%)	97
林草覆盖率 (%)	29

1.3.5 水土保持监测进度安排

2023 年 1 月，监测项目组接收到本项目水土保持监测技术服务委托，随即着手搜集工程相关资料，并制定监测计划。项目水土保持监测实施进度安排如下：

(1) 2023 年 1 月，监测准备阶段：

①编制监测实施方案；

②组建监测项目组；

③监测人员进场。

(2) 2023 年 2 月-2024 年 6 月，监测实施阶段：

①全面开展监测，重点对扰动土地情况、水土流失及水土保持措施布设等情况进行监测；

②向建设单位提出水土保持监测意见。

(3) 2024 年 7 月，监测总结阶段：

①汇总、分析各阶段监测数据成果；

②分析评价防治效果；

③编制与报送水土保持监测总结报告。

1.3.6 监测准备期现场调查评价

通过现场调查，结合遥感影像等资料，对本项目地形地貌、土壤植被、土地利用、水土流失现状、水土保持设施等情况进行了调查，结果统计如下表所示。

表 1-5 监测准备阶段各分区调查情况统计

内容 分区	地形地貌	土壤植被	土地利用现状	水土流失现状	水土保持设施
塔基区	平原	黄潮土、狗牙根等草本植物	耕地、交通运输用地、其他土地	微度，基本无水土流失	无
牵张场及跨越场区	平原	黄潮土、狗牙根等草本植物	耕地、其他土地	微度，基本无水土流失	无
施工临时道路区	平原	黄潮土、狗牙根等草本植物	耕地、其他土地	微度，基本无水土流失	无
电缆施工区	平原	黄潮土、狗牙根等草本植物	其他土地	微度，基本无水土流失	无
拆除区	平原	黄潮土、狗牙根等草本植物	耕地、其他土地	微度，基本无水土流失	无

2 水土保持监测布局

2.1 监测目标与任务

2.1.1 监测目标

通过开展水土保持监测工作，及时掌握生产建设阶段和运行初期的水土流失情况，了解各项水土保持措施的防治效果。通过监测来监督和指导水土保持方案的实施，并对需补充水土保持措施的制定相应的补充治理方案，使水土流失得到控制。

2.1.2 监测任务

本项目开展水土保持监测的主要任务是：

- (1) 及时、准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果。
- (2) 掌握项目水土保持措施工程量。
- (3) 提出水土保持建议，督促落实水土保持方案。

2.2 监测范围与分区

2.2.1 监测范围

根据水土保持方案报批稿，本工程水土保持监测范围为方案确定的水土流失防治责任范围 43327m²。

2.2.2 监测分区

根据报批的水土保持方案中水土流失防治分区，结合本工程实际，本项目水土保持监测分区划分塔基区、牵张场及跨越场区、施工临时道路区、电缆施工区、拆除区 5 个监测分区。

2.3 监测重点与布局

2.3.1 监测重点

水土保持监测的重点包括：水土保持方案落实情况，扰动土地及植被占压情况，水土保持措施（含临时防护措施）实施状况，水土保持责任制度落实情况等。根据水土保持方案中水土流失预测结果以及现场踏勘情况综合分析，水土流失重点监测区域为塔基区，水土流失重点阶段为施工期。

2.3.2 监测布局

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，结合

本工程水土保持方案的设计，针对本项目区工程特点、施工布置、水土流失的特点和水土保持措施布局特征，遵循代表性、方便性、少受干扰的原则，对各分区进行巡查监测。

各区监测点布设见表 2-1。

表 2-1 本工程水土保持监测点位布设表

监测分区	监测方法	监测点性质	监测内容
塔基区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
牵张场及跨越场区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
施工临时道路区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
电缆施工区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复等内容。
拆除区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。

2.4 监测时段与监测频率

2.4.1 监测时段

本工程水土保持监测从 2023 年 1 月开始，至 2024 年 6 月结束。

设计水平年的下半年进行 6 项水土流失防治目标达到情况监测，并进行资料整编和编写水土保持验收所需的水土保持监测总结报告。

2.4.2 监测频率

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），监测频次按以下确定：

水土保持措施、扰动地表面积、土壤流失量、水土保持工程措施、临时措施等每季度监测记录一次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每 3 个月监测记录一次；遇暴雨（24h 降雨量≥50mm）、大风等情况应及时加测；水土流失灾害事件发生后 1 周内完成监测。

3 监测内容和方法

3.1 施工准备期

施工准备期的监测目的是掌握项目建设前生态环境本底状况,主要监测内容包括防治责任范围内的地形地貌、地面组成物质、水文气象、土壤植被、土地利用现状、水土流失状况等基本信息。监测组于 2023 年 1 月进场,进行现场调查监测。

3.2 工程建设期

施工期水土保持监测主要包括扰动土地情况、取土(石、料)弃土(石、渣)情况、水土流失情况、水土流失隐患与危害、水土保持措施等内容。

扰动土地情况包括地表扰动的方式、范围、面积、扰动强度等;取土(石、料)弃土(石、渣)情况包括取土(石、料)场、弃土(石、渣)场的位置、方量;水土流失情况包括水土流失形式、土壤流失量等;水土流失隐患与危害情况包括项目区发生的滑坡、崩塌等灾害情况以及对工程安全和下游的影响;水土保持措施情况包括项目区各项工程措施、植被措施、临时措施的数量和质量。

监测主要无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析进行。

3.3 试运行期

试运行期水土保持监测主要包括水土保持措施运行状况及防护效果监测,水土流失六项防治指标达标情况评价两部分内容。

(1) 水土保持措施运行状况及防护效果监测

主要包括水土流失防治措施的数量和质量:林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖率;防护工程的稳定性、完好程度和运行情况;各项防治措施的拦渣保土效果。

(2) 水土流失六项防治目标监测

根据试运行期工程建设损坏水保设施面积、扰动地表面积、工程防治责任范围面积、工程建设区面积、水土流失防治措施的防治面积、防治责任范围内可绿化面积、已采取的植物措施面积等各项水土保持监测结果,计算本项目的水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率等 6 项防治目标的达到值。

4 预期成果及形式

4.1 监测记录表

包括原始监测数据记录表等。

4.2 水土保持监测报告

水土保持监测报告包括监测季度报告表、监测总结报告。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）的要求：每个季度的第一个月前编制完成上一季度的水土保持监测季度报告；监测工作结束后编制完成水土保持监测总结报告。

4.3 附件

包括图件、影像资料以及监测相关文件资料等。

5 监测工作组织与质量保证

5.1 监测项目部及人员组成

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）等标准的要求，水土保持监测单位应设立监测项目部。监测项目部的主要职责是：负责监测项目的组织、协调和实施；负责监测进度、质量、设备配置和项目管理；负责与施工单位日常联络，收集主体工程进度、施工报表等资料；负责日常监测数据采集，做好原始记录；负责监测资料汇总、复核、成果编制与报送；开展施工现场突发性水土流失事件应急监测。

为保障监测工作高质量、高效率完成，我公司组织了一支专业知识强、业务水平熟练、监测设备齐全、监测经验丰富的水土保持队伍，成立了水土保持监测项目组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工。同时加强与建设单位、施工单位以及地方水行政主管部门的联系，促进监测工作的顺利进行。

表 5-1 监测项目组成员及分工

职位名称	姓名	职称	职责
总监测工程师	戴 瑜	高级工程师	项目组负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量。
监测工程师	樊虹呈	工程师	负责数据的采集汇总、校核和分析。
监测员	黄春清	工程师	完成监测数据的采集和整理。

5.2 监测质量控制体系

5.2.1 监测项目管理制度

为了保障监测实施，本公司在人员、设备、资金、车辆等方面将给予监测工作组最大的支持。通过各个方面的保障措施，可使得该项目水土保持监测工作得以顺利的组织实施，也能够更好的对项目进行管理。

我公司将向建设单位报送监测成果，并在水土保持设施竣工验收之前提交水土保持监测总结报告，监测总结报告满足水土保持设施竣工验收要求。

5.2.2 现场监测人员工作制度

水土保持监测必须严格按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）等标准的要求，监测数据不得弄虚作假，将监测过程中发现的问题及时向业主汇

报，并提出处理意见，将施工建设的水土流失危害降到最低。

(1) 监测前需对仪器设备进行检查，确保监测数据准确可靠；

(2) 监测时必须做好原始调查记录（包括调查时间、人员、地点、调查基本数据、照片及存在的主要问题等），并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备；

(3) 对每次监测结果进行统计分析，做出综合评价。若发现异常情况，应立即通知建设单位，采取补救措施；

(4) 监测成果报告实行定期上报制，监测单位应按时提交符合要求的季报、重大情况报告，报送建设单位，作为监督检查和验收达标的依据之一。

5.2.3 监测项目进度控制

为保证水土保持监测实施进度，顺利完成监测总结报告为验收提供资料，我公司将采取一系列进度控制措施。

(1) 建立项目现场监测计划，及时协调监测组人员进行现场监测，保证监测频率达到规范要求，并根据现场施工情况和暴雨情况及时作出调整。

(2) 加强与建设单位、施工单位的沟通与协调，针对现场发现的问题及时进行反馈，提出整改措施建议。

(3) 现场监测结束后及时对监测数据进行整理和总结，按照要求撰写监测报告。

5.2.4 成果质量控制

监测项目组按照批复的水土保持方案报告表和实施方案规定的监测重点、内容、时段和防治目标，每次现场监测工作都需制定具体监测计划，并对每个监测周期的监测结果和防治目标进行量化比较和统计分析。为了保证监测成果质量，本项目实行“全流程管理、分环节控制”的质量控制和保证体系。项目负责人、监测业务主管必须把好质量关，出现问题及时更正，未经修正不得进入下一个作业工序；对不能及时解决的问题，要及时上报，以便研究讨论解决。在完成每一次监测工作时，必须进行自查自验；合格后方可填写监测表格。

监测的全部技术资料 and 成果，必须通过校核、审核、审定等手续，方可应用于监测工作或作为监测成果。

5.2.5 档案管理

本项目水土保持监测成果按照我公司档案管理的要求建立档案,重要成果资料进行归档保存。水土保持监测结束后,编制的水土保持监测总结报告应作为水土保持竣工验收的附件。

附件
4

水土保持监测
意见书

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测意见书

项目名称	徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目	
建设地点	江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道	
建设单位	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司	
监测人员	樊虹呈 彭青	
监测时间	2023 年 1 月 15 日	
监测意见	2023 年 1 月 15 日，监测小组对本工程进行了现场监测，本工程尚未开工。具体情况如下。	
 		
现场未开工，项目区地貌单元为冲积平原，沿线主要占地类型为耕地、交通运输用地和其他土地，现场植被情况良好。		

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测意见书

项目名称	徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目		
建设地点	江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道		
建设单位	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司		
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司		
监测人员	樊虹呈 彭青		
监测时间	2023 年 3 月 19 日		
监测意见	2023 年 3 月 19 日，监测小组对本工程进行了现场监测，塔基正在基础施工。具体情况如下。		
			
现场施工情况良好，施工临时道路区铺设钢板。			

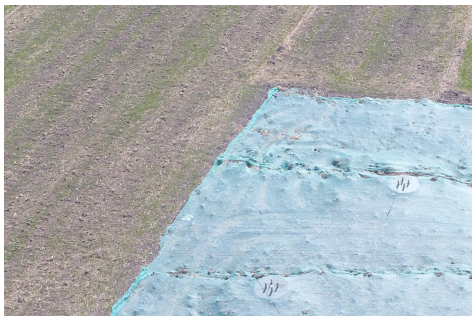
徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测意见书

项目名称	徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目	
建设地点	江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道	
建设单位	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司	
监测人员	樊虹呈 彭	
监测时间	2023 年 5 月 8 日	
监测意见	2023 年 5 月 8 日，监测小组对本工程进行了现场监测。塔基正在基础施工，施工现场存在临时堆土及裸露地表未进行苫盖。	
 		
现场临时堆土及裸露地表未及时苫盖，需加强施工过程中对临时堆土及裸露地表的苫盖。		

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持整改回复情况

项目名称	徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目	
建设地点	江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道	
建设单位	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	
施工单位	江苏省送变电有限公司	
整改时间	2023 年 5 月 11 日	
监测意见	2023 年 5 月 8 日，接到监测单位对徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目现场的监测意见，我公司立即组织人员对现场进行整改，对塔基区裸露地表采取了密目网苫盖保护措施，现将现场整改情况反馈如下。	
		

徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目

水土保持监测意见书


项目名称	徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目		
建设地点	江苏省徐州市新沂市新安街道、墨河街道		
建设单位	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司		
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司		
监测人员	樊虹呈 彭青		
监测时间	2024 年 1 月 15 日		
监测意见	2024 年 1 月 15 日，监测小组对本工程进行了现场监测。此时，工程已完工，现场植被恢复良好。		
			
工程已完工，现场植被情况良好。			


附件
5

水土保持监测季度报告

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2023 年 2 月-2023 年 3 月

项目名称		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目					
建设单位联系人及电话	刘新 15720786155	监测项目负责人（签字）：	生产建设单位（盖章）				
填表人及电话	樊虹呈 18362985930						
		2023 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 8 日				
主体工程进度		本工程于 2023 年 2 月正式开工,预计于 2023 年 11 月完工。目前处于塔基基础施工阶段。					
指标				设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (m²)	合计		43327	7140	7140		
	塔基区		26372	6532	6532		
	牵张场及跨越场区		9000	0	0		
	施工临时道路区		3440	608	608		
	电缆施工区		515	0	0		
拆除区		4000	0	0			
弃土(石、渣)量 (万 m³)	合计量/弃渣场总数		/	/	/		
	弃渣场 1		/	/	/		
	弃渣场 2		/	/	/		
	渣土防护率 (%)		99%	>99%	>99%		
损坏水土保持设施数量 (m²)			20106	2987	2987		
水土保持工程进度	工程措施	塔基区	表土剥离 (m³)	7661	1567	1567	
			土地整治 (m²)	25163	0	0	
		牵张场及跨越场区	土地整治 (m²)	9000	0	0	
			施工临时道路区	土地整治 (m²)	3440	0	0
		电缆施工区		表土剥离 (m³)	155	0	0
			土地整治 (m²)	513	0	0	
		拆除区	表土剥离 (m³)	480	0	0	
			土地整治 (m²)	4000	0	0	
		植物措施	塔基区	撒播草籽 (m²)	11353	0	0
			牵张场及跨越场区	撒播草籽 (m²)	6000	0	0
	施工临时道路区		撒播草籽 (m²)	1040	0	0	
	电缆施工区		撒播草籽 (m²)	513	0	0	
	拆除区		撒播草籽 (m²)	1200	0	0	
	临时措施	塔基区	泥浆沉淀池 (座)	96	19	19	
			彩条布苫盖 (m²)	12000	0	0	
			密目网苫盖 (m²)	0	3000	3000	
			临时堆土拦挡 (m³)	1440	0	0	
土质排水沟 (m)			6160	0	0		


			土质沉沙池（座）	96	0	0
		牵张场及跨越场区	彩条布苫盖（m ² ）	4500	0	0
			铺设钢板（m ² ）	4000	0	0
		施工临时道路区	铺设钢板（m ² ）	2000	380	380
		电缆施工区	泥浆沉淀池（座）	1	0	0
			彩条布苫盖（m ² ）	260	0	0
			临时堆土拦挡（m ³ ）	4	0	0
			土质排水沟（m）	10	0	0
			土质沉沙池（座）	1	0	0
		拆除区	彩条布苫盖（m ² ）	2000	0	0
水土流失影响因子	降雨量（mm）			/	131.6	131.6
	最大 24 小时降雨（mm）			/	23.43	/
	最大风速（m/s）			/	6.4	/
	平均风速（m/s）			/	2.5	/
土壤流失量（t）				/	3.89	3.89
水土流失危害事件				无		
存在问题与建议		无				
水土保持监测“绿黄红”三色评价		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目在 2023 年第一季度已实施了部分水土保持措施，未产生较大的水土流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。 				


生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目		
监测时段和 防治责任范围		<u>2023</u> 年第 <u>一</u> 季度， <u>0.714</u> 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	擅自扩大施工扰动面积未超过 1000m ² 。
	表土剥离 保护	5	5	表土剥离部分已实施，且表土剥离保护措施未实施面积未超过 1000m ²
	弃土（石、 渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场。
水土流失状况		15	15	水土流失总量未超过 100m ³ 。
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	18	本工程前期水土保持工程措施已部分完成。
	植物措施	15	15	施工尚未结束，植物措施未实施。
	临时措施	10	8	部分临时措施已实施。
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害。
合 计		100	96	评价为 “绿色”

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2023 年 4 月-2023 年 6 月

项目名称		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目					
建设单位联系人及电话	刘新 15720786155	监测项目负责人（签字）：	生产建设单位（盖章）				
填表人及电话	樊虹呈 18362985930	 2023 年 7 月 7 日	 2023 年 7 月 8 日				
主体工程进度		本工程于 2023 年 2 月正式开工,预计于 2023 年 11 月完工。目前处于塔基基础施工阶段。					
指标		设计总量	本季度新增	累计			
扰动土地面积 (m²)	合计		43327	15550	22690		
	塔基区		26372	14235	20767		
	牵张场及跨越场区		9000	0	0		
	施工临时道路区		3440	1315	1923		
	电缆施工区		515	0	0		
拆除区		4000	0	0			
弃土(石、渣)量 (万 m³)	合计量/弃渣场总数		/	/	/		
	弃渣场 1		/	/	/		
	弃渣场 2		/	/	/		
	渣土防护率 (%)		99%	>99%	>99%		
损坏水土保持设施数量 (m²)		20106	10221	13208			
水土保持工程进度	工程措施	塔基区	表土剥离 (m³)	7661	4200	5767	
			土地整治 (m²)	25163	0	0	
		牵张场及跨越场区	土地整治 (m²)	9000	0	0	
			施工临时道路区	土地整治 (m²)	3440	0	0
		电缆施工区		表土剥离 (m³)	155	0	0
			土地整治 (m²)	513	0	0	
		拆除区	表土剥离 (m³)	480	0	0	
			土地整治 (m²)	4000	0	0	
		植物措施	塔基区	撒播草籽 (m²)	11353	0	0
			牵张场及跨越场区	撒播草籽 (m²)	6000	0	0
	施工临时道路区		撒播草籽 (m²)	1040	0	0	
	电缆施工区		撒播草籽 (m²)	513	0	0	
	拆除区		撒播草籽 (m²)	1200	0	0	
	临时措施	塔基区	泥浆沉淀池 (座)	96	68	87	
			彩条布苫盖 (m²)	12000	0	0	
			密目网苫盖 (m²)	0	4000	7000	
			临时堆土拦挡 (m³)	1440	0	0	
土质排水沟 (m)			6160	770	770		

			土质沉沙池（座）	96	12	12
		牵张场及跨越场区	彩条布苫盖（m ² ）	4500	0	0
			铺设钢板（m ² ）	4000	0	0
		施工临时道路区	铺设钢板（m ² ）	2000	840	1220
		电缆施工区	泥浆沉淀池（座）	1	0	0
			彩条布苫盖（m ² ）	260	0	0
			临时堆土拦挡（m ³ ）	4	0	0
			土质排水沟（m）	10	0	0
			土质沉沙池（座）	1	0	0
		拆除区	彩条布苫盖（m ² ）	2000	0	0
水土流失影响因子	降雨量（mm）		/	340.3	471.9	
	最大 24 小时降雨（mm）		/	29.42	/	
	最大风速（m/s）		/	6.9	/	
	平均风速（m/s）		/	2.7	/	
土壤流失量（t）			/	6.48	10.37	
水土流失危害事件			无			
存在问题与建议		无				
水土保持监测“绿黄红”三色评价		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目在 2023 年第二季度已实施了部分水土保持措施，未产生较大的水土流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。 				


生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目		
监测时段和 防治责任范围		<u>2023</u> 年第 <u>二</u> 季度， <u>2.269</u> 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	擅自扩大施工扰动面积未超过 1000m ² 。
	表土剥离 保护	5	5	表土剥离部分已实施，且表土剥离保护措施未实施面积未超过 1000m ²
	弃土（石、 渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场。
水土流失状况		15	15	水土流失总量未超过 100m ³ 。
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	本工程前期水土保持工程措施已部分完成。
	植物措施	15	15	施工尚未结束，植物措施未实施。
	临时措施	10	4	部分临时措施已实施，现场塔基区部分地表裸露。
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害。
合 计		100	94	评价为 “绿色”

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2024 年 1 月

项目名称		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目				
建设单位联系人及电话	刘新 15720786155	监测项目负责人（签字）：	生产建设单位（盖章）			
填表人及电话	樊虹呈 18362985930					
		2024 年 2 月 7 日	2024 年 2 月 8 日			
主体工程进度		本工程于 2023 年 2 月正式开工，于 2023 年 11 月完工。目前处于试运行阶段。				
指标				设计总量	本季度新增	累计
扰动土地面积（m²）	合计		43327	0	42330	
	塔基区		26372	0	25816	
	牵张场及跨越场区		9000	0	7650	
	施工临时道路区		3440	0	3580	
	电缆施工区		515	0	898	
拆除区		4000	0	4386		
弃土（石、渣）量（万 m³）	合计量/弃渣场总数		/	/	/	
	弃渣场 1		/	/	/	
	弃渣场 2		/	/	/	
	渣土防护率（%）		99%	>99%	>99%	
损坏水土保持设施数量（m²）			20106	0	19325	
水土保持工程进度	工程措施	塔基区	表土剥离（m³）	7661	0	7542
			土地整治（m²）	25163	0	24625
		牵张场及跨越场区	土地整治（m²）	9000	0	7650
			施工临时道路区	土地整治（m²）	3440	0
		电缆施工区	表土剥离（m³）	155	0	226
			土地整治（m²）	513	0	894
		拆除区	表土剥离（m³）	480	0	516
			土地整治（m²）	4000	0	4386
	植物措施	塔基区	撒播草籽（m²）	11353	0	10682
		牵张场及跨越场区	撒播草籽（m²）	6000	0	5053
		施工临时道路区	撒播草籽（m²）	1040	0	1069
		电缆施工区	撒播草籽（m²）	513	0	833
		拆除区	撒播草籽（m²）	1200	0	1405
	临时措施	塔基区	泥浆沉淀池（座）	96	0	96
			彩条布苫盖（m²）	12000	0	0
密目网苫盖（m²）			0	0	9000	
临时堆土拦挡（m³）			1440	0	0	
土质排水沟（m）			6160	0	1540	

			土质沉沙池（座）	96	0	24
		牵张场及跨越场区	彩条布苫盖（m ² ）	4500	0	2600
			铺设钢板（m ² ）	4000	0	3400
		施工临时道路区	铺设钢板（m ² ）	2000	0	3100
		电缆施工区	泥浆沉淀池（座）	1	0	1
			彩条布苫盖（m ² ）	260	0	0
			密目网苫盖（m ² ）	0	0	300
			临时堆土拦挡（m ³ ）	4	0	0
			土质排水沟（m）	10	0	0
			土质沉沙池（座）	1	0	0
		拆除区	彩条布苫盖（m ² ）	2000	0	0
			密目网苫盖（m ² ）	2100	0	2100
水土流失影响因子	降雨量（mm）			/	87.1	911.6
	最大 24 小时降雨（mm）			/	21.43	/
	最大风速（m/s）			/	6.1	/
	平均风速（m/s）			/	2.3	/
土壤流失量（t）				/	0.25	24.16
水土流失危害事件				无		
存在问题与建议		无				
水土保持监测“绿黄红”三色评价		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目在 2024 年第一季度已实施了部分水土保持措施，未产生较大的水土流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。 				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		徐州平墩 220 千伏变电站 110 千伏送出工程项目		
监测时段和 防治责任范围		<u>2024</u> 年第 <u>一</u> 季度， <u>4.233</u> 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	擅自扩大施工扰动面积未超过 1000m ² 。
	表土剥离 保护	5	5	各区域表土剥离均已实施，且表土剥离保护措施未实施面积未超过 1000m ²
	弃土（石、 渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场。
水土流失状况		15	15	水土流失总量未超过 100m ³ 。
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	本工程前期水土保持工程措施已完成。
	植物措施	15	11	部分植被存活率较低。
	临时措施	10	10	已落实的临时措施基本满足防护要求。
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害。
合 计		100	96	评价为 “绿色”

附件
6

水土保持监测影像资料

	
工程未开工（2023.1）	工程未开工（2023.1）
	
塔基区 密目网苫盖（2023.5）	塔基区 泥浆沉淀池（2023.2）
	
施工临时道路区 铺设钢板（2023.3）	施工临时道路区 铺设钢板（2023.3）

	
塔基区 撒播草籽（2024.1）	塔基区 撒播草籽（2024.1）
	
塔基区 复耕（2024.1）	塔基区 复耕（2024.1）
	
塔基区 复耕（2024.1）	塔基区 复耕（2024.1）

	
拆除区 复耕（2024.1）	拆除区 复耕（2024.1）

附件 7

项目区施工前后遥感影像对比图



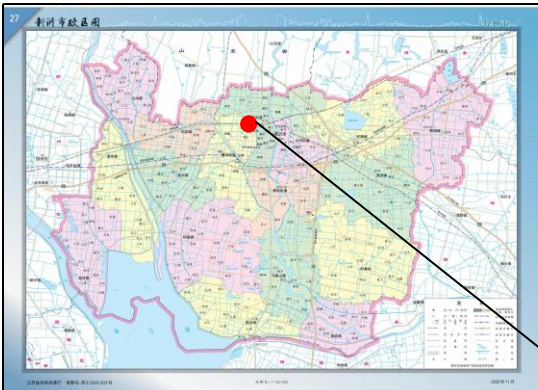
塔基区施工前（2022.9）



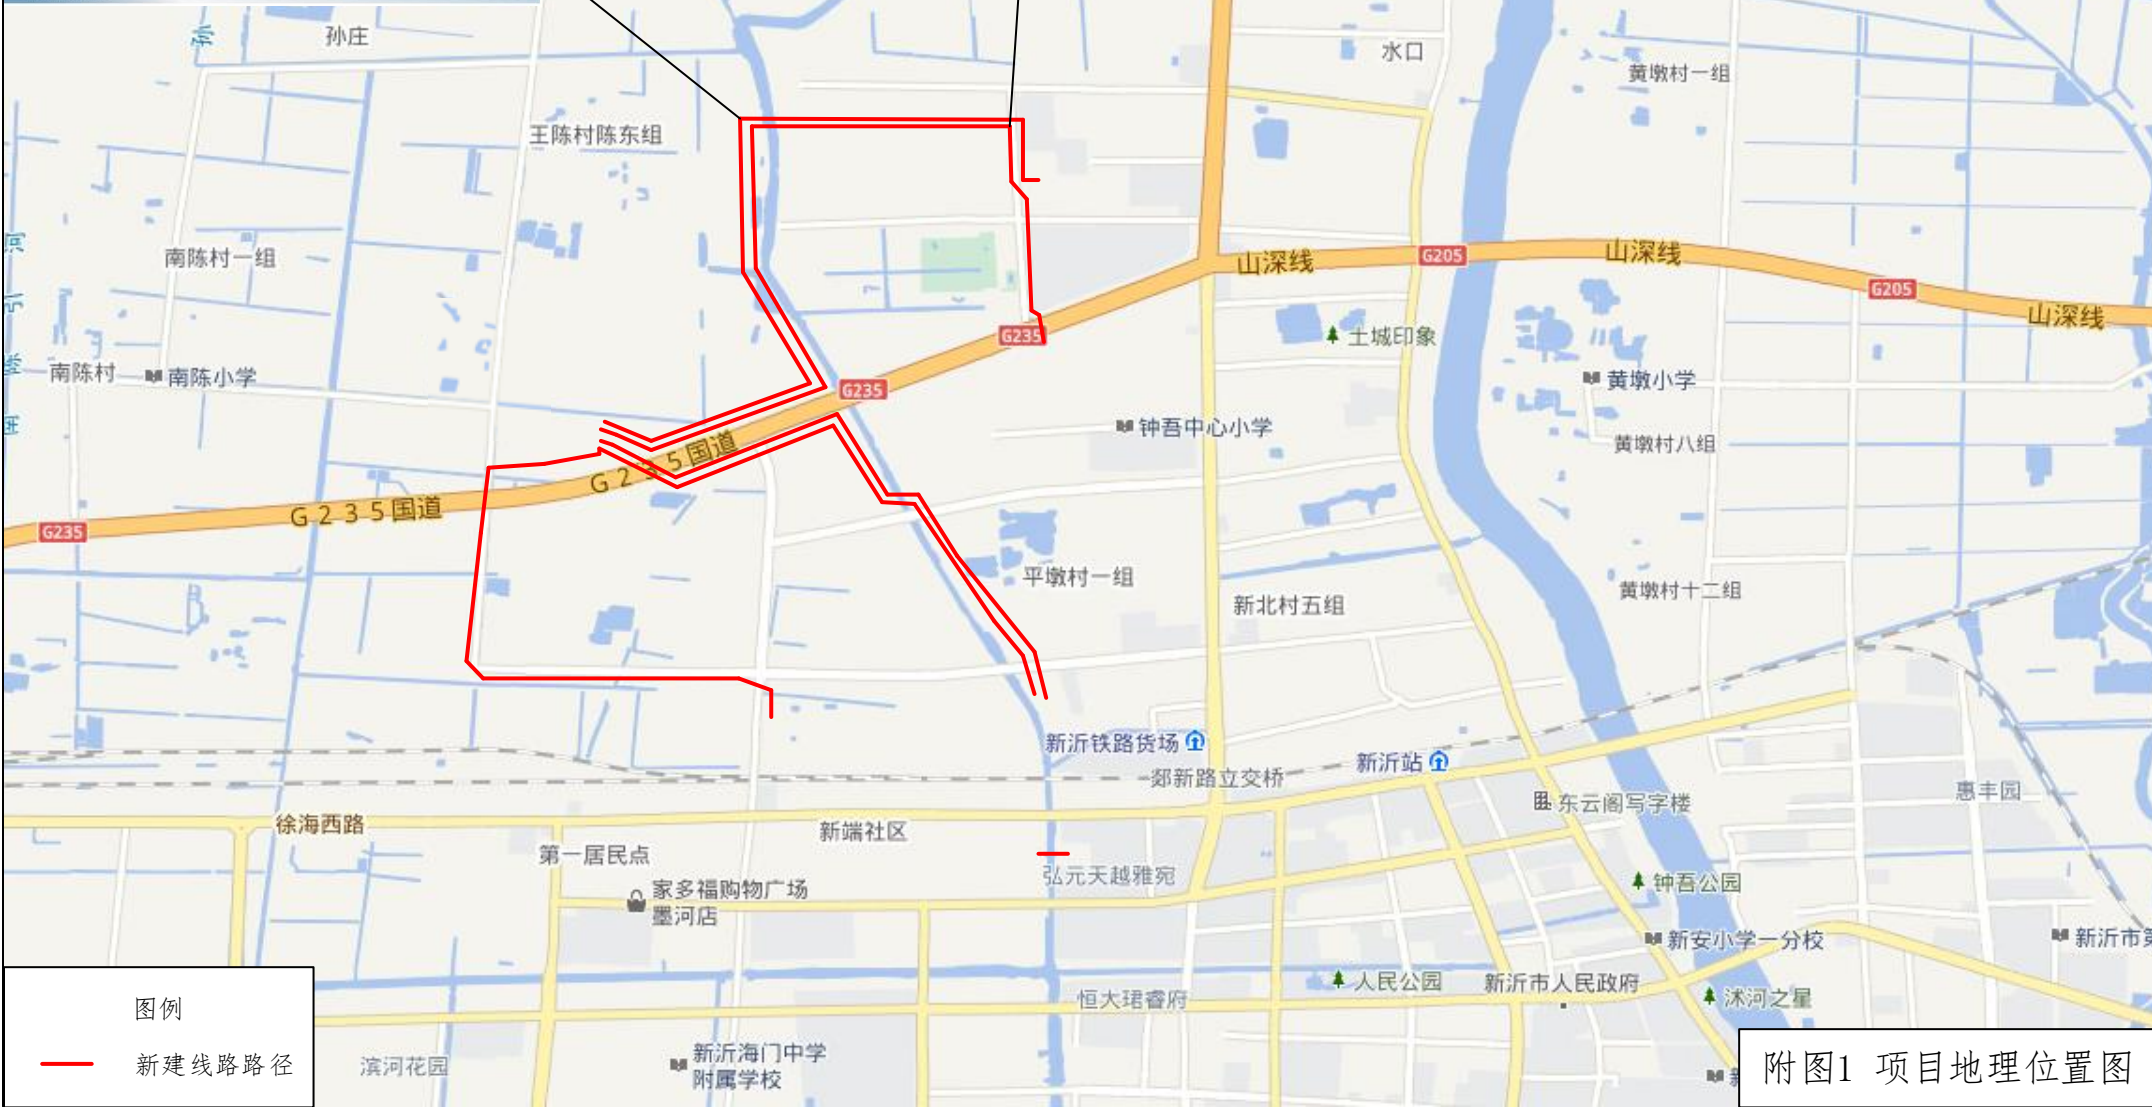
塔基区复耕现状（2024.1）

附

图



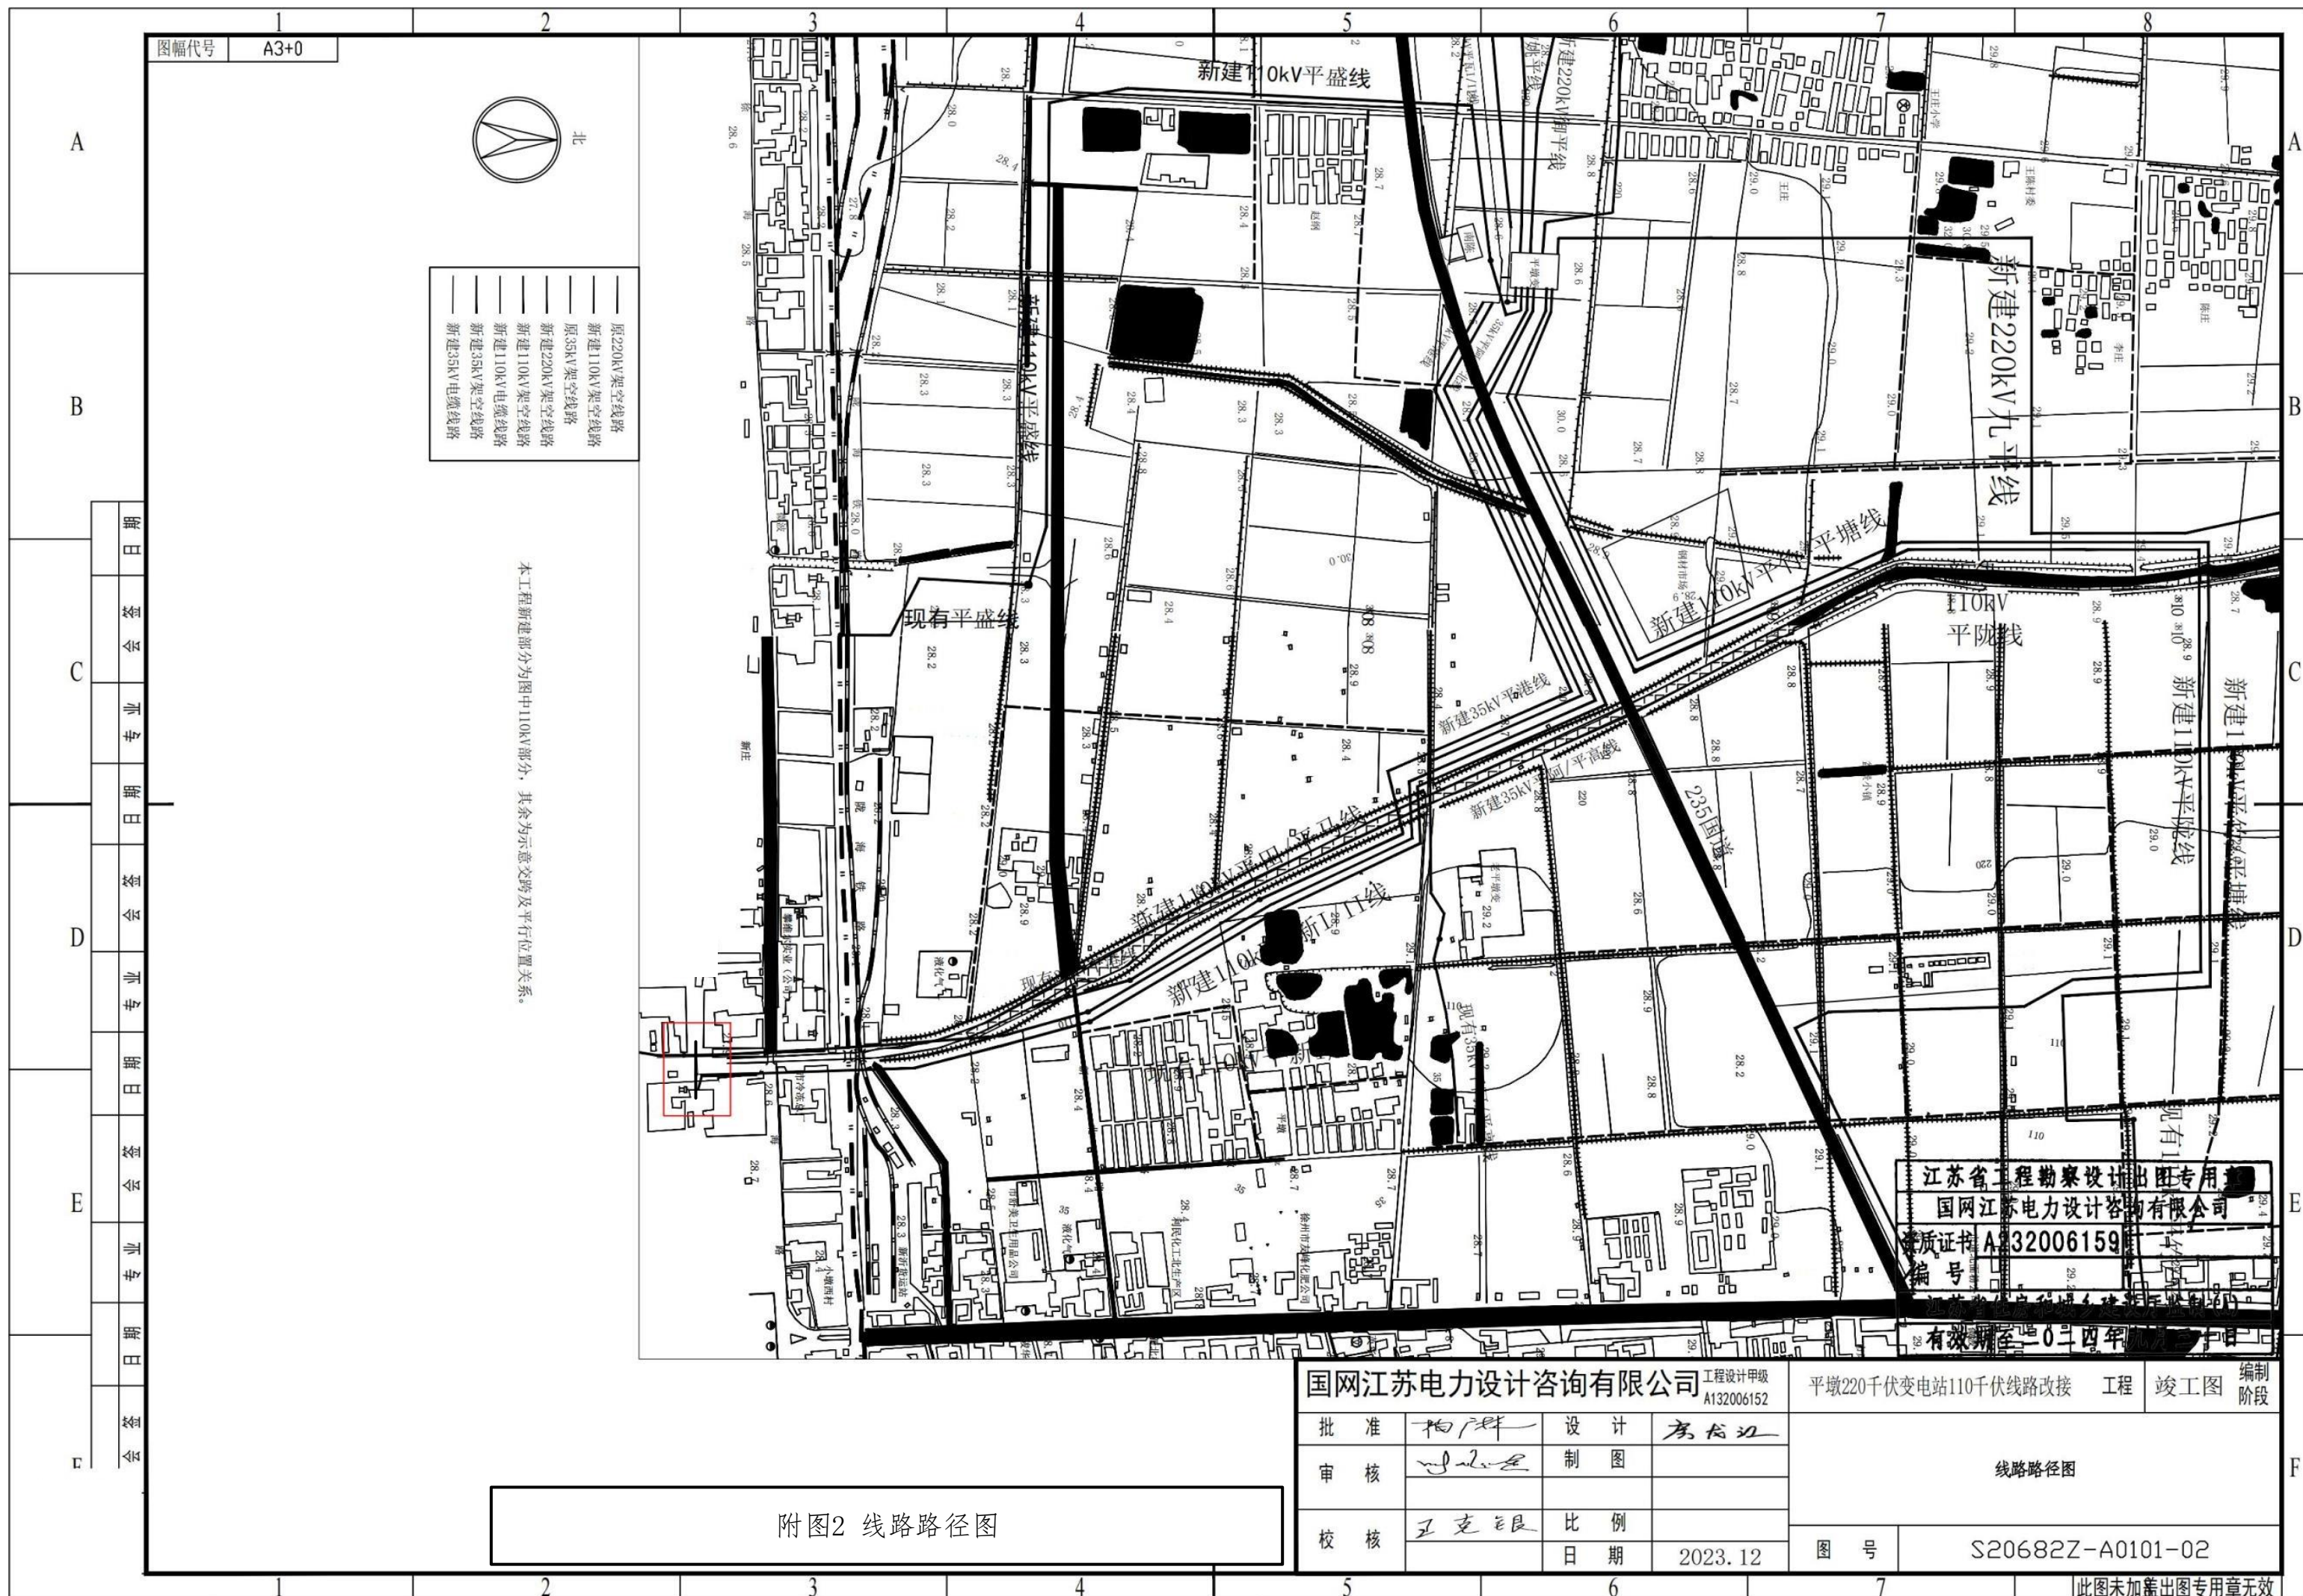
徐州平墩220千伏变电站110千伏送出工程项目



图例

— 新建线路路径

附图1 项目地理位置图



序号	监测分区	监测方法	监测点性质	监测内容
1	塔基区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测塔基区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
2	牵张场及跨越场区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测牵张场及跨越场区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
3	施工临时道路区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测施工临时道路区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。
4	电缆施工区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测电缆施工区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复等内容。
5	拆除区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测拆除区的扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施、水土流失防治效果、后期植被恢复及复耕情况等内容。

