

|           |
|-----------|
| 2025-TKST |
| 0058      |

江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目  
110 千伏送出工程

# 水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

编制单位：江苏通凯生态科技有限公司

2025 年 8 月

|           |
|-----------|
| 2025-TKST |
| 0058      |

江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目  
110 千伏送出工程

# 水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

编制单位：江苏通凯生态科技有限公司

2025 年 8 月

|  |           |
|--|-----------|
| 江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表 ..... | 1         |
| 方案报告表补充说明 .....                                      | 3         |
| <b>1 项目简况 .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>1.1 项目概况 .....</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1.1 项目基本情况 .....                                   | 3         |
| 1.1.2 项目组成情况 .....                                   | 4         |
| 1.1.3 工程布置情况 .....                                   | 5         |
| 1.1.4 工程占地情况 .....                                   | 8         |
| 1.1.5 土石方平衡情况 .....                                  | 9         |
| 1.1.6 项目施工进度情况 .....                                 | 11        |
| <b>1.2 项目区概况 .....</b>                               | <b>11</b> |
| 1.2.1 地形地貌 .....                                     | 11        |
| 1.2.2 地质地震 .....                                     | 11        |
| 1.2.3 水系情况 .....                                     | 12        |
| 1.2.4 气候特征 .....                                     | 12        |
| 1.2.5 土壤和植被 .....                                    | 13        |
| <b>1.3 水土保持分析与评价 .....</b>                           | <b>13</b> |
| <b>1.4 水土流失防治目标及防治责任范围 .....</b>                     | <b>13</b> |
| 1.4.1 设计水平年 .....                                    | 14        |
| 1.4.2 防治目标 .....                                     | 14        |
| 1.4.3 防治责任范围 .....                                   | 14        |
| <b>2 水土流失预测与水土保持措施布设 .....</b>                       | <b>16</b> |
| <b>2.1 水土流失预测 .....</b>                              | <b>16</b> |
| 2.1.1 预测单元 .....                                     | 16        |
| 2.1.2 预测时段 .....                                     | 16        |
| 2.1.3 土壤侵蚀模数 .....                                   | 16        |
| 2.1.4 预测结果 .....                                     | 18        |
| 2.1.5 水土流失危害分析 .....                                 | 19        |
| <b>2.2 水土保持措施布设 .....</b>                            | <b>19</b> |
| 2.2.1 水土保持措施总体布局 .....                               | 19        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 2.2.2 分区措施布设 .....           | 20        |
| 2.2.3 水土保持措施工程量汇总 .....      | 22        |
| 2.2.4 防治措施进度安排 .....         | 22        |
| <b>3 水土保持投资估算及效益分析 .....</b> | <b>24</b> |
| <b>3.1 投资估算成果 .....</b>      | <b>24</b> |
| <b>3.2 效益分析 .....</b>        | <b>26</b> |
| 3.2.1 水土流失治理度 .....          | 26        |
| 3.2.2 土壤流失控制比 .....          | 26        |
| 3.2.3 渣土防护率 .....            | 26        |
| 3.2.4 表土保护率 .....            | 26        |
| 3.2.5 林草植被恢复率 .....          | 27        |
| 3.2.6 林草覆盖率 .....            | 27        |
| 3.2.7 六项指标达标情况 .....         | 27        |
| <b>3.3 水土保持管理 .....</b>      | <b>29</b> |
| 3.3.1 组织管理 .....             | 29        |
| 3.3.2 后续设计 .....             | 30        |
| 3.3.3 水土保持监测和监理 .....        | 30        |
| 3.3.4 水土保持施工 .....           | 30        |
| 3.3.5 水土保持设施验收 .....         | 30        |

## 附件

- 附件 1 委托书
- 附件 2 核准批复
- 附件 3 可研批复
- 附件 4 规划文件
- 附件 5 占地情况说明函
- 附件 6 洪评承诺函

## 附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目区水系图
- 附图 3 项目总体布置图
- 附件 4 江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区图

附图 5 分区防治措施总体布局图

附图 6-1 塔基施工典型布置图（钢管杆）

附图 6-2 塔基施工典型布置图（角钢塔）

附图 7 土质排水沟、土质沉沙池典型设计图

## 江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表

|                                 |   |  |                |                               |      |                                  |
|---------------------------------|---|--|----------------|-------------------------------|------|----------------------------------|
| 项目概况                            | 位置  | 项目位于无锡市宜兴市官林镇、高塍镇境内。王家~座庄 T 接路通能源 110 千伏线路改造工程(架空)起于路通光伏升压站 110kV 架空构架 (/), 终于本期新建 T5 塔 (/)。   |                |                               |      |                                  |
|                                 | 建设内容  | <p>本工程为点型和线路工程, 根据初设规模, 共改造 110 千伏间隔 2 个, 本工程架空线路路径总长为 8.49km, 其中新建双设单架线路长 0.48km, 新建杆塔 5 基; 利用原有双设单架杆塔补挂导线 5.86km; 更换导线 0.58km; 恢复架空线路路径长 1.57km; 拆除架空线路长 0.58km, 仅拆除线路, 不涉及土建。具体包括:</p> <p>(1) 点型工程</p> <p>①王家 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程: 本期在王座 9JK 间隔线路侧加装 1 台线路单相电压互感器, 不涉及土建。</p> <p>②座庄 110 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程: 对王座间隔进行改造, 增加一组三相线路电压互感器, 不涉及土建。</p> <p>(2) 线路工程</p> <p>王家~座庄 T 接路通能源 110 千伏线路改造工程(架空): 本期新建双设单架线路路径长 0.48km, 新建角钢塔 3 基, 钢管杆 2 基, 均采用灌注桩基础; 利用 110kV 山渎 8E2 线原有双设单架杆塔补挂单回导线 5.86km; 更换原 110kV 山渎 8E2 线 10#~11#, 23#~24#导线线路路径长度为 0.58km; 恢复 110kV 山渎 8E2 线 7#~T3、T4~40#线路路径长度 0.88km, 110kV 王座 9JK 线 36#~40#线路路径长度 0.69km; 拆除 110kV 山渎线 10~11#, 23#~24#右侧导线长度 0.58km, 仅拆除线路, 不涉及土建。</p> |                |                               |      |                                  |
|                                 | 建设性质  | 新建输变电工程  |                | 总投资(万元)                       |      | /                                |
|                                 | 土建投资(万元)  | /  |                | 占地面积(m <sup>2</sup> )         |      | 永久: 410<br>临时: 5058<br>总面积: 5468 |
|                                 | 动工时间  | 2025 年 11 月  |                | 完工时间                          |      | 2026 年 3 月                       |
|                                 | 土石方(m <sup>3</sup> )  | 挖填方总量  | 挖方             | 填方                            | 借方   | 余(弃)方                            |
|                                 |   | 2530   | 1265           | 1265                          | 0    | 0                                |
|                                 | 取土(石、砂)场  | /  |                |                               |      |                                  |
|                                 | 弃土(石、砂)场  | /  |                |                               |      |                                  |
|                                 | 项目区概况   | 涉及重点防治区情况  | 江苏省省级水土流失重点预防区 |                               | 地貌类型 | 平原                               |
| 原地貌土壤侵蚀模数[t/km <sup>2</sup> ·a] |   | 160  |                | 容许土壤流失量[t/km <sup>2</sup> ·a] | 500  |                                  |
| 项目选址(线)水土保持评价                   | 项目选址(线)不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区, 不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带, 不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。但本工程无法避让江苏省省级水土流失重点预防区, 水土流失防治标准将采用南方红壤区一级标准。本工程塔基采取了灌注桩基础代替大开挖基础; 严格控制占地面积; 加强表土资源保护; 设置泥浆沉淀池, 避免泥浆外排; 设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流失。因此, 本项目无重大水土保持制约因素。 |  |                |                               |      |                                  |
| 预测水土流失总量(t)                     | 5.89  |  |                |                               |      |                                  |
| 防治责任范围(m <sup>2</sup> )         | 5468  |  |                |                               |      |                                  |

|              |                              |   |                        |  |
|--------------|------------------------------|---|------------------------|--|
| 防治标准等级及目标    | 防治标准等级                       | 南方红壤区一级标准   |                        |  |
|              | 水土流失治理度(%)                   | 98  | 土壤流失控制比                | 1.0  |
|              | 渣土防护率(%)                     | 97  | 表土保护率(%)               | 92   |
|              | 林草植被恢复率(%)                   | 98  | 林草覆盖率(%)               | 27   |
| 水土保持措施       | 防治分区                         | 工程措施  | 植物措施                   | 临时措施   |
|              | 塔基区                          | 表土剥离 223m <sup>3</sup><br>土地整治 1581m <sup>2</sup> | 撒播草籽 295m <sup>2</sup> | 泥浆沉淀池 5 座<br>防尘网苫盖 1050m <sup>2</sup><br>土质排水沟 310m<br>土质沉沙池 5 座 |
|              | 牵张场及跨越场区                     | 土地整治 3000m <sup>2</sup>                           | 撒播草籽 520m <sup>2</sup> | 铺设钢板 1000m <sup>2</sup><br>彩条布铺垫 800m <sup>2</sup>               |
|              | 施工道路区                        | 土地整治 630m <sup>2</sup>                            | /                      | 铺设钢板 600m <sup>2</sup>   |
| 水土保持投资估算(万元) | 工程措施                         | 0.86  | 植物措施                   | 0.12   |
|              | 临时措施                         | 8.89  | 水土保持补偿费                | 0.65616  |
|              | 独立费用                         | 建设管理费   |                        | 4.29   |
|              |                              | 工程建设监理费   |                        | 0.25   |
|              |                              | 科研勘测设计费   |                        | 4.00   |
| 总投资          | 19.99                        |   |                        |  |
| 编制单位         | 江苏通凯生态科技有限公司                 | 建设单位  | 国网江苏省电力有限公司无锡供电公司      |  |
| 法人代表及电话      | 徐玉奎<br>/                     | 法人代表及电话   | 完善<br>/                |  |
| 地址           | 南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 C9 栋 3 楼 | 地址  | 无锡市梁溪路 12 号            |  |
| 邮编           | 211102                       | 邮编  | 214000                 |  |
| 联系人及电话       | 余志宏/                         | 联系人及电话  | 阙云飞 /                  |  |
| 电子信箱         | /                            | 电子信箱  | /                      |  |
| 传真           | /                            | 传真  | /                      |  |

# 方案报告表补充说明

## 1 项目简况

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1 项目基本情况

建设地点：项目位于无锡市宜兴市官林镇、高塍镇境内。王家~座庄 T 接路通能源 110 千伏线路改造工程（架空）起于路通光伏升压站 110kV 架空构架（/），终于本期新建 T5 塔（/）。

建设必要性：根据《国网江苏省电力有限公司关于无锡宜兴市路通凌霞新能源有限公司路通能源宜兴官林镇 52.8 兆瓦渔光互补光伏发电项目接入系统设计方案的意见》（苏电发展接入意见〔2024〕161 号），为满足无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目的送出需求，实施江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程是十分必要的。

前期工作：（1）2025 年 3 月 21 日，宜兴市自然资源和规划局以《规划方案审批表》（审 320282202510050）同意了本工程线路规划方案；

（2）2025 年 4 月 14 日，国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司以《国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司关于江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程可行性研究报告的批复》（锡供电发展〔2025〕99 号）对本工程可研进行了批复；

（3）2025 年 5 月 19 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于南京新东善桥 500 千伏变电站第三台主变扩建工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2025〕516 号）对本工程核准进行了批复；

（4）本工程利用原有杆塔补挂导线段线路跨越新河港、范道河和范高河，建设单位国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司正在开展本工程防洪评价招标工作，涉及防洪段线路取得洪评许可后方可开建设，建设单位洪评承诺见附件。

本工程为点型工程和线路工程，根据初设规模，共改造 110 千伏间隔 2 个，本工程架空线路路径总长为 8.49km，其中新建双设单架线路长 0.48km，新建杆塔 5 基；利用原有双设单架杆塔补挂导线 5.86km；更换导线 0.58km；恢复架空线路路径长 1.57km；拆除架空线路长 0.58km，仅拆除线路，不涉及土建。具体包括：

### (1) 点型工程

①王家 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程: 本期在王座 9JK 间隔线路侧加装 1 台线路单相电压互感器, 不涉及土建。

②座庄 110 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程: 对王座间隔进行改造, 增加一组三相线路电压互感器, 不涉及土建。

### (2) 线路工程

王家~座庄 T 接路通能源 110 千伏线路改造工程 (架空): 本期新建双设单架线路路径长 0.48km, 新建角钢塔 3 基, 钢管杆 2 基, 均采用灌注桩基础; 利用 110kV 山渎 8E2 线原有双设单架杆塔补挂单回导线 5.86km; 更换原 110kV 山渎 8E2 线 10#~11#, 23#~24# 导线线路路径长度为 0.58km; 恢复 110kV 山渎 8E2 线 7#~T3、T4~40# 线路路径长度 0.88km, 110kV 王座 9JK 线 36#~40# 线路路径长度 0.69km; 拆除 110kV 山渎线 10~11#, 23#~24# 右侧导线长度 0.58km, 仅拆除线路, 不涉及土建。

工程占地: 工程总占地 5468m<sup>2</sup>, 其中永久占地 410m<sup>2</sup>, 临时占地 5058m<sup>2</sup>; 主要占用耕地、其他土地 (空闲地) 和交通运输用地 (道路绿化带)。

工程挖填方: 工程土石方挖填总量为 2530m<sup>3</sup>, 其中土石方开挖总量为 1265m<sup>3</sup> (含表土剥离 223m<sup>3</sup>), 回填总量 1265m<sup>3</sup> (含表土回覆 223m<sup>3</sup>), 无借方; 无土方。

工期安排: 工程计划于 2025 年 11 月开工, 2026 年 3 月完工, 总工期 5 个月。

工程投资: 工程总投资/万元, 其中土建投资约/万元。

#### 1.1.2 项目组成情况

本工程由国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司统一建设。经济技术指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 项目主要经济技术指标表

| 一、基本概况 |                                       |      |                 |
|--------|---------------------------------------|------|-----------------|
| 项目名称   | 江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程 | 工程性质 | 新建输变电工程         |
| 建设单位   | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司                    | 建设期  | 2025.11-2026.03 |
| 建设地点   | 无锡市宜兴市官林镇、高塍镇                         | 总投资  | /万元             |
| 电压等级   | 110kV                                 | 土建投资 | /万元             |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工程规模              | <p>本工程为点型工程和线路工程，根据初设规模，共改造 110 千伏间隔 2 个，本工程架空线路路径总长为 8.49km，其中新建双设单架线路长 0.48km，新建杆塔 5 基；利用原有双设单架杆塔补挂导线 5.86km；更换导线 0.58km；恢复架空线路路径长 1.57km；拆除架空线路长 0.58km，仅拆除线路，不涉及土建。具体包括：</p> <p>(1) 点型工程</p> <p>①王家 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期在王座 9JK 间隔线路侧加装 1 台线路单相电压互感器，不涉及土建。</p> <p>②座庄 110 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：对王座间隔进行改造，增加一组三相线路电压互感器，不涉及土建。</p> <p>(2) 线路工程</p> <p>王家~座庄 T 接路通能源 110 千伏线路改造工程（架空）：本期新建双设单架线路路径长 0.48km，新建角钢塔 3 基，钢管杆 2 基，均采用灌注桩基础；利用 110kV 山渎 8E2 线原有双设单架杆塔补挂单回导线 5.86km；更换原 110kV 山渎 8E2 线 10#~11#，23#~24#导线线路路径长度为 0.58km；恢复 110kV 山渎 8E2 线 7#~T3、T4~40#线路路径长度 0.88km，110kV 王座 9JK 线 36#~40#线路路径长度 0.69km；拆除 110kV 山渎线 10~11#，23#~24#右侧导线长度 0.58km，仅拆除线路，不涉及土建。</p> |
| <b>二、架空经济技术指标</b> |   |
| 电压等级              | 110kV   |
| 架空线路长度            | 8.49km（新建双设单架线路长 0.48km，利用原有双设单架杆塔补挂导线 5.86km；更换导线 0.58km，恢复架空线路路径长 1.57km）   |
| 杆塔使用基数            | 5 基（角钢塔 3 基、钢管杆 2 基）  |
| 导线型号              | JL3/G1A-300/25、2×JL3/G1A-300/25   |
| 地线型号              | OPGW-120  |
| 绝缘子型号             | FXBW-110/70   |

### 1.1.3 工程布置情况

#### (1) 平面布置

王家~座庄 T 接路通能源 110 千伏线路改造工程（架空）

线路起自路通光伏升压站 110kV 架空构架，向南架设至 110kV 山渎线档下，后利用山渎线空横担放线至 39#小号侧约 85m 处，新立 T4 杆，然后向南至 110kV 王座线线档下新立 T5 杆，用并继线 T 接王座线，形成升压站~座庄变~王家变网络结构。

表 1.1-2 本项目新建杆塔点位坐标表

| 塔基编号 | 纬度（北纬） | 经度（东经） | 行政区划 | 塔基编号 | 纬度（北纬） | 经度（东经） | 行政区划 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|
| T1   | /      | /      | /    | T2   | /      | /      | /    |
| T3   | /      | /      | /    | T4   | /      | /      | /    |
| T5   | /      | /      | /    |      |        |        |      |

#### (2) 竖向设计

线路所经地区属于太湖水网平原地貌单元，沿线地形平坦，水系发育。线路沿线高程为 1.80~8.40m（1985 国家高程基准，下同），沿线以耕地、其他土地（空闲地）和交通运输用地（绿化带）为主，交通条件一般。本工程塔基竖向设计情况见表 1.1-3。

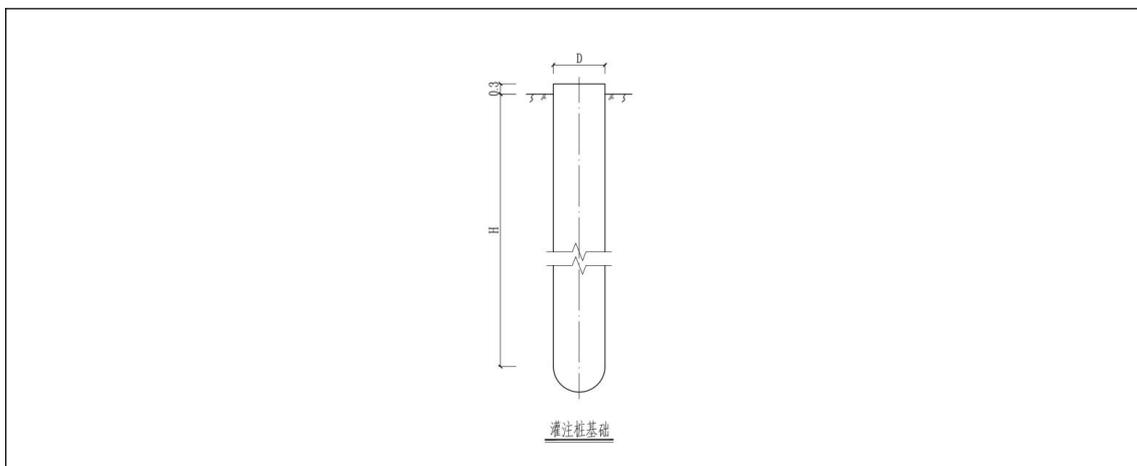


图 1.1-3 本工程塔基基础一览表

表 1.1-3 本工程塔基竖向设计一览表

| 基础类型  | 杆塔名称           | 基础数量 | 桩数(个) | 桩径(m) | 埋深(m) |
|-------|----------------|------|-------|-------|-------|
| 灌注桩基础 | 110-DC21D-ZMC1 | 4    | 1     | 0.8   | 12    |
|       | 110-DC21D-DJC1 | 4    | 1     | 1.2   | 14    |
|       | 110-FD21S-TJ   | 4    | 1     | 1.8   | 28    |
|       | 110-DD21GS-J1  | 1    | 1     | 1.8   | 11    |
|       | 110-FD21GS-DJ  | 1    | 1     | 2.6   | 19    |

### (3) 施工组织

#### ① 施工用水、排水、用电、通信系统

用水：线路单个塔基用水量较少，施工过程中一般根据周边水源情况确定取水方案，线路附近有水源的，可就近采用取水管引接，如线路附近无任何水源，则可考虑采用水车就近输送水源来满足施工用水。

排水：本工程施工临时排水通过排水沟收集，至沉沙池沉淀后排入临近的排水沟中。本方案通过分析地形地貌确定排水方向，调查土壤类型和地下水情况，了解土壤透水性能，确定排水深度，同时调查分析施工现场周边环境情况，确定不会对周边环境造成影响。

用电：本工程施工过程中用电根据周边设施情况安排，周围已有用电用户区，可按照安全用电规定引接用于施工用电，无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源。

通信:本工程施工场地内施工人员相对较少,可利用无线通信设备进行联络。

#### ②施工生产生活区

本工程根据沿线的交通情况,拟租用已有库房或场地作为材料站,不新增防治责任范围。具体地点由施工单位根据施工中具体情况选定,便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。此外线路施工时由于线路塔基施工较分散,施工周期不长,因此工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。

#### ③临时堆土

本工程塔基施工开挖的土方临时堆放在施工区域内设置的临时堆土区,并采用防尘网进行苫盖;堆土边坡比不大于 1:1.0,堆土高度不超过 2.5m,施工后期全部回填并压实平整。

#### ④施工道路

本工程施工对外交通主要解决建筑材料、塔材和牵引张拉设备等运输问题,可充分利用沿线附近的国道、省道、县道、乡道、村道通行,在已有的乡道和村道不能满足运输要求时适当的加宽改造;在无现有道路的情况下,开辟新的施工临时道路。经过实地踏勘本工程需设临时施工道路,长度约 180m,平均宽度约 3.5m,总占地面积约 630m<sup>2</sup>。

#### ⑤牵张场设置

为方便机械设备和导线的运输与吊装,在牵张场地内规划出施工通道,通道宽度在 4.0m 左右,一般满足一辆大卡车通行便可,通道做适当平整后铺设钢板,钢板铺设做到横平竖直,钢板搭头无上翘。根据设计文件、工程路线走向及地形条件,本工程布设牵张场 3 处,平均每处占地面积为 600m<sup>2</sup>,因此牵张场总占地面积约为 1800m<sup>2</sup>。

#### ⑥跨越施工场地

本工程新建段架空线路沿线需跨越其他公路、S240、科技大道、新河港、范道河各 1 次、桃园路 2 次、范高河 3 次、其他河流 5 次,共考虑布置 15 处跨越施工场地,平均每处占地面积按 80m<sup>2</sup> 计列,因此跨越场总占地面积为 1200m<sup>2</sup>,工程主要跨越情况统计见表 1.1-4 及图 1.1-4。

表 1.1-4 工程主要跨越情况统计表

| 序号 | 跨越对象 | 备注                            |
|----|------|-------------------------------|
| 1  | 道路   | 其他公路、S240 和科技大道各 1 次,桃园路 2 次  |
| 2  | 河流   | 新河港和范道河各 1 次,范高河 3 次,其他河流 5 次 |

|    |   |
|----|---|
| 合计 | 有 15 次跨越，结合现场跨越情况共布设跨越场 15 处，平均每处占地面积按 80m <sup>2</sup> 计列，共占地 1200m <sup>2</sup> 。 |
|----|---|

#### (4) 施工工艺

##### ① 塔基施工

##### 1) 表土剥离保护

塔基开挖前做好表层土壤的剥离和保护，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，顶部采用防尘网进行苫盖。

##### 2) 灌注桩基础

灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔：成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注入人工泥浆或利用钻削下来的粘性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。护壁泥浆与钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。当钻孔达到规定深度后，安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的泥浆被抽吸出来，施工结束后，泥浆在泥浆沉淀池中沉淀干化，就地深埋在施工区域内。每基灌注桩基础施工场地需设置一个泥浆沉淀池。

#### 1.1.4 工程占地情况

工程总占地面积约为 5468m<sup>2</sup>，其中永久占地为 410m<sup>2</sup>，为塔基区永久占地；临时占地为 5058m<sup>2</sup>，含塔基区临时占地 1428m<sup>2</sup>、牵张场及跨越场区占地 3000m<sup>2</sup>、施工道路区占地 630m<sup>2</sup>。

##### (1) 塔基区

根据现场勘察和查阅设计文件，本工程新建 110 千伏架空线路长 0.48km，新建角钢塔 3 基，新建钢管杆 2 基。新建一般角钢塔永久占地按  $(\text{根开}/1000 + \text{基础立柱宽} + 2\text{m})^2 / \text{基}$  计列，新建终端角钢塔永久占地按  $(\text{根开}/1000 + \text{基础立柱宽} + 5\text{m})^2 / \text{基}$  计列，塔基施工总占地均按  $(\text{根开}/1000 + \text{基础立柱宽} + 14\text{m})^2 / \text{基}$  计列；新建终端钢管杆永久占地按  $(\text{立柱直径}/1000 + 5\text{m})^2 / \text{基}$  计算，总占地按  $(\text{立柱直径}/1000 + 14\text{m})^2 / \text{基}$  计算。

本工程塔基区总占地面积 1838m<sup>2</sup>，其中永久占地 410m<sup>2</sup>，临时占地 1428m<sup>2</sup>。本工程线路铁塔占地情况见表 1.1-5。

##### (2) 牵张场及跨越场区

根据主体设计文件及线路沿线走向，本工程沿线需设置牵张场 3 处，平均每

处占地面积约为 600m<sup>2</sup>；共设置跨越场地 15 处，平均每处占地面积约为 80m<sup>2</sup>。因此，本工程牵张场及跨越场区总占地面积为 3000m<sup>2</sup>，均为临时占地。

### (3) 施工道路区

本工程需布设施工临时道路长度约 180m，平均宽度约 3.5m，施工临时道路占地面积为 630m<sup>2</sup>，均为临时占地。

本工程各分区占地情况见表 1.1-6。

表 1.1-6 工程分区占地情况统计表

单位：m<sup>2</sup>

| 分区       | 占地性质 |      | 占地类型 |        |      | 总占地  |
|----------|------|------|------|--------|------|------|
|          | 永久   | 临时   | 耕地   | 交通运输用地 | 其他土地 |      |
| 塔基区      | 410  | 1428 | 1439 | 167    | 232  | 1838 |
| 牵张场及跨越场区 | 0    | 3000 | 2480 | 240    | 280  | 3000 |
| 施工道路区    | 0    | 630  | 630  | 0      | 0    | 630  |
| 合计       | 410  | 5058 | 4549 | 407    | 512  | 5468 |

注：本工程占用的其他土地均为空闲地，占用的交通运输用地为道路绿化带。

### 1.1.5 土石方平衡情况

#### (1) 塔基区

塔基区占用耕地、空闲地和绿化带，可剥离表土厚度为 30cm。施工前期对塔基区永久占地和泥浆沉淀池等开挖区域进行表土剥离，剥离面积 744m<sup>2</sup>，表土剥离量为 223m<sup>3</sup>。剥离的表土堆放在塔基区的临时堆土区域，临时堆土采用防尘网临时苫盖。施工结束后对塔基区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土全部回覆利用，表土回覆量为 223m<sup>3</sup>。

通过现场勘查和查阅设计资料，挖填土方情况统计见表 1.1-7。

通过上表计算可得，全线塔基基础开挖产生的土方、钻渣和泥浆沉淀池开挖产生的土方共约为 1002m<sup>3</sup>。施工期在塔基区四周需设置临时土质排水沟，平均每个钢管杆设置临时排水沟 50m，平均每个角钢塔设置临时排水沟 70m，共计开挖排水沟 310m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 24.8m<sup>3</sup>。在每基塔排水沟末端设置临时土质沉沙池，沉沙池放坡 1:1 开挖，池口尺寸长×宽为 3m×2.5m，深 1m，容积 3m<sup>3</sup>，共计 5 座，开挖土方 15m<sup>3</sup>。

综上所述，塔基区挖方量 1265m<sup>3</sup>（含表土剥离 223m<sup>3</sup>，基础开挖 1042m<sup>3</sup>），填方量 1265m<sup>3</sup>（含表土回覆 223m<sup>3</sup>，基础回填 1042m<sup>3</sup>），无余方；无借方。

## (2) 牵张场及跨越场区

牵张场及跨越场区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故牵张场及跨越场区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

## (3) 施工道路区

施工道路区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故施工道路区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

## (4) 工程土石方汇总

本工程土石方挖填总量为 2530m<sup>3</sup>，其中土石方开挖总量为 1265m<sup>3</sup>（含表土剥离 223m<sup>3</sup>），回填总量 1265m<sup>3</sup>（含表土回覆 223m<sup>3</sup>），无借方；无余方。具体土方平衡情况见表 1.1-8。

表 1.1-8 土石方挖填平衡情况表

单位：m<sup>3</sup>

| 工程分区      | 开挖          |      | 回填          |      | 借方       | 余方       |
|-----------|-------------|------|-------------|------|----------|----------|
|           | 表土剥离        | 基础开挖 | 表土回覆        | 基础回填 |          |          |
| 塔基区       | 223         | 1042 | 223         | 1042 | 0        | 0        |
| 牵张场及跨越场区  | 0           | 0    | 0           | 0    | 0        | 0        |
| 施工道路区     | 0           | 0    | 0           | 0    | 0        | 0        |
| 小计        | 223         | 1042 | 223         | 1042 | 0        | 0        |
| <b>合计</b> | <b>1265</b> |      | <b>1265</b> |      | <b>0</b> | <b>0</b> |

注：各行均可按“开挖+借方=回填+余方”进行平衡。

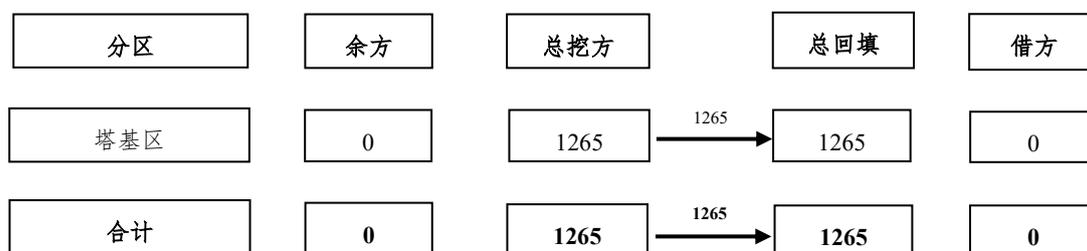


图 1.1-5 土石方平衡流向框图 单位：m<sup>3</sup>

表 1.1-9 表土平衡一览表

单位：m<sup>3</sup>

| 分区  | 表土剥离       | 表土回覆       | 调入       | 调出       | 借方       | 综合利用     |
|-----|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 塔基区 | 223        | 223        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 合计  | <b>223</b> | <b>223</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

图 1.1-6 表土平衡流向框图 单位：m<sup>3</sup>

### 1.1.6 项目施工进度情况

本项目主体工程施工进度情况见表 1.1-10。

表 1.1-10 项目主体工程施工进度表

| 工程名称 |      | 施工期    |       |        |       |       |
|------|------|--------|-------|--------|-------|-------|
|      |      | 2025 年 |       | 2026 年 |       |       |
|      |      | 11 月   | 12 月  | 1 月    | 2 月   | 3 月   |
| 杆塔施工 | 基础施工 | —————  |       |        |       |       |
|      | 杆塔组立 |        | ————— |        |       |       |
|      | 架线施工 |        | ————— | —————  | ————— |       |
|      | 场地整理 |        |       |        |       | ————— |

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 地形地貌

线路沿线地势平坦，地面高程为 1.80~8.40m，沿线以耕地、其他土地、交通运输用地为主，交通条件一般。项目所在地属太湖水网平原地貌单元。

### 1.2.2 地质地震

项目区在勘探深度范围内的地基土主要为第四系全新统冲积成因的粉质黏土，局部分布一定厚度的素填土。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016），项目区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第一组。

线路沿线场地内地下水按其埋藏条件将其划分为潜水和浅层承压水。1.潜水：该层水水量变化较大，主要补给源为大气降水，其水位随季节变化明显，该层水位年变化幅度一般为 0.50~1.00m 左右。2.浅层承压水：主要赋存于⑥粉土夹粉砂层中，补给来源主要为周边明河水，排泄于人工开采及对其它含水层的越

流补给，该水位年变化幅度范围一般在 1.00~1.50m 之间。

### 1.2.3 水系情况

宜兴市位于太湖湖西地区，属于太湖流域水系，统属长江流域太湖区南溪水系，承泄溧阳、金坛客水，常年向东流入太湖。宜兴为典型的江南水乡，河网纵横交错、星罗棋布，不仅拥有太湖、溇湖、东沅、西沅、团沅等大型湖泊，而且包括芜申运河、武宜运河、西溪河等大型河流，以及横山水库、七里亭水库、黄墅水库等水域。该地丘陵山区多为溪流涧河，平原圩区为河网，约有河道 3700 条，总长 3242km；其中主要河道 23 条，5km 以上的有 68 条，河流密度约 2.27km/km<sup>2</sup>；其水系可划分为南溪水系、洮溇太水系、蠡河水系、凰川水系。本工程利用原有杆塔补挂导线段线路跨越新河港、范道河和范高河。范道河和范高河均为等外级航道（通航标准低于VII级）。项目周边水系为马公荡和溇湖。

溇湖，俗称筛子湖，亦称西溇湖和西溇沙子湖和西太湖，位于武进西南部与宜兴东北部间，为武进和宜兴共享，是苏南地区仅次于太湖的第二大湖泊，溇湖面积约 25 万亩（约 166.7km<sup>2</sup>），平均水深不足 1.5m。

马公荡位于江苏省宜兴市城北处。东南为高家镇。东北为范道乡。北为钮家乡。接纳北溪河、南溪河来水，经调蓄后东入溇湖。西与西沅相沟通。长 2.6km。最宽处 1.9km。平均水深 1.25m，蓄水量 380 万 m<sup>3</sup>。

### 1.2.4 气候特征

项目区所在的江苏省无锡市宜兴市，四季分明、雨量充沛，属北亚热带湿润季风气候。冬季处于北方强大反气旋控制，大气环流形式比较稳定，以偏北气流为主。夏季由于受到副热带高压的控制，天气炎热多雨，风向以东南风为主。春秋两季为东夏季风交替时期，常出现冷暖、干湿多变的天气。根据宜兴市气象站资料（1955~2022 年），项目区多年气象要素情况如下：

表 1.2-1 项目区域气象特征值一览表

| 项目 | 内容    |    | 单位 | 宜兴市                |
|----|-------|----|----|--------------------|
| 气温 | 平均    | 全年 | °C | 15.7               |
|    | 极值    | 最高 | °C | 39.6 (1958.8.22)   |
|    |       | 最低 | °C | -13.1 (1977.1.31)  |
| 降水 | 平均    | 多年 | mm | 1221.4             |
|    | 最大年降水 | 多年 | mm | 1738.4 (1957)      |
|    | 最大月降水 | 多年 | mm | 556.6 (1957.07)    |
|    | 最大日降水 | 多年 | mm | 236.7 (1957.07.01) |

|      |           |    |     |        |
|------|-----------|----|-----|--------|
|      | 最大 24h 降水 | 多年 | mm  | 242.8  |
| 雷暴   | 平均雷暴天数    |    | d   | 33.5   |
|      | 年最多雷暴天数   |    | d   | 65     |
| 蒸发量  | 年平均蒸发量    |    | mm  | 1208.7 |
| 相对湿度 | 多年平均      |    | %   | 75     |
| 风速   | 多年年均      |    | m/s | 2.9    |
| 风向   | 全年主导风向    |    | /   | SE     |
| 无霜期  | 全年        |    | d   | 240    |

### 1.2.5 土壤和植被

无锡市土壤类型包括水稻土类、潮土类及黄棕壤土类等，项目区土壤类型主要为水稻土，项目区可剥离表土厚度为 30cm。

无锡市植被类型为北亚热带常绿落叶阔叶混交林，除栽培植物外，拥有自然分布于地区内以及外来归化的野生维管束植物共 141 科、497 属、950 种、75 变种。无锡气候适宜，优势树种众多，主要有榉树、朴树、水杉、雪松等。项目区占地现状主要为耕地、其他土地和交通运输用地，林草覆盖率为 20%。

### 1.3 水土保持分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）对工程水土保持制约性因素进行分析和评价。工程所在区不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；不属于水土流失严重、生态脆弱的地区；不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区；不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地，风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地和生态脆弱区等。根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农〔2014〕48 号），项目区所在地官林镇和高塍镇均属于江苏省省级水土流失重点预防区。

由于项目选址选线无法避让江苏省省级水土流失重点预防区，本工程塔基采取了灌注桩基础代替大开挖基础，加强表土资源保护；设置泥浆沉淀池，避免泥浆外排；设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流失。因此，本项目无重大水土保持制约因素。

### 1.4 水土流失防治目标及防治责任范围

### 1.4.1 设计水平年

主体工程计划 2025 年 11 月开工，2026 年 3 月完工，根据主体工程施工时间和水土保持措施实施进度安排，确认本方案设计水平年为主体工程完工后当年，即 2026 年。

### 1.4.2 防治目标

本项目区所在地位于无锡市宜兴市官林镇、高塍镇境内，根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，项目区属于南方红壤区——江淮丘陵及下游平原区——太湖丘陵平原水质维护人居环境维护区——苏锡常沿江平原人居环境维护农田防护区。根据《省水利厅关于发布〈江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区〉的公告》（苏水农〔2014〕48 号），项目区所在地官林镇和高塍镇均属于江苏省省级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目水土流失防治标准应执行南方红壤区一级标准。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）4.0.7 节规定土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）3.2.2 节第 4 条规定对无法避让的水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点。

因此本工程水土流失防治目标如下：施工期渣土防护率应达 95%，表土保护率应达 92%；至设计水平年，水土流失治理度应达 98%，土壤流失控制比应达 1.0，渣土防护率应达 97%，表土保护率应达 92%，林草植被恢复率应达 98%，林草覆盖率应为 27%。防治目标具体情况见表 1.4-1：

表 1.4-1 防治标准指标计算表

| 指标         | 标准值 |       | 侵蚀强度调整 | 两区调整           | 方案目标值 |       |
|------------|-----|-------|--------|----------------|-------|-------|
|            | 施工期 | 设计水平年 | 微度     | 江苏省省级水土流失重点预防区 | 施工期   | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | /   | 98    | /      | /              | /     | 98    |
| 土壤流失控制比    | /   | 0.9   | +0.1   | /              | /     | 1.0   |
| 渣土防护率（%）   | 95  | 97    | /      | /              | 95    | 97    |
| 表土保护率（%）   | 92  | 92    | /      | /              | 92    | 92    |
| 林草植被恢复率（%） | /   | 98    | /      | /              | /     | 98    |
| 林草覆盖率（%）   | /   | 25    | /      | +2             | /     | 27    |

### 1.4.3 防治责任范围

按照“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），结合本工程占地概况、水土流失影响分析，对工程建设及生产可能造成水土流失范围进行界定，以确定水土流失防治责任范围。确定本工程水土流失防治责任范围为 5468m<sup>2</sup>，其中永久占地为 410m<sup>2</sup>，临时占地为 5058m<sup>2</sup>。

表 1.4-2 水土流失防治责任范围表

单位：m<sup>2</sup>

| 防治分区       | 占地性质       |             | 防治责任范围      |
|------------|------------|-------------|-------------|
|            | 永久占地面积     | 临时占地面积      |             |
| 塔基区        | 410        | 1428        | 1838        |
| 牵张场及跨越场区   | 0          | 3000        | 3000        |
| 施工道路区      | 0          | 630         | 630         |
| <b>合 计</b> | <b>410</b> | <b>5058</b> | <b>5468</b> |

## 2 水土流失预测与水土保持措施布设

### 2.1 水土流失预测

#### 2.1.1 预测单元

本工程水土流失预测范围为 5468m<sup>2</sup>。预测单元为工程建设扰动地表的时段和形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本工程的预测单元为塔基区、牵张场及跨越场区和施工道路区。

#### 2.1.2 预测时段

本工程为新建输变电工程，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。各区域水土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，并按照最不利情况考虑。施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。无锡市雨季主要是 5~9 月份。

本工程施工期为 2025 年 11 月~2026 年 3 月，自然恢复期取完工后 2 年。根据项目本身建设进度，水土流失预测时段情况详见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目水土流失预测分区及时段表

| 阶段    | 预测单元     | 施工时段            | 预测时段 (a) | 主要内容                   |
|-------|----------|-----------------|----------|------------------------|
| 施工期   | 塔基区      | 2025.11-2026.03 | 0.60     | 塔基基础施工<br>(每基塔平均施工3个月) |
|       | 牵张场及跨越场区 | 2025.12-2026.03 | 0.60     | 架线施工<br>(平均每处施工3个月)    |
|       | 施工道路区    | 2025.11-2026.03 | 0.60     | 车辆占压<br>(平均每处施工3个月)    |
| 自然恢复期 | 塔基区      | 2026.04-2028.03 | 2.00     | 无                      |
|       | 牵张场及跨越场区 | 2026.04-2028.03 | 2.00     | 无                      |
|       | 施工道路区    | 2026.04-2028.03 | 2.00     | 无                      |

#### 2.1.3 土壤侵蚀模数

根据现场勘查项目地形主要为平原，参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目所在地土壤侵蚀强度为微度，确定土壤侵蚀模数背景值为 160t/(km<sup>2</sup>·a)。

本工程施工期各区域侵蚀模数采取类比分析法，通过类比“无锡华润电力宜兴徐舍 42.9 兆瓦分散式风电项目 110 千伏送出工程”获得。类比工程已于 2023 年 11 月通过了国网江苏省电力有限公司组织的水土保持设施验收，并投入运行，类比工程水土保持监测单位为江苏通凯生态科技有限公司，验收报告编制单位为

江苏核众环境监测技术有限公司。参考性分析对照详见表 2.1-2。

表 2.1-2 参考性分析对照表

| 项目     | 江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程 | 无锡华润电力宜兴徐舍 42.9 兆瓦分散式风电项目 110 千伏送出工程 | 类比结果 |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 地理位置   | 无锡市宜兴市                                | 无锡市宜兴市                               | 相同   |
| 气候条件   | 北亚热带湿润季风气候                            | 北亚热带湿润季风气候                           | 相同   |
| 年平均降水量 | 1221.4mm                              | 1221.4mm                             | 相同   |
| 地形地貌   | 平原                                    | 平原                                   | 相同   |
| 土壤类型   | 水稻土                                   | 水稻土                                  | 相同   |
| 水土流失强度 | 微度水蚀                                  | 微度水蚀                                 | 相同   |

表 2.1-3 类比项目实际监测侵蚀模数统计表

| 预测时段 | 无锡华润电力宜兴徐舍 42.9 兆瓦分散式风电项目 110 千伏送出工程（类比） |                                  |
|------|--|----------------------------------|
|      | 防治分区                                     | 实际监测侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)] |
| 施工期  | 变电站改造区                                   | 1002                             |
|      | 塔基区                                      | 1100                             |
|      | 牵张场及跨越场区                                 | 800                              |
|      | 电缆施工区                                    | 1097                             |
|      | 施工临时道路区                                  | 898                              |
|      | 拆除区                                      | 958                              |

本工程与类比工程均为输变电项目，均位于无锡市宜兴市，气候条件、地形地貌、年平均降水量、土壤类型和水土流失强度等相同，因此本工程与类比工程有一定的可比性。根据各区的施工特点对类比工程的侵蚀模数进行修正后可应用于本工程。

针对本工程的环境条件、扰动强度和防护措施条件等实际情况，对扰动地表后侵蚀模数的取值，在下列三个方面进行修正。

1) 环境条件：本工程多年平均降水量为 1221.4mm，类比工程的多年平均降水量为 1221.4mm，降雨量相同，因此，设置修正系数为 1.0。

2) 扰动强度：本工程土石方工程量和扰动地表的强度与类比工程相近，因此，根据不同分区，设置修正系数为 1.0。

3) 防护措施条件：类比工程所列监测结果是在工程施工过程中采取了一定的水土保持措施的基础上进行监测的，若施工过程中不采取任何措施，则工程扰动后的土壤侵蚀模数将会比监测结果大。而水土流失量预测的基础是按生产建设

项目正常的设计功能，在无水土保持工程条件下可能产生的土壤流失量。因此，设置修正系数为 1.3-1.5。

自然恢复期：项目建成，植被种植完成后，开始发挥保水保土的作用，塔基区除硬化部分自然恢复期水土流失治理达标，土壤侵蚀模数达到背景值，各防治分区的侵蚀模数见表 2.1-4。

表 2.1-4 扰动后土壤侵蚀模数类比表

| 预测时段 | 无锡华润电力宜兴徐舍 42.9 兆瓦分散式风电项目 110 千伏送出工程（类比工程） |                                   | 调整系数 |      |        | 江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程（本工程） |                                   |
|------|--|-----------------------------------|------|------|--------|--|-----------------------------------|
|      | 预测单元                                       | 监测土壤侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)] | 环境条件 | 扰动强度 | 防护措施条件 | 预测单元                                       | 预测土壤侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)] |
| 施工期  | 塔基区  | 1100                              | 1    | 1    | 1.5    | 塔基区  | 1650                              |
|      | 牵张及跨越场区                                    | 800                               | 1    | 1    | 1.3    | 牵张场及跨越场区                                   | 1040                              |
|      | 施工临时道路区                                    | 898                               | 1    | 1    | 1.3    | 施工道路区                                      | 1167                              |

#### 2.1.4 预测结果

根据上述确定的土壤侵蚀模数，按公式法进行各分区水土流失量估算。结合项目预测单元及预测时段划分，预测项目建设时如不采取水土保持措施可能产生土壤流失量，结果见表 2.1-5。

根据分时段计算结果可知，如不采取水保措施，项目在整个建设期可能产生土壤流失总量为 5.89t，新增土壤流失量为 3.70t。

表 2.1-5 项目水土流失量预测计算成果表

| 预测时段     | 预测单元     | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 预测时段 (a) | 侵蚀模数背景值 [t/(km <sup>2</sup> ·a)] | 背景流失量 (t) | 扰动后侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)] | 水土流失总量 (t) | 新增流失量 (t) | 新增占比 (%) |
|----------|----------|----------------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|----------|
| 施工期      | 塔基区      | 1838                 | 0.6      | 160                              | 0.18      | 1650                             | 1.82       | 1.64      | 97.30    |
|          | 牵张场及跨越场区 | 3000                 | 0.6      | 160                              | 0.29      | 1040                             | 1.87       | 1.58      |          |
|          | 施工道路区    | 630                  | 0.6      | 160                              | 0.06      | 1167                             | 0.44       | 0.38      |          |
| 小计       | /        | 5468                 | /        | /                                | 0.53      | /                                | 4.13       | 3.6       |          |
| 自然恢复期第一年 | 塔基区      | 1581                 | 1        | 160                              | 0.25      | 180                              | 0.28       | 0.03      | 2.70     |
|          | 牵张场及跨越场区 | 3000                 | 1        | 160                              | 0.48      | 180                              | 0.54       | 0.06      |          |
|          | 施工道路区    | 630                  | 1        | 160                              | 0.1       | 180                              | 0.11       | 0.01      |          |
| 小计       | /        | 5211                 | /        | /                                | 0.83      | /                                | 0.93       | 0.1       |          |
| 自然恢复期第二年 | 塔基区      | 1581                 | 1        | 160                              | 0.25      | 160                              | 0.25       | 0         |          |
|          | 牵张场及跨越场区 | 3000                 | 1        | 160                              | 0.48      | 160                              | 0.48       | 0         |          |

|    |       |      |   |     |      |     |      |      |     |
|----|-------|------|---|-----|------|-----|------|------|-----|
| 二年 | 施工道路区 | 630  | 1 | 160 | 0.1  | 160 | 0.1  | 0    |     |
| 小计 | /     | 5211 | / | /   | 0.83 | /   | 0.83 | 0    |     |
| 合计 |       |      |   |     | 2.19 | /   | 5.89 | 3.70 | 100 |

注：自然恢复期塔基区水土流失面积已扣除硬化占地（新建一般角钢塔水土流失面积已扣除塔脚硬化占地，新建电缆终端塔水土流失面积已扣除永久占地）。

### 2.1.5 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力的下降、淤积水系等问题，而且治理难度大、费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成水土流失危害进行预测，根据预测结果采取有针对性的防治措施。

工程施工过程中可能造成水土流失危害，主要包括以下几个方面：

（1）破坏原地貌、加速土壤侵蚀。项目施工过程中扰动原地貌，损坏原有水土保持设施，原地貌破坏后涵养水源、保持水土功能丧失，地表裸露，土壤抗侵蚀能力急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，土壤侵蚀加速。

（2）项目在基础开挖、机械占压等施工过程中，如遇较强的降雨，若没有防护措施，在降雨及人为因素作用下将会产生大量泥沙，造成较为严重的水土流失，对项目本身的施工安全也会造成一定的威胁。

（3）工程施工中需开挖、堆置、回填土方，土方装卸堆存过程中易产生粉尘，在风力作用下，也易引起风蚀，并产生大气粉尘污染，对局部生态环境造成不良影响。

（4）工程施工扰动过程中，施工取水用水，排水排污等，如处理不充分，沉淀不彻底，容易破坏周边水系水质，严重时会对周边水系生态系统造成不良影响。

## 2.2 水土保持措施布设

### 2.2.1 水土保持措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，补充布设水土保持措施，开发与防治相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时突出重点防治工程措施和临时防治工程措施。各区水土流失防治措施设置情况详见表 2.2-1。

表 2.2-1 防治措施总体布局表

| 防治分区     | 措施类型 | 主体工程已有措施  | 本方案补充设计措施         |
|----------|------|-----------|-------------------|
| 塔基区      | 工程措施 | 表土剥离、土地整治 | /                 |
|          | 植物措施 | 撒播草籽      | /                 |
|          | 临时措施 | 泥浆沉淀池     | 土质排水沟、土质沉沙池、防尘网苫盖 |
| 牵张场及跨越场区 | 工程措施 | /         | 土地整治              |
|          | 植物措施 | /         | 撒播草籽              |
|          | 临时措施 | 铺设钢板      | 彩条布铺垫             |
| 施工道路区    | 工程措施 | /         | 土地整治              |
|          | 临时措施 | 铺设钢板      | /                 |

### 2.2.2 分区措施布设

#### (1) 塔基区

##### ① 工程措施

表土剥离:本工程主体设计中已考虑施工前期对塔基区永久占地和泥浆沉淀池等开挖区域进行表土剥离,剥离面积 744m<sup>2</sup>,表土剥离量为 223m<sup>3</sup>。剥离的表层土堆放于塔基临时占地区域,待土建施工完成后全部用作覆土。

土地整治:本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区除硬化外裸露地表进行土地整治,主要包括场地清理、平整、表土回覆,整治面积为 1581m<sup>2</sup>,表土回覆量为 223m<sup>3</sup>,整治后的土地约 1286m<sup>2</sup>达到复垦条件后交由土地权所有人进行复耕,其余 295m<sup>2</sup>进行植被恢复。

##### ② 植物措施

撒播草籽:本工程主体设计中已考虑施工后期对塔基区占用绿化带和空闲地区域采取撒播草籽的措施,撒播面积约 295m<sup>2</sup>,撒播草籽密度 150kg/hm<sup>2</sup>,撒播草籽总量为 4.43kg。建设单位国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司后期将按照相关规定缴纳城市绿化补偿费用,涉及赔偿路段在施工结束后均统一交由市政部门进行综合绿化。

##### ③ 临时措施

泥浆沉淀池:为减少钻孔灌注桩施工过程中产生的水土流失,在塔基基础外侧设置泥浆沉淀池,对钻渣泥浆进行沉淀和固化处理,禁止将钻渣泥浆排入周围农田和河流中。主体设计中已考虑在施工期间于灌注桩基础旁设置泥浆沉淀池,共设置 5 座。

防尘网苫盖:本方案补充在施工期间对施工区域临时堆土以及裸露地表进行

苫盖，苫盖面积约 1050m<sup>2</sup>。

土质排水沟：本方案补充在施工期间于塔基施工区域四周设置临时土质排水沟，共计开挖排水沟 310m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 24.8m<sup>3</sup>。

土质沉沙池：本方案补充在塔基排水沟末端设置沉沙池，共计 5 座，沉沙池放坡 1:1 开挖，池口尺寸长×宽为 3m×2.5m，深 1m，容积 3m<sup>3</sup>，开挖土方 15m<sup>3</sup>。

## (2) 牵张场及跨越场区

### ①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对牵张场及跨越场区全区进行土地整治，整治面积约 3000m<sup>2</sup>，主要包括场地清理、平整，整治后的土地有 2480m<sup>2</sup>达到复垦条件后交由土地权所有人进行复耕，剩余 520m<sup>2</sup>进行植被恢复。

### ②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期土地整治之后对牵张场及跨越场占用绿化带和空闲区域进行撒播草籽，撒播面积 520m<sup>2</sup>，撒播草籽密度 150kg/hm<sup>2</sup>，撒播总量约 7.80kg。建设单位国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司后期将按照相关规定缴纳城市绿化补偿费用，涉及赔偿路段在施工结束后均统一交由市政部门进行综合绿化。

### ③临时措施

铺设钢板：本工程主体设计中已考虑在施工期间对牵张场及跨越场区内机械占压区域铺设一定数量的钢板，施工结束后土地整治即可恢复原地貌，铺设面积约 1000m<sup>2</sup>。

彩条布铺垫：本方案补充在施工期间对牵张场及跨越场区域裸露地表进行彩条布铺垫，铺垫面积约 800m<sup>2</sup>。

## (3) 施工道路区

### ①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对施工道路区全区进行土地整治，土地整治面积约 630m<sup>2</sup>，主要包括场地清理、平整，整治后的土地约达到复垦条件后均交由土地权所有人进行复耕。

### ②临时措施

铺设钢板：本工程主体设计中已考虑在施工期间对施工道路区内松软路面区

域铺设一定数量的钢板，施工结束后土地整治即可恢复地表植被，铺设面积约600m<sup>2</sup>。

### 2.2.3 水土保持措施工程量汇总

本工程水土保持措施工程量详见表 2.2-2。

表 2.2-2 本工程水土保持措施工程量汇总表

| 防治分区         | 措施类型     |          | 内容类别          |     | 单位             | 数量    | 布设位置                              | 结构形式/<br>植被类型                        | 实施<br>时间            |     |
|--------------|----------|----------|---------------|-----|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|
| 塔基区          | 工程措施     | 主体<br>已有 | 表土剥离          |     | m <sup>3</sup> | 223   | 永久占地和<br>泥浆沉淀池<br>等开挖区域           | 剥离厚度 0.3m,<br>剥离面积 744m <sup>2</sup> | 2025.11-<br>2026.01 |     |
|              |          |          | 土地整治          |     | m <sup>2</sup> | 1581  | 除硬化外裸<br>露地表                      | 场地清理、平整、<br>覆土                       | 2026.03             |     |
|              | 植物措施     | 主体<br>已有 | 撒播草籽          |     | m <sup>2</sup> | 295   | 占用空闲地<br>和绿化带区<br>域               | 狗牙根草籽，密度<br>0.015kg/m <sup>2</sup>   | 2026.03             |     |
|              | 临时措施     | 主体<br>已有 | 泥浆沉淀池         |     | 座              | 5     | 灌注桩基础<br>旁                        | 半挖半填                                 | 2025.11-<br>2026.01 |     |
|              |          |          | 方案<br>新增      |     | 防尘网苫盖          |       | m <sup>2</sup>                    | 1050                                 | 临时堆土及<br>裸露地表       | 6 针 |
|              |          | 方案<br>新增 | 土质<br>排水<br>沟 | 长度  | m              | 310   | 塔基施工区<br>域四周                      | 上顶宽 0.6m，下<br>底宽 0.2m，深<br>0.2m      | 2025.11-<br>2026.01 |     |
|              |          |          |               | 土方量 | m <sup>3</sup> | 24.8  |                                   |                                      |                     |     |
|              | 方案<br>新增 | 土质沉沙池    |               | 座   | 5              | 排水沟末端 | 顶长×顶宽×深为<br>3m×2.5m×1m，坡<br>比 1:1 | 2025.11-<br>2026.01                  |                     |     |
| 牵张场及<br>跨越场区 | 工程措施     | 方案<br>新增 | 土地整治          |     | m <sup>2</sup> | 3000  | 全区                                | 场地清理、平整                              | 2026.03             |     |
|              | 植物措施     | 方案<br>新增 | 撒播草籽          |     | m <sup>2</sup> | 520   | 占用空闲地<br>和绿化带区<br>域               | 狗牙根草籽，密度<br>0.015kg/m <sup>2</sup>   | 2026.03             |     |
|              | 临时措施     | 主体<br>已有 | 铺设钢板          |     | m <sup>2</sup> | 1000  | 机械占压区<br>域                        | 6mm 厚钢板                              | 2025.12-<br>2026.03 |     |
|              |          | 方案<br>新增 | 彩条布铺垫         |     | m <sup>2</sup> | 800   | 裸露地表                              | 三色防水布                                | 2025.12-<br>2026.03 |     |
| 施工道路<br>区    | 工程措施     | 方案<br>新增 | 土地整治          |     | m <sup>2</sup> | 630   | 全区                                | 场地清理、平整                              | 2026.03             |     |
|              | 临时措施     | 主体<br>已有 | 铺设钢板          |     | m <sup>2</sup> | 600   | 松软路面区<br>域                        | 6mm 厚钢板                              | 2025.11-<br>2026.02 |     |

### 2.2.4 防治措施进度安排

参照主体工程施工进度，各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施，相互协调，有序进行。坚持“因地制宜，因害设防”的原则，首先安排水土流失严重区域的防治措施，在措施安排上，工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑，施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排，植物措施可略为滞后，但须根据植物的生物学特性，合理安排季节实施，并在总工期内完成所有水土保持措施。

表2.2-3 主体工程与水土保持工程实施进度表

| 防治分区     | 工程名称 |       | 施工期   |       |       |       |       |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |      |       | 2025年 |       | 2026年 |       |       |
|          |      |       | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |
| 塔基区      | 主体工程 |       | ————— |       |       |       |       |
|          | 工程措施 | 表土剥离  | ----- |       |       |       |       |
|          |      | 土地整治  |       |       |       |       | ----- |
|          | 植物措施 | 撒播草籽  |       |       |       |       | ----- |
|          | 临时措施 | 泥浆沉淀池 | ----- | ----- | ---   |       |       |
|          |      | 防尘网苫盖 | ----- | ----- | ----- |       |       |
|          |      | 土质排水沟 | ----- | ----- | ---   |       |       |
| 土质沉沙池    |      | ----- | ----- | ----- |       |       |       |
| 牵张场及跨越场区 | 工程措施 | 土地整治  |       |       |       |       | ----- |
|          | 植物措施 | 撒播草籽  |       |       |       |       | ----- |
|          | 临时措施 | 铺设钢板  |       | ----- | ----- | ----- | ----- |
|          |      | 彩条布铺垫 |       | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 施工道路区    | 工程措施 | 土地整治  |       |       |       |       | ----- |
|          | 临时措施 | 铺设钢板  | ----- | ----- | ----- | ----- |       |

注：“—————”为主体工程进度；“-----”为水土保持措施进度。

### 3 水土保持投资估算及效益分析

#### 3.1 投资估算成果

本项目水土保持总投资为19.99万元，其中工程措施费用0.86万元；植物措施费用0.12万元；临时措施费用8.89万元，独立费用8.54万元（其中建设管理费4.29万元、工程建设监理费0.25万元、科研勘测设计费4.00万元），基本预备费0.92万元，水土保持补偿费为6561.6元，计为0.65616万元。

表 3.1-1 本工程水土保持投资估算总表 单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称        | 主体已有         | 方案新增        | 合计           |
|----|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | 第一部分工程措施       | 0.69         | 0.17        | 0.86         |
| 2  | 第二部分植物措施       | 0.04         | 0.08        | 0.12         |
| 3  | 第三部分临时措施       | 7.64         | 1.25        | 8.89         |
| 4  | 第四部分独立费用       | 4.49         | 4.05        | 8.54         |
|    | 一至四部分合计        | 12.86        | 5.55        | 18.41        |
| 5  | 基本预备费 5%       | 0.64         | 0.28        | 0.92         |
| 6  | 水土保持补偿费        | 0.65616      | 0           | 0.65616      |
| 7  | <b>水土保持总投资</b> | <b>14.16</b> | <b>5.83</b> | <b>19.99</b> |

表 3.1-2 水土保持工程措施投资估算表 单位：万元

| 编号        | 工程或费用名称  | 单位             | 数量       | 单价（元）    | 合计（万元）      |
|-----------|----------|----------------|----------|----------|-------------|
| 一         | 塔基区      | /              | /        | /        | 0.69        |
| (一)       | 表土保护工程   |                |          |          | 0.62        |
| 1         | 表土剥离*    | m <sup>2</sup> | 744      | 0.75     | 0.06        |
| 2         | 表土回覆*    | m <sup>3</sup> | 223      | 25.32    | 0.56        |
| (二)       | 土地整治工程   |                |          |          | 0.07        |
| 1         | 土地整治*    |                |          |          | 0.07        |
|           | 全面整地     | m <sup>2</sup> | 1581     | 0.45     | 0.07        |
| 二         | 牵张场及跨越场区 | /              | /        | /        | 0.14        |
| (一)       | 土地整治工程   |                |          |          | 0.14        |
| 1         | 土地整治     |                |          |          | 0.14        |
|           | 全面整地     | m <sup>2</sup> | 3000     | 0.45     | 0.14        |
| 三         | 施工道路区    | /              | /        | /        | 0.03        |
| (二)       | 土地整治工程   |                |          |          | 0.03        |
| 1         | 土地整治     |                |          |          | 0.03        |
|           | 全面整地     | m <sup>2</sup> | 630      | 0.45     | 0.03        |
| <b>合计</b> | <b>/</b> | <b>/</b>       | <b>/</b> | <b>/</b> | <b>0.86</b> |

注：带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-3 水土保持植物措施投资估算表 单位: 万元

| 编号        | 工程或费用名称   | 单位             | 数量       | 单价(元)    | 合计(万元)      |
|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------|
| 一         | 塔基区       | /              | /        | /        | 0.04        |
| (一)       | 植被恢复与建设工程 |                |          |          | 0.04        |
| 1         | 撒播草籽*     |                |          |          | 0.04        |
|           | 直播种草/不覆土  | m <sup>2</sup> | 295      | 1.45     | 0.04        |
| 二         | 牵张场及跨越场区  | /              | /        | /        | 0.08        |
| (一)       | 植被恢复与建设工程 |                |          |          | 0.08        |
| 1         | 撒播草籽      |                |          |          | 0.08        |
|           | 直播种草/不覆土  | m <sup>2</sup> | 520      | 1.45     | 0.08        |
| <b>合计</b> | <b>/</b>  | <b>/</b>       | <b>/</b> | <b>/</b> | <b>0.12</b> |

注: 带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-4 水土保持临时措施投资估算表 单位: 万元

| 编号  | 工程或费用名称  | 单位             | 数量         | 单价(元)        | 合计(万元)      |
|-----|----------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 一   | 临时防护工程   |                |            |              | <b>8.63</b> |
| (一) | 塔基区      | /              | /          | /            | 1.68        |
| 1   | 泥浆沉淀池*   | 座              | 5          | 1960         | 0.98        |
| 2   | 土质排水沟    | m <sup>3</sup> | 24.8       | 25.5517      | 0.06        |
| 3   | 土质沉沙池    | m <sup>3</sup> | 15         | 23.754       | 0.04        |
| 4   | 临时覆盖     |                |            |              | 0.60        |
|     | 防尘网苫盖    | m <sup>2</sup> | 1050       | 5.716        | 0.60        |
| (二) | 牵张场及跨越场区 | /              | /          | /            | 4.55        |
| 1   | 铺设钢板*    | m <sup>2</sup> | 1000       | 40           | 4.00        |
| 2   | 彩条布铺垫    | m <sup>2</sup> | 800        | 6.8274       | 0.55        |
| (三) | 施工道路区    | /              | /          | /            | 2.40        |
| 1   | 铺设钢板*    | m <sup>2</sup> | 600        | 40           | 2.40        |
| 二   | 其他临时工程   | %              | <b>2</b>   | <b>9800</b>  | <b>0.02</b> |
| 三   | 施工安全生产专项 | %              | <b>2.5</b> | <b>96100</b> | <b>0.24</b> |
| 合计  | /        | /              | /          | /            | <b>8.89</b> |

注: 带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-5 本工程水土保持其他费用估算详表

| 独立费用 |           |                |        |
|------|-----------|----------------|--------|
| 序号   | 费用名称      | 计算依据           | 合计(万元) |
| 一    | 建设管理费     | /              | 4.29   |
| 1    | 项目经常费     | (第一~第三部分)×2.5% | 0.25   |
| 2    | 水保专项验收    | /              | 4.00   |
| 3    | 技术咨询费     | (第一~第三部分)×0.4% | 0.04   |
| 二    | 工程建设监理费   | /              | 0.25   |
| 三    | 科研勘测设计费   | /              | 4.00   |
| 1    | 工程科学研究试验费 | /              | /      |

|                          |           |                        |             |
|--------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| 2                        | 工程勘测设计费   | /                      | 4.00        |
|                          | 水土保持方案编制费 | /                      | 4.00        |
| <b>合计</b>                |           |                        | <b>8.54</b> |
| 水土保持补偿费                  |           |                        |             |
| 防治责任范围 (m <sup>2</sup> ) |           | 单价 (元/m <sup>2</sup> ) | 水土保持补偿费 (元) |
| 5468                     |           | 1.2                    | 6561.6      |

### 3.2 效益分析

#### 3.2.1 水土流失治理度

至设计水平年，项目建设可能造成水土流失总面积 5468m<sup>2</sup>，水土流失治理达标面积 5455m<sup>2</sup>，水土流失治理度可达到 99.8%。具体计算见表 3.2-1。

表 3.2-1 水土流失治理度计算表

| 分区         | 防治责任范围面积 (m <sup>2</sup> ) | 水土流失面积 (m <sup>2</sup> ) | 水土流失治理达标面积 (m <sup>2</sup> ) |             |            |             | 水土流失治理度 (%) | 防治标准 (%)  | 是否达标      |
|------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|            |                            |                          | 建筑物及场地道路硬化面积                 | 工程措施        | 植物措施       | 合计          |             |           |           |
| 塔基区        | 1838                       | 1838                     | 257                          | 1286        | 293        | 1836        | <b>99.8</b> | <b>98</b> | <b>达标</b> |
| 牵张场及跨越场区   | 3000                       | 3000                     | 0                            | 2480        | 509        | 2989        |             |           |           |
| 施工道路区      | 630                        | 630                      | 0                            | 630         | 0          | 630         |             |           |           |
| <b>综合值</b> | <b>5468</b>                | <b>5468</b>              | <b>257</b>                   | <b>4396</b> | <b>802</b> | <b>5455</b> |             |           |           |

注：水土流失治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再重复计列。

#### 3.2.2 土壤流失控制比

通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内的治理后每平方公里年均土壤流失量将小于水土流失防治责任范围内容许土壤流失量，项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量为 500t/(km<sup>2</sup>·a)，至设计水平年，各项水保措施发挥作用后，治理后每平方公里年平均土壤流失量可达到 160t/(km<sup>2</sup>·a)，控制比可达到 3.1。

#### 3.2.3 渣土防护率

本项目永久弃渣和临时堆土量约 1265m<sup>3</sup>，实际挡护的永久弃渣及临时堆土量约 1259m<sup>3</sup>，渣土防护率可达到 99.5%。

#### 3.2.4 表土保护率

本项目可剥离表土总量为 1365m<sup>3</sup>，在采取保护措施后保护表土数量为 1258m<sup>3</sup>，其中剥离保护的表土 223m<sup>3</sup>，通过苫盖的表土量为 1035m<sup>3</sup>，表土保护

率可达到 92.2%。

### 3.2.5 林草植被恢复率

本工程可恢复林草植被面积 815m<sup>2</sup>，林草类植被面积 802m<sup>2</sup>，林草植被恢复率可达到 98.4%。

表 3.2-2 林草植被恢复率计算表

| 防治分区       | 可恢复林草植被面积 (m <sup>2</sup> ) | 林草类植被面积 (m <sup>2</sup> ) | 林草植被恢复率 (%) | 防治标准 (%) | 是否达标 |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------|------|
| 塔基区        | 295                         | 293                       | 98.4        | 98       | 是    |
| 牵张场及跨越场区   | 520                         | 509                       |             |          |      |
| <b>综合值</b> | <b>815</b>                  | <b>802</b>                |             |          |      |

### 3.2.6 林草覆盖率

本项目建设总占地面积约 5468m<sup>2</sup>，根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018) 4.0.5 节规定恢复耕地面积在计算林草覆盖率时可在防治责任范围中扣除，因此本项目扣除恢复耕地后的建设总占地面积 1072m<sup>2</sup>，方案实施后林草类植被面积为 802m<sup>2</sup>，林草覆盖率可达到 74.8%。

表 3.2-3 林草覆盖率统计表

| 防治分区      | 防治责任范围 (m <sup>2</sup> ) | 恢复耕地面积 (m <sup>2</sup> ) | 扣除恢复耕地后面积 (m <sup>2</sup> ) | 林草类植被面积 (m <sup>2</sup> ) | 林草覆盖率 (%) | 防治标准 (%) | 是否达标 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|----------|------|
| 塔基区       | 1838                     | 1286                     | 552                         | 293                       | 74.8      | 27       | 是    |
| 牵张场及跨越场区  | 3000                     | 2480                     | 520                         | 509                       |           |          |      |
| 施工道路区     | 630                      | 630                      | 0                           | 0                         |           |          |      |
| <b>合计</b> | <b>5468</b>              | <b>4396</b>              | <b>1072</b>                 | <b>802</b>                |           |          |      |

### 3.2.7 六项指标达标情况

通过计算分析，至设计水平年水土流失防治目标的实现情况为：水土流失治理度 99.8%、土壤流失控制比 3.1、渣土防护率 99.5%、表土保护率 92.2%、林草植被恢复率 98.4%、林草覆盖率 74.8%。

表 3.2-4 防治效果汇总表

| 评估指标        | 计算方法                                | 计算依据       | 单位             | 数量   | 计算结果 | 防治目标 | 达标情况 |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|------|------|------|------|
| 水土流失治理度 (%) | 项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比 | 水土流失治理达标面积 | m <sup>2</sup> | 5455 | 99.8 | 98   | 达标   |
|             |                                     | 水土流失总面积    | m <sup>2</sup> | 5468 |      |      |      |

| 评估指标       | 计算方法  | 计算依据               | 单位                     | 数量   | 计算结果 | 防治目标 | 达标情况 |
|------------|---|--------------------|------------------------|------|------|------|------|
| 土壤流失控制比    | 项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比           | 容许土壤流失量            | t/(km <sup>2</sup> ·a) | 500  | 3.1  | 1.0  | 达标   |
|            |   | 治理后每平方公里年平均土壤流失量   | t/(km <sup>2</sup> ·a) | 160  |      |      |      |
| 渣土防护率(%)   | 项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比 | 实际挡护的永久弃渣及临时堆土量    | m <sup>3</sup>         | 1259 | 99.5 | 97   | 达标   |
|            |   | 永久弃渣及临时堆土总量        | m <sup>3</sup>         | 1265 |      |      |      |
| 表土保护率(%)   | 项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比                  | 保护的表土数量            | m <sup>3</sup>         | 1258 | 92.2 | 92   | 达标   |
|            |   | 可剥离表土总量            | m <sup>3</sup>         | 1365 |      |      |      |
| 林草植被恢复率(%) | 项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比                | 林草类植被面积            | m <sup>2</sup>         | 802  | 98.4 | 98   | 达标   |
|            |   | 可恢复林草植被面积          | m <sup>2</sup>         | 815  |      |      |      |
| 林草覆盖率(%)   | 项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比                      | 林草类植被面积            | m <sup>2</sup>         | 802  | 74.8 | 27   | 达标   |
|            |   | 项目建设区面积(扣除恢复耕地后面积) | m <sup>2</sup>         | 1072 |      |      |      |

### 3.3 水土保持管理

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），确保本水土保持方案防治措施按“三同时”的要求顺利实施，充分发挥水土保持措施的作用，使项目建设过程中的水土流失控制在方案目标值以内，促进项目区及周边生态环境的良性发展，特提出以下保证措施。

#### 3.3.1 组织管理

根据国家有关法律法规，本工程水土保持方案为报告表项目，实施承诺制管理。建设单位承诺已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务；所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失，项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备；依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费；积极配合水土保持监督检查；愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。水土保持方案在报批前，生产建设单位应当通过其网站、生产建设项目所在地公共媒体网站或者相关政府网站向社会公开拟报批的水土保持方案全文，且持续公开期限不得少于10个工作日。对于公众提出的问题和意见，生产建设单位应当逐一处理与回应，并在水土保持行政许可承诺书中予以说明。

报告表经江苏省水利厅批复后，建设单位将成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，全力保证水土保持工作按计划进行。水土保持方案实施管理机构主要工作职责如下：①认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益；②建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，制定水土保持方案详细实施计划；③工程施工期间，与设计、施工单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持

设施的正常建设,最大限度减少人为造成的水土流失与生态环境的破坏;④深入工程现场进行检查,掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况;⑤建立、健全各项档案,积累、分析整编资料,为水土保持工程验收提供相关资料。

### 3.3.2 后续设计

本项目可研已批复,水土保持应纳入初步设计和施工图设计中。水土保持方案经批准后,对照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号),生产建设项目地点、规模发生重大变化,水土保持措施发生重大变更的,生产建设单位应当补充水土保持方案变更报告或修改水土保持方案,报原审批机关审批。

### 3.3.3 水土保持监测和监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)和《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号)中相关规定。对报告表项目水土保持监测工作未提出要求,因此,本工程建设单位可依据需要自行开展水土保持监测工作。凡主体工程开展监理工作的生产建设项目,应当按照国家建设监理、水土保持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件、工程施工合同、监理合同等,开展水土保持监理工作,由于本工程征占地面积在50公顷以下且挖填土石方总量在50万立方米以下,因此不对水土保持监理单位的人员配备和资质提出要求。

### 3.3.4 水土保持施工

施工过程中应注重保护表土植被,严格控制和管理车辆机械的运行范围,必要时设立保护地表及植被的警示牌,防止扩大对地表的扰动。对临时排水设施应进行经常性检查维护,保证其排水通畅。对建成的水土保持设施应有明确的管理维护要求。工程措施施工时,应对施工质量实时检查,对不符合设计要求或质量要求的工程,责令其重建,直到满足要求为止。植物措施工程施工时,应注意加强植物措施的后期管护工作,确保各种植物的成活率,发挥植物措施的水土保持效益。

### 3.3.5 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》

的通知（苏水规〔2021〕8号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），生产建设项目的水土保持设施验收，由生产建设单位自主开展。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。存在下列情形之一的，水土保持设施验收结论应当为不合格：①未依法依规履行水土保持方案及重大变更编报审批程序的；②弃土弃渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；③水土保持措施体系、等级和标准或者水土流失防治指标未按照水土保持方案批复要求落实的；④存在水土流失风险隐患的；⑤水土保持设施验收材料明显不实、内容存在重大缺项、遗漏的；⑥水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的；⑦未依法依规缴纳水土保持补偿费的；⑧存在法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形的。

本项目为编制水土保持方案报告表项目，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织验收工作，形成验收鉴定书，明确验收结论。验收合格意见应当经三分之二以上验收组成员同意并签字。实行承诺制或者备案制管理的项目，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收鉴定书，公示时间不得少于20个工作日。生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，在水土保持设施验收通过3个月内向省水利厅报备验收材料。依法编制水土保持报告表和实行承诺制管理的生产建设项目，水土保持设施验收报备时只需提交水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书和向社会公开的时间、地点及方式等材料。

生产建设项目水土保持设施验收合格后，生产建设单位或者运行管理单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

附

件

附件  
1  
委托书

**江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目  
110 千伏送出工程  
水土保持方案报告（表）编制任务委托书**

江苏通凯生态科技有限公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》及《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）等的要求，我单位江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程须编报水土保持方案报告。

现委托贵公司编制江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告，请严格按照有关法律法规及标准规范的要求，结合工程建设实际情况，编制报告表。

国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

2025 年 6 月



附件  
2

核准  
批复

附件  
3

可研批复

附件  
4

规划  
文件

附件 5

占地情况说明函

# 江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程 占地情况说明函

江苏省水利厅：

我单位即将建设的“江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程”计划于 2025 年 11 月开工建设，建设地点位于无锡市宜兴市官林镇、高塍镇。工程总投资 1018 万元，其中土建投资约 205 万元。项目区总占地面积 5468m<sup>2</sup>，永久占地确定为 410m<sup>2</sup>，均为塔基区永久占地，其中新建一般角钢塔永久占地按（根开/1000+基础立柱宽+2m）<sup>2</sup>/基计列，新建电缆终端角钢塔永久占地按（根开/1000+基础立柱宽+5m）<sup>2</sup>/基计列，新建终端钢管杆永久占地按（立柱直径/1000+5m）<sup>2</sup>/基计列。为配合工程建设需要，需 5058m<sup>2</sup>作为临时占地，包括塔基区 1428m<sup>2</sup>，牵张场及跨越场区 3000m<sup>2</sup>，施工道路区 630m<sup>2</sup>。项目开工前我单位将按照要求向省厅报备临时占地等相关手续，施工结束后恢复原地貌。

特此说明，望省厅对我单位申报的水土保持方案予以审批，在此感谢。

国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

2025 年 7 月



附件  
6

洪评承诺函

## 洪评承诺函

江苏省水利厅：

江苏无锡路通凌霞宜兴官林 52.8 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程位于无锡市宜兴市官林镇、高塍镇，我公司（国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司）作为工程建设单位，承诺在项目设计阶段按照规划部门批复的路径，详细勘察工程沿线所跨河道，严格按照《江苏省河道管理范围内建设项目监督管理实施办法（试行）》和《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T 808-2021）和《河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程》（DB32/T 4462-2023）的标准和要求，对该工程建设项目进行防洪评价，编制防洪评价报告，防洪评价报告应符合河道管理部门审批的要求，满足工程建设项目的的工作内容和深度要求。在涉及防洪段线路开工前取得防洪评价报告的批复，若因防洪评价而导致设计产生重大变更，我公司会及时根据设计文件进行水保方案的变更，并根据相关法律法规要求履行审批手续。

国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

2025年7月



附

图
