

江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程

水土保持监测季度报告

(2024 年第 3 季度，总第 20 期)

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司

编制单位：南京和谐生态工程技术有限公司

2024年10月

目 录

1.工程概况	1
1.1 项目概况.....	1
2.主体工程进展及监测分区	2
2.1 主体工程进展.....	2
2.3 监测分区.....	4
3.监测内容和方法	5
3.1 扰动土地面积监测.....	5
3.2. 气象监测.....	7
3.3. 水土保持措施调查.....	7
3.4. 土壤流失危害监测.....	8
3.5. 监测点布设.....	8
3.6 监测阶段成果.....	8
4.土壤流失量	9
4.1 变电站工程.....	9
4.2 输电线路.....	9
5.水土保持监测三色评价指标	10
6.本期监测问题及建议	11
6.1 存在问题.....	11

6.2 监测建议	11
7.监测大事记	12
8.附件	13

1.工程概况

受国网江苏省电力有限公司建设分公司的委托，我单位承担江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程的水土保持监测工作。

1.1 项目概况

(1) 地理位置

点式工程位于江苏省镇江市丹徒区谷阳镇前七里山村东侧 300m 处，变电站南侧毗邻新建的 312 国道，东侧毗邻镇荣公路（S265 省道）。

线路经过镇江市的丹徒区、润州区、句容市（县级）。

(2) 主要建设内容

上党 500kV 变电站间隔扩建工程：本期扩建 500kV 出线间隔 2 个，至句容电厂。4 号主变 35kV 侧装设 2 组 60Mvar 并联电抗器。

句容抽水蓄能电站——上党双回 500kV 线路工程：新建线路路径长度 21.027km，其中双回路段为 20.614km，单回路段为 0.413km，导线为 4 × JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线。新建铁塔 53 基，其中双回路转角塔 29 基，双回路直线塔 22 基，单回路终端塔 2 基。

(3) 参建单位

建设单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司；

监理单位：吉林省吉能电力建设监理有限公司；

施工单位：江苏省送变电有限公司。

2.主体工程进展及监测分区

2.1 主体工程进度

计划工期：工程计划 2019 年 7 月开工，完工时间为 2021 年 1 月。

实际工期：本工程已于 2019 年 9 月开工，计划 2024 年 5 月完工。

施工进度见表 2-1。

表 2-1 工程进展横道图

项目		2019 年		2020 年				2021 年				2022 年		2023 年		2024 年	
1.变电站工程		7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~6	7~12	1~6	7~12	1~6	7~12
施工准备阶段	计划工期		...														
	实际工期		—														
基础工程阶段	计划工期															
	实际工期		—	—	—	—											
主体工程阶段	计划工期												
	实际工期					—	—	—									
植被恢复阶段	计划工期							...									
	实际工期						—										
2.输电线路																	
施工准备阶段	计划工期															
	实际工期	—															
基础施工阶段	计划工期												
	实际工期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
立塔架线施工阶段	计划工期														
	实际工期							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
植被恢复阶段	计划工期															
	实际工期															—	

2.2 水土保持监测工作开展情况

本季度于 2024 年 7 月开始监测，于 2024 年 9 月底，监测项目组完成句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程本季度监测工作，本季度共进场 3 次，进场监测过程中采用调查监测与遥感监测相结合的监测方法，调查了项目区植被恢复情况，并测算出得出本季度的水土流失量。

2.3 监测分区

按照监测实施方案要求，本季度监测各个区域植被恢复情况。

3.监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

工程已完工，本季度为试运行期，截止目前工程扰动面积共计 7.19hm²，各分区面积详见下表。

表 3-1 各分区扰动面积汇总表

分区		设计	新增	累计
变电站工程	变电站区	0.60	0	0.60
输电线路	塔基区	3.92	0	4.02
	人抬道路区	0.22	0	0.98
	牵张场区	1.00	0	1.59
合计		5.74	0	7.19

3.1.1 变电站工程

变电站扩建区域已完工投运，不再进行监测。

3.1.2 输电线路


截至本季度线路工程总扰动面积为 6.59hm²，分别为塔基区、人抬道路区和牵张场区的扰动。

表 3-2 输电线路各分区扰动面积汇总表

分区	新增扰动面积	累计扰动面积	备注
塔基区	0	4.02	/
人抬道路区	0	0.98	/
牵张场区	0	1.59	/
合计	0	6.59	/

(1) 塔基区

工程已完工，本季度为试运行期，因此，选择 1 处已完成的塔基作为监测对象，经现场监测，该区域植被恢复良好。

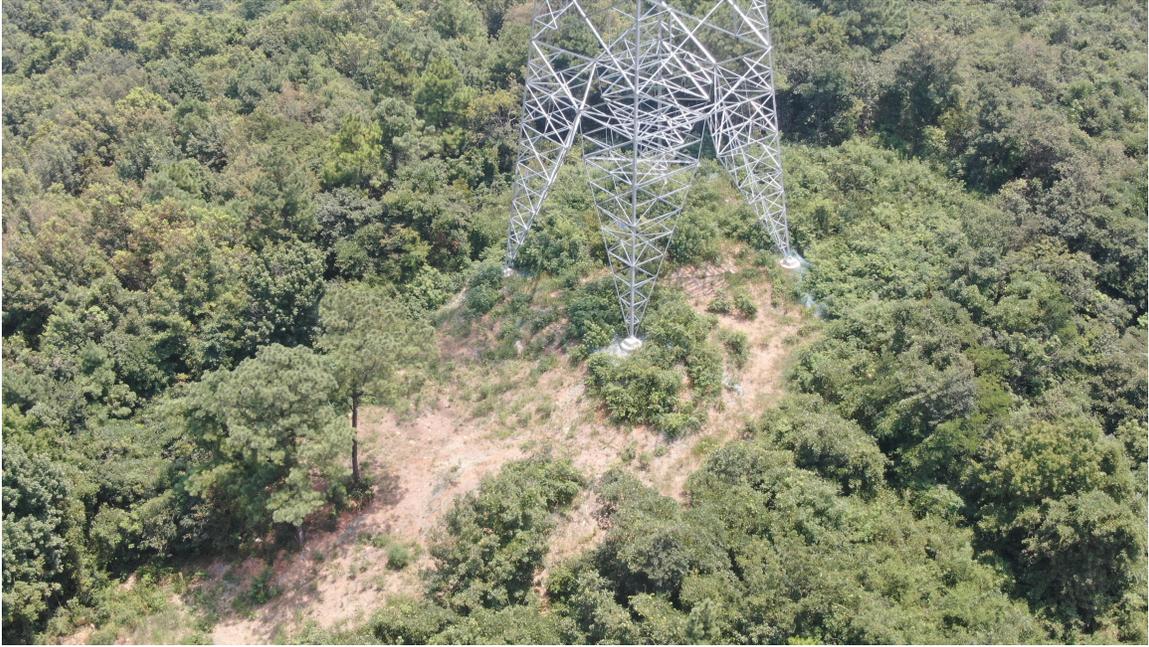

G40

(2) 人抬道路区


工程已完工，本季度为试运行期，因此，选择1处施工道路作为监测对象，经现场监测，该区域植被恢复良好。



G40

(3) 牵张场区

工程已完工，本季度为试运行期，因此，选择 1 处牵张场作为监测对象，经现场监测，该区域植被恢复良好。

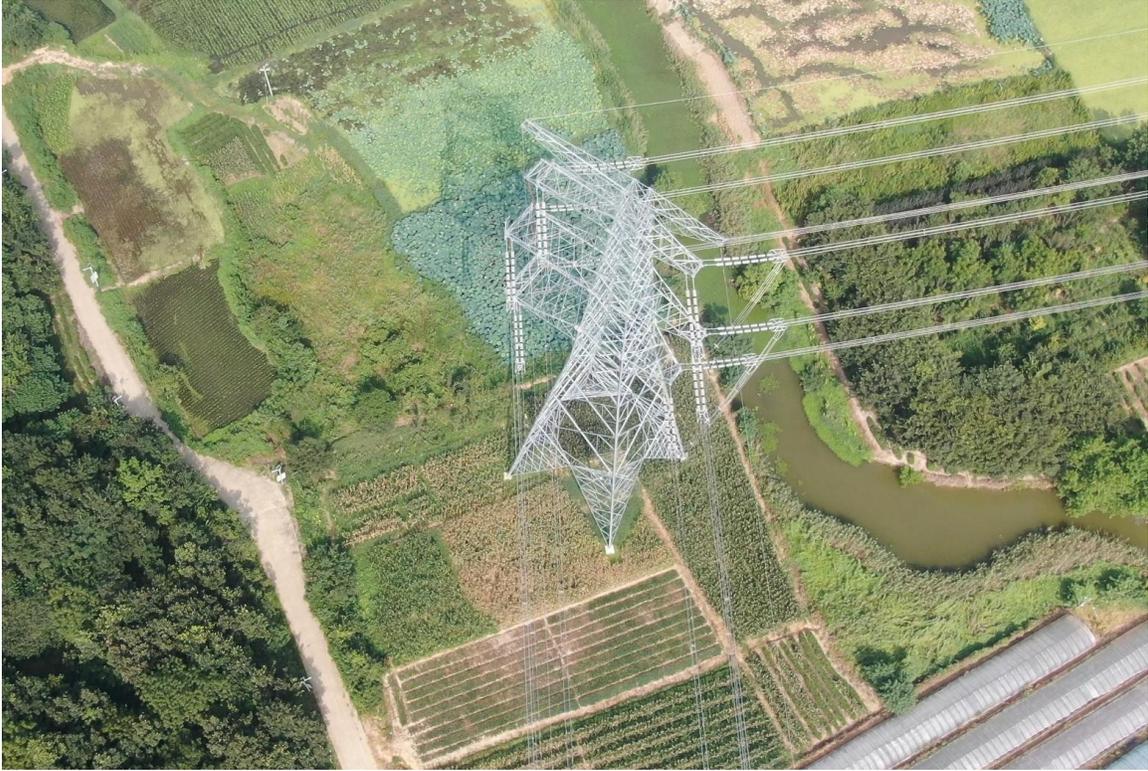

G24

3.2. 气象监测

采用测风仪测量现场风速，降雨量主要通过“水文局网站”关站点收集每一天的降雨量。天气情况来自中国气象局发布的天气数据。详见附件 1。

3.3. 水土保持措施调查

本季度采用巡查监测，调查各区域的植被恢复情况。



撒播草籽



撒播草籽

图 3-1 项目区措施布设成果图

3.4. 土壤流失危害监测

本季度降雨为 601mm，经调查本工程无土壤流失危害。

3.5. 监测点布设

工程已全部完工，无需再布设监测点，本季度采用巡查监测。

3.6 监测阶段成果

本季度水土保持监测工作于 2024 年 9 月底结束，在 3 个月的监测过程中，监测人员进场监测 3 次，现场监测记录资料以及现场影像资料若干。经过资料整理和分析后，监测人员在 2024 年 10 月，编制完成《江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程水土保持监测季度报告》。

4.土壤流失量

4.1 变电站工程

本季度变电站工程未产生土壤流失量。

4.2 输电线路

截止到本季度末,输电线路总扰动土地面积达到 6.59hm²,本季度处于雨季时段,降雨量较大,由于工程已完工,不在产生扰动,且植被恢复较好,因此,水土流失量较少。

综上所述,根据现场调查,测算出本季度输电线路工程共产生土壤流失量 4.33t。

土壤流失情况详见表 4-1。

表 4-1 输电线路土壤流失量统计表

防治分区	土壤流失面积 (hm ²)	监测点个数	周期(a)	土壤流失量 (t)
塔基区	4.02	1	0.25	2.65
人抬道路区	0.98	1	0.25	0.64
牵张场区	1.59	1	0.25	1.04
合计	6.59	/	/	4.33

5.水土保持监测三色评价指标

本工程在 2024 年第 3 季度，输电线路水土保持监测三色评价指标值 100 分，三色评价结论为绿色，详见附表。

6.本期监测问题及建议

6.1 存在问题

(1) 变电站工程

本季度不存在问题。

(2) 输电线路

本季度不存在问题。

6.2 监测建议

(1) 变电站工程

无。

(2) 输电线路

无。

7.监测大事记

(1) 2024年7月,水土保持监测部踏勘工程现场,调查植被恢复情况,测算水土流失量。

(2) 2024年8月,水土保持监测部踏勘工程现场,调查植被恢复情况,测算水土流失量。

(3) 2024年9月,水土保持监测部踏勘工程现场,调查植被恢复情况,测算水土流失量。

8.附件

附表 1.气象资料

附表 2.水土保持监测季度报告表


附表 3.生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

附表 1 气象资料

	7月	8月	9月
1	9	0	0
2	0	0	0
3	1.5	0	0
4	0	0	0
5	0	15	0
6	0	0	0
7	0	15	0
8	0	0	0
9	84.5	0	0
10	58	0	19
11	32	0	55
12	0	0	0
13	11	1	5.5
14	0	0	7.5
15	0	0	0
16	0	0	90
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	140	6
20	0	20	0.5
21	0	7	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0	0
25	0	0	0
26	5.5	0	1.5
27	0.5	0	0
28	0	14	0
29	0	0	0
30	0	0	2
31	0	0	
月降雨量 (mm)	202	212	187
降雨日数	8	7	9
最大日降雨量 (mm)	84.5	140	90
最大降雨日	9	19	16

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2024年7月01日至2024年9月30日

项目名称		江苏句容抽水蓄能电站500千伏送出工程					
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)			
填表人及电话	张洋/13770716815	 2024年10月14日		 2024年10月15日			
主体工程进度				工程已全部完工			
指标				设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 hm ²	合计			5.74	0	7.19	
	变电站区			0.60	0	0.60	
	塔基区			3.92	0	4.02	
	人抬道路区			0.22	0	0.98	
	牵张场区			1.00	0	1.59	
水土保持措施 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计
	变电站区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.14	0	0.14
			土地整治	hm ²	0.50	0	0.50
		植物措施	铺植草皮	hm ²	0.50	0	0.5
		临时措施	密目网苫盖	m ²	6000	0	5000
			临时排水沟	m	130	0	120
			沉沙池	座	1	0	1
			编织袋围挡	m ³	24	0	0
	塔基区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.72	0	0.82
			土地整治	hm ²	3.76	0	3.81
			浆砌石排水沟	m	0	0	361
			挡土墙	m ³	0	0	72
		植物措施	撒播草籽	hm ²	2.09	0	2.24
		临时措施	泥浆沉淀池	个	28	0	15
			密目网苫盖	m ²	24300	0	25100
			临时排水沟	m	5300	0	2352
			沉砂池	座	53	0	25
		人抬道路区	工程措施	土地整治	hm ²	0.22	0
	植物措施			撒播草籽	hm ²	0	0
	临时措施		铺设钢板	hm ²	0	0	0.22
			临时排水沟	m	0	0	2650
	牵张场区	工程措施	土地整治	hm ²	1.00	0	1.59
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0	0	0.31
临时措施		铺设钢板	hm ²	0	0	0.28	

		彩条布铺垫	m ²	0	0	1500
水土流失影响因子	降雨量 (mm)			601		
	最大 24 小时降雨(mm)			140		
	最大风速 (m/s)			13.9		
土壤流失量 (t)				4.33		
水土流失危害事件				无		
监测工作开展情况			正常进行日常现场勘查、测量和评价工作，并对本季度发现的问题进行跟踪监测和上报。			
存在问题与建议			无			
水土保持“三色”评价			根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。			

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程		
监测时段和防治责任范围		2024 年第 3 季度, 7.19 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度扰动面积未扩大
	表土剥离保护	5	5	剥离的表土已回覆
	弃土 (石、渣) 堆放	15	15	不设置弃土场
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失总量不足 100 立方米
水土流失防治成效	工程措施	20	20	工程措施运行良好
	植物措施	15	15	植物措施运行良好
	临时措施	10	10	临时措施已拆除
水土流失危害		5	5	本季度无水土流失危害事件发生
合计		100	100	
