

2026-HZZH
0002



常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程

# 水土保持监测总结报告

建设单位：国网江苏省电力有限公司常州供电分公司

监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司

2026年3月

2026-HZZH

0002



常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程

# 水土保持监测总结报告

建设单位：国网江苏省电力有限公司常州供电公司

监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司

2026年3月





# 营业执照

统一社会信用代码  
91320100MA1MF6W35M

编号 320100002022107130100

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



仅限用于  
常州瓦屋牵引变改接永和220千伏线路工程水土保持监测总结报告

名称 江苏核众环境监测技术有限公司  
 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
 法定代表人 丛俊  
 经营范围 许可项目：辐射监测；放射性污染监测；水利工程建设项目；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）  
 一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；环境应急治理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等许可类培训活动）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；科普宣传服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 1000万元整  
 成立日期 2016年02月04日  
 营业期限 2016年02月04日至永续经营  
 住所 南京市建邺区庐山路168号新地中心二期10层1007室





登记机关  
2021年07月13日


# 常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程 水土保持监测总结报告


## 责任页


(江苏核众环境监测技术有限公司)


批准：丛俊（高级工程师）


核定：樊虹呈（工程师）

审查：许彩云（工程师）

校核：王立（工程师）

项目负责人：蒋莉（工程师）

编写：邵国宇（工程师）（参编章节：第 1~3 章、附图）

黄春清（工程师）（参编章节：第 4~7 章、附表、附件）

## 目录

前言 .....	1
<b>1 建设项目及水土保持工作概况 .....</b>	<b>5</b>
1.1 建设项目概况 .....	5
1.2 水土流失防治工作情况 .....	8
1.3 监测工作实施情况 .....	15
<b>2 监测内容与方法 .....</b>	<b>20</b>
2.1 扰动土地情况 .....	20
2.2 取土（石、料）、弃土（石、渣）情况 .....	20
2.3 水土保持措施情况 .....	20
2.4 水土流失监测 .....	21
<b>3 重点部位水土流失动态监测 .....</b>	<b>23</b>
3.1 防治责任范围监测 .....	23
3.2 土石方流向情况监测 .....	25
3.3 取土（石、料）监测 .....	30
3.4 弃土（石、料）监测 .....	30
<b>4 水土流失防治措施监测结果 .....</b>	<b>31</b>
4.1 工程措施监测结果 .....	31
4.2 植物措施监测结果 .....	33
4.3 临时措施监测结果 .....	36
4.4 水土保持措施防治效果 .....	39
<b>5 土壤流失情况监测 .....</b>	<b>40</b>
5.1 监测时段划分 .....	40
5.2 水土流失面积 .....	40
5.3 土壤流失量 .....	41
5.4 取土、弃土弃渣潜在土壤流失量 .....	42
5.5 水土流失危害 .....	42
<b>6 水土流失防治效果监测 .....</b>	<b>43</b>

6.1 水土流失治理度 .....	43
6.2 土壤流失控制比 .....	43
6.3 渣土防护率 .....	43
6.4 表土保护率 .....	44
6.5 林草植被恢复率 .....	44
6.6 林草覆盖率 .....	44
<b>7 结论 .....</b>	<b>46</b>
7.1 水土流失动态变化 .....	46
7.2 水土保持措施评价 .....	46
7.3 存在问题及建议 .....	46
7.4 综合结论 .....	47

**附件:**

- 附件 1 水土保持监测委托函
- 附件 2 水土保持方案批复
- 附件 3 水土保持监测实施方案
- 附件 4 水土保持监测意见书
- 附件 5 水土保持监测季度报告
- 附件 6 水土保持监测影像资料
- 附件 7 项目建设前、后遥感影像图

**附图:**

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 间隔扩建区平面布置图
- 附图 3 间隔改造区平面布置图
- 附图 4 线路路径图
- 附图 5 水土保持监测分区及监测点位图

## 前言

常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程位于江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道境内，本项目由国网江苏省电力有限公司常州供电分公司投资建设。本工程分为点型工程和线型工程，共扩建出线间隔 2 个，改造出线间隔 1 个，新建 220kV 架空线路 2.759km，新建角钢塔 11 基。具体包括：（1）永和 220 千伏变电站扩建工程：本期改造两组户外 220kV GIS 基础及埋件，扩建相应设备支架及基础；扩建场地通信余缆箱及埋管。基础采用钢筋混凝土独立基础，设备支架与基础采用杯口连接。配电装置同前期，采用户外 GIS 设备。本期扩建工程不征地，利用前期工程预留场地扩建。（2）淦西 220 千伏变电站改造工程：本期更名 1 回（原瓦屋牵引站改为永和），无一次设备改造内容，仅对间隔保护进行改造；本期扩建部分通信余缆箱及埋管。（3）淦西~瓦屋牵单线 $\pi$ 入永和变 220 千伏线路工程：本期新建瓦屋牵-永和 220kV 架空线路 2.759km（双回架空线路 2.585km，单回架空线路 0.174km），共新建角钢塔 11 基（双回直线塔 4 基，双回耐张塔 6 基，单回耐张塔 1 基），采用柔性开挖基础（1 基）、灌注桩基础（10 基）。

本工程总投资为 2314 万元（未决算），其中土建投资 463 万元。本工程总占地面积 12070m<sup>2</sup>，其中永久占地 2345m<sup>2</sup>，临时占地 9725m<sup>2</sup>；本工程挖填方总量为 4458m<sup>3</sup>，其中挖方量 2229m<sup>3</sup>（含表土剥离量 652m<sup>3</sup>，基础土方量 1577m<sup>3</sup>），填方量 2229m<sup>3</sup>（含表土回覆量 652m<sup>3</sup>，基础土方量 1577m<sup>3</sup>），无余方，无借方。本工程于 2025 年 4 月开工，于 2025 年 12 月完工，总工期 9 个月。

2025 年 3 月，国网江苏省电力有限公司常州供电分公司委托江苏核众环境监测技术有限公司（以下简称我公司）承担了本工程的水土保持监测工作。接受委托后，我公司立即组织水土保持监测专业人员成立了水土保持监测项目组，全面开展资料收集和现场踏勘，并于 2025 年 3 月编制完成了《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测实施方案》，随后，监测人员按照委托要求和实施方案的相关要求，在建设单位、工程监理单位、施工单位及相关部门的大力支持和协助下，通过实地测量、资料分析和无人机低空遥感监测等方法对工程建设活动造成的地表扰动区域面积、水土流失状况及其危害情况、水土保持措施实施进度、已有水土保持设施的运行情况及其防护效果进行全面监测。

本工程水土保持监测工作于 2026 年 1 月底结束，监测时段为 2025 年 3 月-2026 年 1 月。监测人员总计进行现场监测 4 次，出具水土保持监测意见书 4 份，形成监测季度报告表 4 份。监测工作结束后，经过资料整理和分析后，监测组于 2026 年 3 月，编制完成《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测总结报告》。

根据水土保持监测结果，建设单位对施工过程中地表扰动区域实施了相应的水土保持工程措施和临时措施，在施工活动结束后，实施了植物措施，最终形成了工程措施、植物措施、临时措施相结合的水土流失防治体系。根据监测推算，监测期间土壤流失量约为 2.31t，其中施工期 2.25t，试运行期 0.06t。水土流失六项防治目标实际完成值如下：水土流失治理度为 99.5%，达到 98%的目标值；土壤流失控制比为 3.3，达到 1.0 的目标值；渣土防护率为 99.3%，达到 99%的目标值；表土保护率为 96.0%，达到 92%的目标值；林草植被恢复率为 98.4%，达到 98%的目标值；林草覆盖率为 70.8%，达到 27%的目标值。

根据《水利部办公厅进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）文件内容，在 4 个季度的监测过程中，我单位对现场监测的三色评价情况进行打分，2025 年第一季度得分为 100 分，2025 年第二季度得分为 96 分，2025 年第三季度得分为 92 分，2026 年第一季度得分为 94 分，均为“绿色”评价。

我单位在监测工作中，得到了建设单位以及监理单位、施工单位的大力支持和协助，在此谨表谢意！

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标				
项目名称	常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程			
建设规模	本工程分为点型工程和线型工程，共扩建出线间隔 2 个，改造出线间隔 1 个，新建 220kV 架空线路 2.759km，新建角钢塔 11 基。具体包括：（1）永和 220 千伏变电站扩建工程：本期改造两组户外 220kV GIS 基础及埋件，扩建相应设备支架及基础；扩建场地通信余缆箱及埋管。基础采用钢筋混凝土独立基础，设备支架与基础采用杯口连接。配电装置同前期，采用户外 GIS 设备。本期扩建工程不征地，利用前期工程预留场地扩建。（2）淦西 220 千伏变电站改造工程：本期更名 1 回（原瓦屋牵引站改为永和），无一次设备改造内容，仅对间隔保护进行改造；本期扩建部分通信余缆箱及埋管。（3）淦西~瓦屋牵单线π入永和变 220 千伏线路工程：本期新建瓦屋牵-永和 220kV 架空线路 2.759km（双回架空线路 2.585km，单回架空线路 0.174km），共新建角钢塔 11 基（双回直线塔 4 基，双回耐张塔 6 基，单回耐张塔 1 基），采用柔性开挖基础（1 基）、灌注桩基础（10 基）。	建设单位、联系人	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司、王一平	
		建设地点	江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道	
		所属流域	太湖流域	
		工程总投资	2314 万元（未决算）	
		工程总工期	9 个月/2025.04-2025.12	
水土保持监测指标				
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司	联系人及电话	樊虹呈 13770677667	
自然地理类型	平原	防治标准	南方红壤区一级标准	
监测内容	监测指标	监测方法（设施）	监测指标	监测方法（设施）
	1.水土流失状况监测	实地测量、资料分析	2.防治责任范围监测	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
	3.水土保持措施情况监测	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	4.防治措施效果监测	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测
	5.水土流失危害监测	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	水土流失背景值	150t/(km <sup>2</sup> ·a)
方案设计防治责任范围	10176m <sup>2</sup>	土壤容许流失量	500t/(km <sup>2</sup> ·a)	
水土保持投资	52.01 万元	侵蚀模数达到值	150t/(km <sup>2</sup> ·a)	
防治措施监测	分区	工程措施	植物措施	临时措施
	间隔扩建区	表土剥离 45m <sup>3</sup> 土地整治 150m <sup>2</sup>	铺植草皮 150m <sup>2</sup>	/
	间隔改造区	碎石压盖 100m <sup>2</sup>	/	/
	塔基区	表土剥离 607m <sup>3</sup> 土地整治 5852m <sup>2</sup>	播撒草籽 2699m <sup>2</sup>	泥浆沉淀池 10 座 土质排水沟 610m 土质沉沙池 6 座

水土保持监测特性表

论					密目网苫盖 4250m <sup>2</sup>			
	牵张场及跨越场区	土地整治 3300m <sup>2</sup>		播撒草籽 290m <sup>2</sup>		铺设钢板 1400m <sup>2</sup> 密目网铺垫 900m <sup>2</sup>		
	施工道路区	土地整治 1312m <sup>2</sup>		播撒草籽 532m <sup>2</sup>		铺设钢板 820m <sup>2</sup>		
	防治效果	分类指标	目标值	达到值	实际监测数量			
		水土流失治理度	98%	99.5%	水土流失治理达标面积	12010m <sup>2</sup>	水土流失总面积	12070m <sup>2</sup>
		土壤流失控制比	1.0	3.3	治理后每平方公里平均土壤流失量	150t/(km <sup>2</sup> ·a)	容许土壤流失量	500t/(km <sup>2</sup> ·a)
		渣土防护率	99%	99.3%	实际挡护的临时堆土数量	2213m <sup>3</sup>	临时堆土总量	2229m <sup>3</sup>
		表土保护率	92%	96.0%	实际保护的表土数量	2568m <sup>3</sup>	可保护表土数量	2674m <sup>3</sup>
		林草植被恢复率	98%	98.4%	林草类植被面积	3671m <sup>2</sup>	可恢复林草植被面积	3731m <sup>2</sup>
		林草覆盖率	27%	70.8%	林草类植被面积	3671m <sup>2</sup>	建设区面积(扣除复耕面积)	5187m <sup>2</sup>
水土保持治理达标情况	水土流失防治目标均已达到水土保持方案的要求。							
总体结论	各项防治措施实施到位，满足设计要求，达到预期效果。							
主要建议	对已完成的水土流失防治措施加强管护；注意植物养护工作，以保证发挥其水土保持作用。							
水土保持“三色”评价	<p>根据本工程水土保持监测结果，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，在4个季度的监测过程中，2025年第一季度得分为100分，2025年第二季度得分为96分，2025年第三季度得分为92分，2026年第一季度得分为94分。本工程总体评价为“绿色”。</p> 							

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 建设项目概况

### 1.1.1 项目基本情况

#### 1.1.1.1 地理位置

本工程位于江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道境内。永和 220kV 变电站间隔扩建区域中心点坐标为 (N31°31'54.00", E119°17'18.41") ; 淦西 220kV 变电站间隔改接区域中心点坐标为(N 31°25'54.13", E 119°23'1.22"); 淦西 ~ 瓦屋牵单线  $\pi$  入永和变 220 千伏线路工程起于瓦屋山牵引站 (N31°31'56.31", E119°18'36.25"), 终于永和变(N31°31'54.00", E119°17'18.41")。

#### 1.1.1.2 建设性质

本工程属于新建、改扩建输变电工程。

#### 1.1.1.3 工程规模

本工程分为点型工程和线型工程,共扩建出线间隔 2 个,改造出线间隔 1 个,新建 220kV 架空线路 2.759km,新建角钢塔 11 基。具体包括:

##### (1) 永和 220 千伏变电站扩建工程

本期改造两组户外 220kV GIS 基础及埋件,扩建相应设备支架及基础;扩建场地通信余缆箱及埋管。基础采用钢筋混凝土独立基础,设备支架与基础采用杯口连接。配电装置同前期,采用户外 GIS 设备。本期扩建工程不征地,利用前期工程预留场地扩建。

##### (2) 淦西 220 千伏变电站改造工程

本期更名 1 回(原瓦屋牵引站改为永和),无一次设备改造内容,仅对间隔保护进行改造;本期扩建部分通信余缆箱及埋管。

##### (3) 淦西 ~ 瓦屋牵单线 $\pi$ 入永和变 220 千伏线路工程

本期新建瓦屋牵-永和 220kV 架空线路 2.759km(双回架空线路 2.585km,单回架空线路 0.174km),共新建角钢塔 11 基(双回直线塔 4 基,双回耐张塔 6 基,单回耐张塔 1 基),采用柔性开挖基础(1 基)、灌注桩基础(10 基)。

#### 1.1.1.4 工程占地

本工程分为间隔扩建区、间隔改造区、塔基区、牵张场及跨越场区、施工道路区。根据监测结果,工程总占地面积 12070m<sup>2</sup>,其中,永久占地面积 2345m<sup>2</sup>,

临时占地面积 9725m<sup>2</sup>。永久占地包括间隔扩建区永久占地 200m<sup>2</sup>、间隔改造区永久占地 150m<sup>2</sup>、塔基区永久占地 1995m<sup>2</sup>；临时占地包括塔基区临时占地 5113m<sup>2</sup>、牵张场及跨越场区临时占地 3300m<sup>2</sup>、施工道路区临时占地 1312m<sup>2</sup>。本工程占用耕地面积 3474m<sup>2</sup>，占用园地面积 4778m<sup>2</sup>，占用其他土地面积 3468m<sup>2</sup>，占用公共管理与公共服务用地面积 350m<sup>2</sup>。

#### 1.1.1.5 土石方工程量

根据监测结果，本工程挖填方总量为 4458m<sup>3</sup>，其中挖方量 2229m<sup>3</sup>（含表土剥离量 652m<sup>3</sup>，基础土方量 1577m<sup>3</sup>），填方量 2229m<sup>3</sup>（含表土回覆量 652m<sup>3</sup>，基础土方量 1577m<sup>3</sup>），无余方，无借方。

#### 1.1.1.6 工程投资与工期

工程建设实际总投资 2314 万元（未决算），其中土建投资 463 万元。本工程于 2025 年 4 月开工，于 2025 年 12 月完工，总工期 9 个月。

### 1.1.2 项目区概况

#### 1.1.2.1 地形地貌

本工程所在地为常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道。项目区地貌单元属于高沙平原，新建线路沿线主要为农田、果园、空闲地以及养殖塘。沿线地形较平坦，高程起伏较小，沿线高程 14.5m（1985 国家高程，下同）左右，交通便利。

#### 1.1.2.2 气象

常州市溧阳市位于中纬度北亚热带，气候属北亚热带季风气候，由于季风环流的影响，具有明显的季风气候特征，具四季分明、气候湿润、光照充足、雨量充沛、无霜期长的特点。夏季受温暖潮湿的海洋气团控制，天气炎热多雨；冬季受极地大陆气团控制，以寒冷、少雨天气为主。根据溧阳市气象站（1960-2024 年）气象资料统计数据，项目区多年气象要素情况如下：

表 1-1 项目区主要气象气候特征

编号	气象要素		数值
1	气温(°C)	累年平均气温	15.2
		累年绝对最高气温极值	38.1
		累年绝对最低气温极值	-13.3
2	降水量(mm)	累年平均降水量	1049.6
		累年最大年降水量	1815.8(1991)
		累年最大月降水量	472.4(1991.07)
		累年最大日降水量	190.1(1972.03)

编号	气象要素		数值
		累年最大 1h 降水量	102.9(1990.08)
3	气压(hPa)	累年平均气压	1016.7
4	相对湿度(%)	累年平均相对湿度	80
		累年最小相对湿度	11(1992)
5	风速/风向(m/s)	累年平均风速	2.9
		累年最大风速	18.3(1992.08.06)
		累年主导风向	E
6	雷暴日数(d)	累年平均雷暴日数	28.9
7	积雪深度(cm)	累年最大积雪深度	28(1984.01.19)

### 1.1.2.3 水文

溧阳市境内主要以南河、中河、北河汇全县山丘之水和高淳、郎溪部分客水，分别经宜溧漕河、北溪河注入西沈，东流入太湖。其中：南河，主要汇县境南部和西南部以及高淳、郎溪之水，经宜溧漕河、西沈注入太湖；中河，主要汇县境西部之水，经宜兴北溪河东流入太湖；北河，主要汇县境北部之水，经洮湖、渭湖流入太湖。河流最高水位，一般出现在 7 至 9 月，最低水位出现在 12 月至翌年 3 月。水位变化一般在 2.50 至 5.50m，最大超过 6m 以上。水位变化大，除山丘区洪暴来水的特性外，在一定程度上还受长江、太湖倒灌或顶托的影响。线路沿线区域地势平坦，本项目跨越大兴河。大兴河位于溧阳市上兴镇的东面，为上兴镇两条县级河道之一，全长 10.25km，流向自北向南。

### 1.1.2.4 地质、地震

根据搜集的资料，沿线在勘探深度范围内，地基土主要由第四系全新统冲积成因的粉质黏土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土夹粉土、粉质黏土混碎石、以及侏罗系上侏罗统的砂岩组成。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A“我国主要城镇抗震设防烈度、基本设计地震加速度和设计地震分组”规定，沿线地区抗震设防烈度均为 7 度，设计基本地震加速度均为 0.10g，设计地震分组为第一组。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），设计特征周期值 0.35s。

### 1.1.2.5 土壤、植被

常州市土壤类型多样，主要有水稻土、黄棕壤、红壤、水稻土、潮土、石灰土、黄褐土等。北部沿江地区以长江冲积物为主，中部低洼地区以湖相冲积沉积物为主，南部丘陵区以残积、坡积和洪积物为主。项目区主要土壤类型为水稻土、黄棕壤土，本项目园地可剥离厚度约 0.2m，耕地和其他土地剥离厚度为 0.3m。

常州市地带性植被为北亚热带常绿落叶阔叶混交林。植被资源多分布在丘陵山区，如茅山山脉、南山-天目山山脉及太湖椒山岛等地，湖荡地区有部分自然植被，平原地区均为人工植被。从植被类型看，乔木、灌木和草丛多分布于丘陵山区，沼泽植被分布于江湖沿岸、低洼湿地，水生植被分布于湖泊、溪沟及池塘。项目区林草覆盖率为 25%，项目区植被主要为园地和农作物。

#### 1.1.2.6 水土流失情况

项目位于江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箦镇以及昆仑街道。根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，项目区属于水力侵蚀类型区南方红壤区—江淮丘陵及下游平原区—太湖丘陵平原水质维护人居环境维护区—宜溧低山丘陵土壤保持水源涵养区。依据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》的公告（苏水农〔2014〕48 号），工程所在地竹箦镇属于江苏省省级水土流失重点预防区，上兴镇属于江苏省省级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目水土流失防治标准应执行南方红壤区一级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀的主要类型为水力侵蚀，容许土壤侵蚀模数为 500t/（km<sup>2</sup>·a）。

根据项目所在地江苏省水土流失现状图，参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目所在地土壤侵蚀强度为微度，土壤侵蚀模数背景值为 150t/（km<sup>2</sup>·a）。

### 1.2 水土流失防治工作情况

#### 1.2.1 建设单位水土保持管理情况

##### （1）管理机构

项目在建设过程中，成立了以建设单位、设计单位、主体监理单位、水土保持监测单位和施工单位在内的工程水土保持工作小组。

水土保持工作小组负责本工程水土保持工作实施计划的编制及组织实施；水土保持管理制度的制定；提供相关水土保持设备，协助布设水土保持设施，开展日常水土保持工作，收集有关水土保持数据；统计、分析、审核、汇编水土保持工作成果；定期进行总结报告编写；编写、审核、发送责任范围内的水土保持工作检查。保证各项工作按照批复的水土保持方案报告表和相关要求贯彻实施。各参建单位设置水土保持专职人员，负责水土保持各项日常管理工作。

表 1-2 水土保持工作小组组成表

工作小组单位			职责
组长	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	建设单位	总体协调、组织
成员	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	施工单位	工程水土保持措施施工
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	设计单位	水土保持措施设计、工艺管控
	江苏兴力工程管理有限公司	监理单位	水土保持措施及投资落实情况监管
	江苏核众环境监测技术有限公司	监测单位	水土保持措施落实情况监测

## (2) 工作制度

国网江苏省电力有限公司常州供电分公司将水土保持工作当做贯彻落实国家生态绿色工程建设的重要举措，水土保持工作与工程主体工作同等重要。在工程建设过程中，水土保持工作与主体工程贯彻“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”要求。在施工过程中保护生态环境，减少水土流失。

### 1) 建设单位

本项目建设单位为国网江苏省电力有限公司常州供电分公司，建设单位在建设过程中：

①建立健全工程水土保持工作管理体系，配备水土保持管理专职人员，负责本单位及受委托工程建设项目的水土保持管理工作。

②组织招投标工作，与各相关方签订合同。

③制订工程水土保持管理文件，并组织实施；审批业主项目部报审的水土保持管理策划文件；组织水土保持设计审查和交底工作；结合本单位安全质量培训，同步组织水土保持知识培训。

④依据批复的水土保持方案报告以及水土保持方案变更管理办法要求，组织梳理和收集工程重大水土保持变更情况（若有），及时上报重大设计变更情况和变更依据。

⑤组织水土保持专项验收。

⑥对于工程各级水土保持行政主管部门开展的检查，统一组织迎检，对提出的问题，组织限期整改并将整改情况书面报送主管部门。

⑦督促业主项目部落实工程项目的水土保持管理工作，组织或委托业主项目部开展工程项目水土保持管理评价考核工作。

⑧负责工程项目档案管理的日常检查、指导，组织工程项目档案的移交工作。

## 2) 设计单位

本项目设计单位为中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司,设计单位在主体工程和水土保持设计过程中:

①建立健全水土保持设计质量管理体系,执行水土保持设计文件的校审和会签制度,确保水土保持设计质量。

②依据批复的工程水土保持方案,与主体设计同时开展水土保持设计工作,设计深度满足水土保持工程建设要求。

③接受项目设计监理的管理,按照设计监理要求开展水土保持设计工作。

④按照批复的水土保持方案和重大水土保持变更管理办法要求,核实主体设计施工图的差异,并对差异进行详细说明,并及时向相关建设管理单位和前期水土保持方案编制单位反馈信息。

⑤按规定派驻工地代表,提供现场设计服务,及时解决与水土保持相关的设计问题。

⑥在现场开展水土保持竣工自验收时,结合水土保持实施情况,提出水土保持目标实现和工程水土保持符合性说明文件,确保工程水土保持设施符合设计要求。

⑦配合或参与现场工程水土保持检查、水土保持监督检查、各阶段各级水土保持验收工作、水土保持事件调查和处理等工作。

## 3) 监理单位

本项目水土保持监理由主体工程监理单位江苏兴力工程管理有限公司代为进行,监理单位在建设过程中,严格履行以下职责和制度:

①技术文件审核、审批制度。监理单位应依据合同约定对施工图纸和施工单位提供的施工组织设计、开工申请报告等文件进行审核或审批。

②材料、构配件和工程设备检验制度。监理单位应对进场的材料、苗木、籽种、构配件及工程设备出厂合格证明、质量检测报告进行核查,并责令施工或采购单位负责将不合格的材料、构配件和工程设备在规定时限内运离工地或进行相应处理。

③工程质量检验制度。施工单位每完成一道工序或一个单元、分部工程都应进行自检,合格后方可报监理单位进行复核检验。上一单元、分部工程未经复核检验或复核检验不合格,不应进行下一单元、分部工程施工。

④工程计量与付款签证制度。按合同约定，所有申请付款的工程量均应进行计量并经监理机构确认。未经监理机构签证的工程付款申请，建设单位不应支付。

⑤工地会议制度。工地会议由总监理工程师或总监理工程师代表主持，相关各方参加并签到，形成会议纪要需分发与会各方。工地例会每月定期召开一次，水土保持工程参建各方负责人参加，由总监理工程师或总监理工程师代表主持，并形成会议纪要。会议应通报工程进展情况，检查上一次工地例会中有关决定的执行情况，分析当前存在的问题，提出解决方案或建议，明确会后应完成的任务。监理机构应根据需要，主持召开工地专题会议，研究解决施工中出现的涉及工程质量、工程进度、工程变更、索赔、安全、争议等方面的专门问题。

⑥工作报告制度。监理机构应按双方约定的时间和渠道向建设单位提交项目监理月报（或季报、年度报告）；在单位工程或单项工程验收时提交监理工作报告，在合同项目验收时提交监理工作总结报告。

⑦工程验收制度。在施工单位提交验收申请后，监理机构应对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关规定或合同约定，参与、协助建设单位组织工程验收。

#### 4) 施工单位

本项目水土保持设施施工单位为中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司。施工单位有完整的、运转正常的质量保证体系，各项管理制度完整，质检部门的人员配备能满足工程现场质量管理工作的需要；认真执行国家和行业的有关工程质量的监督、检查、验收、评定方面的方针、政策、条例、法规、规程、规范、标准和设计单位提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件等；遵守业主发布的各项管理制度，接受业主、施工监理部的质量监督和检查；做好监检中的配合工作和监检后整改工作；工程开工前有针对性的制定工程的实施方案及实施纲要、施工组织设计（包括总设计、专业设计）、质量验评范围划分表、图纸会审纪要、技术交底记录、质量通病的预防计划（质量工作计划）、重点项目、关键工序的质量保证措施施工方案，上述各项需在开工前提交给施工监理部审核，监理部在开工前送业主审批，以取得业主的认可，经监理部、业主认可方可进行正式施工；在进场后施工前向施工监理部报送质保体系和质检人员的名单和简历、特种作业和试验人员的名单及持证证号，以备案与复查；按规定做好施工质量的分级检验工作，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标

准与检验方法；按规定做好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，并努力做到施工计量器具与检验计量器具分开；对业主和施工监理部发出的《工程质量问题通知单》、《不符合项通知单》等整改性文件认真及时处理，并按规定的程序，及时反馈；按规定做好质量记录事故的登录、一般质量事故的调查、分析、处理和重大质量事故的上报工作；及时做好各项工程施工质量的统计工作，并在规定时间内送往施工监理部审阅，施工监理部汇总后报送业主，其内容包括质量验评、技术检验和试验、施工质量问题、设备与原材料质量问题以及次月质量工作计划。

#### 5) 监测单位

本项目水土保持监测单位为江苏核众环境监测技术有限公司。水土保持监测单位按照水土保持有关技术标准和水土保持方案的要求，根据不同生产建设项目的特点，明确监测内容、方法和频次，调查获取项目区水土流失背景值，定量分析评价自项目动土至投产使用过程中的水土流失状况和防治效果，及时向生产建设单位提出控制施工过程中水土流失的意见建议。

### (3) 执行情况

#### 1) “三同时”制度落实情况

根据水土保持方案与主体工程同步实施的原则，本工程水土保持方案与主体工程同时设计。参照主体工程施工进度，国网江苏省电力有限公司常州供电分公司将各项水土保持措施的实施进度与相应的主体工程进度相衔接，使各防治区内的水土保持措施与主体工程同时实施，相互协调，有序进行。由于水土保持措施的实施有些受季节因素影响，水土流失的发生在不同部位、不同时段具有不同的特点，因此以工程措施为先，植物措施随后。通过合理安排，力争与主体工程同时完工，同时投产。

#### 2) 管理制度落实情况

本工程实行项目经理负责制，现场成立施工项目部，建立工程现场管理组织机构，组织建立相关施工责任制和各种专业管理体系并组织落实各项管理组织和资源配置，制订了施工制度、安全、质量及造价管理实施计划，对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等有关要求执行情况进行了检查、分析及纠偏。并组织落实了安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求，保障了项目各项管理活动的开展和落实。受国网江苏省电力有限公司常州供电分公司委托，由主体

工程监理单位江苏兴力工程管理有限公司代为进行本项目水土保持监理工作。监理部实行总监负责制，监理部在管理模式上采用组织机构，实行总监理工程师负责制。工程开工时监理小组即入驻现场，同时开展水土保持专项监理工作。工程自开工以来，监理小组定期对施工现场水土保持工作开展情况进行专项检查，检查内容通过监理通知单形式要求施工单位进行整改，以设计图纸为准则，深入施工现场开展质量管控，重点对排水管网统以及场地恢复情况等方面进行了质量管控。严格监理制度的实施，确保了工程建设过程各项水土保持措施的顺利落实。

### 1.2.2 水土保持方案编制与报送情况

2023年9月，国网江苏省电力有限公司常州供电分公司委托江苏辐环环境科技有限公司负责本工程水土保持方案编报工作。于2023年11月，方案编制单位完成了《常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程水土保持方案报告表》（送审稿），并于当月送专家函审。

2023年12月，根据专家审查意见，方案编制单位对报告表作了认真的修改和补充，并以此为依据完成了《常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程水土保持方案报告表》（报批稿）。

2024年1月10日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》（苏水许可〔2024〕12号）文件，对本项目水土保持方案进行了批复。

### 1.2.3 水土保持后续设计及变更情况

#### （1）后续设计情况

本工程水土保持部分为可研设计阶段。建设单位坚持贯彻执行水土保持“三同时”制度，将已批复的项目方案报告表中的各项水土保持措施纳入初步设计和施工图设计中考虑，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

#### （2）变更情况

依据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），对本项目变更情况进行了筛查，从筛查结果看，本项目不涉及重大变更，筛查结果详见表1-3。

表 1-3 项目水土保持变更情况筛查情况表

序号	《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）相关规定	方案设计情况	本工程实际情况	变化是否达到变更报批条件
1	第十六条 水土保持方案经批准后存在下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报原审批部门审批	/	/	/
1.1	工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的	本工程涉及江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区	项目地点未发生变化，本工程涉及江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区	项目地点未发生变化，涉及相关区域与批复的方案一致，未达到变更报批条件
1.2	水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30% 以上的	方案设计水土流失防治责任范围为 10176m <sup>2</sup> ；方案设计的开挖填筑土石方总量为 7312m <sup>3</sup>	实际水土流失防治责任范围为 12070m <sup>2</sup> ；实际开挖填筑土石方总量为 4458m <sup>3</sup>	水土流失防治责任范围较方案设计增加 1894m <sup>2</sup> 、增加 18.61%，增加未达到变更报批条件；开挖填筑土石方总量较方案设计减少 2854m <sup>3</sup> 、减少 39.03%，不涉及增加，未达到变更报批条件
1.3	线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过 300 米的长度累计达到该部分线路长度 30% 以上的	不涉及	不涉及	未达到变更报批条件
1.4	表土剥离量或者植物措施总面积减少 30% 以上的	方案设计的表土剥离量 625m <sup>3</sup> ；方案设计的植物措施总面积 2909m <sup>2</sup>	实际表土剥离量 652m <sup>3</sup> ；工程实施植物措施总面积 3671m <sup>2</sup>	表土剥离量较方案设计增加 27m <sup>3</sup> ，增加 4.32%，未减少，未达到变更报批条件；植物措施总面积较方案设计增加 762m <sup>2</sup> ，增加 26.19%，未减少，未达到变更报批条件
1.5	水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的	方案设计工程措施、植物措施和临时措施相结合	经验收组现场核查，实际水土保持重要单位工程措施体系较为完善，不存在可能导致水土保持功能显著降低或丧失的变化	未达到变更报批条件
2	第十七条 在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高	本工程不涉及弃渣场	本工程不涉及弃渣场	未达到变更报批条件

序号	《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）相关规定	方案设计情况	本工程实际情况	变化是否达到变更报批条件
	的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批。			

#### 1.2.4 水土保持监测意见落实情况

在为期 10 个月的监测过程中，我单位给建设单位提交了 4 份现场监测意见书，列出我单位现场监测发现的良好和不足之处具体情况见表 1-4:

表 1-4 现场监测意见及整改落实情况表

监测情况		整改情况	
监测日期	监测意见	整改日期	整改内容
2025.03.28	此时，工程正处于施工前期准备阶段，施工单位暂未进场施工，线路沿线占地类型主要为耕地、园地、其他土地，间隔扩建区和间隔改造区占地类型为公共管理与公共服务用地。	/	/
2025.06.24	现阶段正在进行塔基基础和间隔扩建区施工，现场措施布设较好。	/	/
2025.09.16	现阶段塔基基础施工已基本完成，部分塔基正在进行立塔施工，部分塔基施工现场存在裸露地表，建议对裸露地表补充苫盖措施。	2025.09.22	施工回复：已对裸露地表补充了密目网苫盖措施
2026.01.25	现阶段工程已完工，现场恢复情况良好。	/	/

我单位列出在 4 次现场监测中发现的良好现状以及不足之处，向建设单位提交了 4 份现场监测意见书。建设单位在收到监测意见书后，通知施工单位针对现场监测中不足之处作出整改。

#### 1.2.5 水行政部门监督检查意见落实情况

本工程在施工期间，未收到各级水行政主管部门的监督检查意见。

#### 1.2.6 重大水土流失危害事件处理情况

本工程建设过程中建设单位加强管理，施工活动对周边造成的影响较小，未造成水土流失危害事件。

### 1.3 监测工作实施情况

#### 1.3.1 监测实施方案编制与实施

2025 年 3 月，国网江苏省电力有限公司常州供电分公司委托我单位开展水

水土保持监测工作。接受委托后，我公司领导高度重视，立即组织人员成立监测项目组，并及时赴项目所在地进行现场查勘，收集工程的相关基础资料。在参考本工程水土保持方案后，依据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等标准的要求，监测小组于2025年3月编制完成了《常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程水土保持监测实施方案》，随之开展水土保持监测工作。

在监测过程中，通过现场调查监测和查阅施工监理资料，了解并掌握项目区水土流失与水土保持状况，在此基础上，整理分析，编制完成水土保持监测总结报告。

### 1.3.2 监测项目组与监测人员

为做好该工程水土保持监测，保证监测质量，该工程水土保持监测实施项目负责人负责制，项目组成员分工负责制。该工程水土保持监测项目组设总监测工程师1名，监测工程师1名，监测员1名。监测成员统计见表1-5：

表 1-5 监测项目组成员及分工

职位名称	姓名	职称	职责
总监测工程师	樊虹呈	工程师	项目组负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量
监测工程师	蒋莉	工程师	负责监测数据的汇总、校核和分析
监测员	黄春清	工程师	协助完成监测数据的采集和整理

### 1.3.3 监测点布设

水土保持监测实施中的监测点位布设结合水土流失防治分区选取易产生水土流失，且具有一定代表性的部位进行重点监测。监测点布设如下：

（1）间隔扩建区：在该区采取实地测量、资料分析及无人机低空遥感监测，监测施工过程中扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况、防护效果情况及后期植被恢复情况。

（2）间隔改造区：在该区采取实地测量、资料分析及无人机低空遥感监测，监测施工过程中扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果情况。

（3）塔基区：在该区采取实地测量、资料分析及无人机低空遥感监测，监测施工过程中扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况。

(4) 牵张场及跨越场区：在该区采取实地测量、资料分析及无人机低空遥感监测，监测施工过程中扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况。

(5) 施工道路区：在该区采取实地测量、资料分析及无人机低空遥感监测，监测施工过程中扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况。

各区监测点布设见表 1-6。

表 1-6 本工程水土保持监测点位布设表

序号	监测分区	监测方法	监测点性质	监测内容
1	间隔扩建区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测间隔扩建区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况、防护效果情况及后期植被恢复情况
2	间隔改造区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测间隔扩建区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果情况
3	塔基区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测塔基区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况
4	牵张场及跨越场区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测牵张场及跨越场区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况
5	施工道路区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测施工道路区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况

#### 1.3.4 监测设施设备

根据《实施方案》及现场水土保持监测需要，本次水土保持监测工作中有针对性投入了各类监测设备和交通辅助设备，这些设备充分满足了本工程水土保持监测工作的需要，具体监测设备投入统计情况见表 1-7。

表 1-7 本工程水土保持监测设备表

序号	设备	单位	数量	备注
1	个人便携式电脑	台	3	笔记本 3 台
2	手机	台	2	
3	激光打印机	台	2	黑白、彩色各 1 台
4	记录本、笔	套	10	
5	标识牌	副	2	

序号	设备	单位	数量	备注
6	GPS 面积测量仪	部	1	
7	无人机低空遥感监测设备	套	1	大疆精灵 4Pro
8	无人机低空遥感监测成图软件	套	1	PIX4Dmapper
9	安全帽	顶	3	
10	越野车	台	1	
11	便携式泥沙测量仪	台	1	SBJV-IV

### 1.3.5 监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定要求，结合项目区的地形、地貌及侵蚀类型，采用实地测量、资料分析以及无人机低空遥感监测等方法。

#### （1）实地测量

根据主体工程建设进度，对扰动和破坏区采用定点跟踪监测与随机抽样调查监测相结合的方法。利用手持式 GPS 面积测量仪等工具，实地测量扰动面积、位置、水土保持措施规格等。

#### （2）资料分析

收集项目区气象资料以及主体工程设计、施工以及监理等资料，并对资料进行分析，与现场监测情况进行复核，确定水土保持措施类型、工程量等。

#### （3）无人机低空遥感监测

利用 pix4Dcapture 软件编辑无人机飞行任务，将编辑好的任务保存后上传到无人机云台，通过现场无人机飞行获取详细航拍照片，飞行结束后将无人机照片导入电脑特定文件夹，利用 pix4Dmapper 软件完成拼接，随后利用 ArcGIS 软件进行项目区扰动面积解译。基于高分辨率遥感影像，通过现场勾绘和人机交互解译，对工程建设的扰动范围、强度、土石方量、水土流失程度及区域生态环境影响等进行宏观监测。

### 1.3.6 监测成果提交情况

在监测过程中，监测人员进场 4 次，编制完成水土保持监测季度报告表 4 份，出具水土保持监测意见书 4 份，现场监测记录资料以及现场影像资料若干。根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号），水土保持监测实施方案在 2025 年 3 月提交给建设单位；水土保持监测季度报告在每季度结束后一个月内提交给建设单位；水土保持监测

意见则在每次监测结束后 7 天内提交给建设单位。

截至目前已完成的主要阶段性监测成果资料如下：

(1) 《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测实施方案》（2025 年 3 月）

(2) 《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测季报（2025 年第一季度）》

(3) 《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测季报（2025 年第二季度）》

(4) 《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测季报（2025 年第三季度）》

(5) 《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测季报（2026 年第一季度）》

(6) 《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测意见书》（4 份）

(7) 《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程》高精度影像资料

除以上成果之外，还包括现场照片等。监测工作结束后，经过资料整理和分析后，监测人员在 2026 年 3 月编制完成《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持监测总结报告》。

### 1.3.7 重大水土流失危害事件处理情况

经调查，本工程在施工及试运行期间未发生水土流失危害事件。

## 2 监测内容与方法

### 2.1 扰动土地情况

扰动土地情况采用调查监测与遥感监测相结合的方法。根据水土保持方案，结合施工组织设计和平面布置图，利用 GPS 面积测量仪等工具，实地测量沿线各防治分区的扰动面积、位置，同时使用无人机低空遥感监测，并利用软件对影像资料进行解译，通过对比工程施工、监理等资料，经过复核后，最终得出总扰动面积。扰动土地监测情况详见表 2-1。

表 2-1 扰动土地情况的监测一览表

防治分区	监测频次	监测方法
间隔扩建区	共 4 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
间隔改造区	共 2 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
塔基区	共 4 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
牵张场及跨越场区	共 2 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
施工道路区	共 4 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析

### 2.2 取土（石、料）、弃土（石、渣）情况

本工程未设置取土场和弃土场，所需的回填土方均来自工程各个区域本身的挖方。现场监测主要对土方的挖填数量、堆放地方、堆放高度以及土方利用去向等采用了资料分析和实地量测等方法。

表 2-2 弃土情况监测一览表

序号	监测指标	监测方法
1	开挖土方数量、位置、面积	实地测量、资料分析
2	挖方去向	实地测量、资料分析
3	土方临时堆放位置	实地测量、资料分析
4	堆土数量及堆高	实地测量、资料分析
5	土方回填数量、位置、面积	实地测量、资料分析

### 2.3 水土保持措施情况

#### (1) 工程措施监测

在查阅施工（竣工）图、施工组织设计、工程监理等资料基础上，结合水土保持方案，进行实地调查，核查各监测分区是否按照水土保持方案实施排水、土地整治等水土保持工程措施；对已实施工程措施现场查勘完好程度、水土流失防治效果和运行状况等。

#### (2) 植物措施监测

包括植物措施的种类、面积、分布、生长状况和林草覆盖率。在查阅施工（竣

工)图、施工组织设计、工程监理等资料基础上,结合水土保持方案,进行实地调查,核查各监测分区是否按照水土保持方案实施绿化、植被恢复等水土保持植物措施;选择有代表性的地块布设监测样地,现场调查覆盖度等指标。

项目区林草覆盖度利用植被覆盖率测量仪,采用抽样调查和测量等方法进行监测。即选择有代表性的地块,确定调查地样方,先现场测量植被覆盖度,再计算出场地的林草覆盖度。

### (3) 临时措施监测

根据收集施工阶段过程影像资料和施工组织设计,结合水土保持方案,通过实地调查,查阅施工组织设计等资料确认施工进度和工程量,及时掌握临时措施的类型、位置、数量和防治效果等。

## 2.4 水土流失监测

### 2.4.1 土壤侵蚀及土壤流失量监测

通过实地测量、无人机低空遥感监测等方法监测,结合施工、监理资料,对监测区内不同施工工艺的区域进行调查,并在平面布置图中进行标注,反映内容包括土壤侵蚀类型、形式和分布情况。

结合施工组织方案,通过现场实地勘测,结合地形图、遥感监测,按不同地貌类型分区测定扰动地表类型及扰动面积,调查施工阶段每个扰动类型区的基本特征(扰动土地类型、开挖面坡长、坡度)及水土保持措施(排水沟、沉沙池、土地整治工程、植被恢复等)实施情况。

### 2.4.2 水土流失危害监测

水土流失危害数量监测采实地调查、询问的方法。通过对比分析相关指标,评价和估算危害大小。水土流失状况监测包括水土流失的类型、形式、面积、分布及强度;各监测分区及其重点对象的土壤流失量等。通过实地调查、遥感监测,结合现场调查监测成果,及工程施工布置图,对监测区内不同施工工艺的区域进行调查,反映内容包括土壤侵蚀类型、形式和分布情况。

表 2-3 水土流失情况的监测内容方法

监测指标	监测频次	监测方法
水土流失类型、形式	共计 1 次	资料分析、实地测量
水土流失面积	共计 4 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
土壤流失量	共计 4 次	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析
水土流失危害	灾害事件发生后 1 周内	无人机低空遥感监测、实地测量、资料分析

### 2.4.3 无人机低空遥感监测

本项目主要采用无人机对工程现场进行清晰的影像采集,后期通过监测影像的对比分析,了解项目水土流失现状及水土保持措施实施的情况。此法可大大提高监测效率及监测安全性,并可提供良好的全覆盖监测视角,使监测工作更加全面。通过遥感影像解译,获取各分区不同时段扰动范围,为确定工程防治责任范围提供帮助。

### 2.4.4 监测频次

我公司于2025年3月开始开展水土保持监测工作,共计进行4次现场监测。主要采取实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析。现场主要进行扰动面积、水土流失危害、土壤流失量、水土保持措施工程量及防治效果、植被恢复情况监测。

表 2-4 各防治分区监测内容、方法及频次

防治分区	监测频次	监测内容	监测方法
间隔扩建区	共 4 次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况、防护效果情况及后期植被恢复情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
间隔改造区	共 2 次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
塔基区	共 4 次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
牵张场及跨越场区	共 2 次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
施工道路区	共 4 次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析

### 3 重点部位水土流失动态监测

#### 3.1 防治责任范围监测

##### 3.1.1 方案确定的防治责任范围

根据江苏省水利厅批复的水土保持方案报告表,本工程水土流失防治责任范围为 10176m<sup>2</sup>,包括间隔扩建区、间隔改造区、塔基区、牵张场及跨越场区、施工道路区。

表 3-1 水土保持方案确定的防治责任范围 单位: m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地类型				合计
	永久	临时	公共管理与公共服务用地	耕地	园地	其他土地	
间隔扩建区	200	0	200	0	0	0	200
间隔改造区	150	0	150	0	0	0	150
塔基区	1804	4942	0	1827	2575	2344	6746
牵张场及跨越场区	0	2000	0	800	1200	0	2000
施工道路区	0	1080	0	212	380	488	1080
<b>合计</b>	<b>2154</b>	<b>8022</b>	<b>350</b>	<b>2839</b>	<b>4155</b>	<b>2832</b>	<b>10176</b>

##### 3.1.2 监测实际防治责任范围

本工程建设过程中,防治责任范围动态监测主要对工程建设中永久占地和临时占地的面积进行跟踪监测。根据现场实地勘查,结合工程施工图设计及征占地资料查阅,本工程实际扰动面积为 12070m<sup>2</sup>。各分区实际扰动面积详见表 3-2。

表 3-2 实际发生的防治责任范围 单位: m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地类型				合计
	永久	临时	公共管理与公共服务用地	耕地	园地	其他土地	
间隔扩建区	200	0	200	0	0	0	200
间隔改造区	150	0	150	0	0	0	150
塔基区	1995	5113	0	1844	2638	2626	7108
牵张场及跨越场区	0	3300	0	1400	1600	300	3300
施工道路区	0	1312	0	230	540	542	1312
<b>合计</b>	<b>2345</b>	<b>9725</b>	<b>350</b>	<b>3474</b>	<b>4778</b>	<b>3468</b>	<b>12070</b>

注:本工程占用耕地为水浇地,园地为苗圃和果园,其他土地为空闲地和设施农用地,公共管理与公共服务用地为公用设施用地,其中园地进行土地整治后交还土地所有人进行园地恢复。

##### 3.1.3 防治责任范围变化情况

项目水土流失防治责任范围变化情况详见表 3-3。

表 3-3 水土流失防治责任范围变化情况表 单位: m<sup>2</sup>

防治分区	方案设计 (①)			监测结果 (②)			增减情况 (②-①)		
	永久占地	临时占地	防治责任范围	永久占地	临时占地	防治责任范围	永久占地	临时占地	防治责任范围
间隔扩建区	200	0	200	200	0	200	0	0	0
间隔改造区	150	0	150	150	0	150	0	0	0
塔基区	1804	4942	6746	1995	5113	7108	191	171	362
牵张场及跨越场区	0	2000	2000	0	3300	3300	0	1300	1300
施工道路区	0	1080	1080	0	1312	1312	0	232	232
<b>合计</b>	<b>2154</b>	<b>8022</b>	<b>10176</b>	<b>2345</b>	<b>9725</b>	<b>12070</b>	<b>191</b>	<b>1703</b>	<b>1894</b>

建设期水土流失防治责任范围 12070m<sup>2</sup>较水土保持方案设计的 10176m<sup>2</sup>增加了 1894m<sup>2</sup>。间隔扩建区和间隔改造区实际占地面积与方案设计一致。防治责任范围变化原因主要有以下几个方面:

#### (1) 塔基区

在实际施工过程中新建 11 基角钢塔, 与方案设计数量一致。实际施工过程中, 塔基基础及施工场地较方案设计进行了优化调整, 通过统计, 塔基区实际防治责任范围面积 7108m<sup>2</sup>, 较方案设计 6746m<sup>2</sup>增加 362m<sup>2</sup>。方案设计阶段, 每基角钢塔永久占地面积按 (根开+2m)<sup>2</sup> 计列, 实际施工中, 部分塔基根开进行了调整, 塔基区永久占地面积 1995m<sup>2</sup>, 较方案设计永久占地面积 1804m<sup>2</sup>增加 191m<sup>2</sup>。实际施工时, 施工单位为满足施工器材、土方堆放的要求, 临时占地面积较方案设计增加, 临时占地总面积 5113m<sup>2</sup>, 较方案设计 4942m<sup>2</sup>增加 171m<sup>2</sup>。

#### (2) 牵张场及跨越场区

方案设计阶段, 布设牵张场 2 处, 每处占地面积约为 600m<sup>2</sup>; 跨越场地 4 处, 每处 200m<sup>2</sup>, 均为临时占地。根据询问施工单位以及实地测量, 实际施工过程中本项目共布设牵张场 5 处 (牵引场 3 处、张力场 2 处), 每处牵张场占地面积约 400-600m<sup>2</sup>, 牵张场临时占地面积共 2400m<sup>2</sup>; 实际施工布设跨越场 9 处, 每处跨越场占地面积约 100m<sup>2</sup>, 跨越场临时占地面积共 900m<sup>2</sup>。由于牵张场及跨越场区施工场地数量增加, 因此, 牵张场及跨越场区实际总占地面积 3300m<sup>2</sup>, 较方案设计 2000m<sup>2</sup>增加 1300m<sup>2</sup>。

#### (3) 施工道路区

方案设计阶段, 共设计施工道路长度 270m, 平均宽度约 4m, 根据实地测量并结合遥感影像, 实际共布设施工道路长约 328m, 主要由于部分杆塔进场道路

进行了调整，导致长度增加，因此实际布设施工道路较方案设计有所增加，同时为满足机械化施工要求，施工道路宽度为 4m，故施工道路区面积 1312m<sup>2</sup>，较方案设计 1080m<sup>2</sup> 增加 232m<sup>2</sup>。

### 3.1.4 防治责任范围遥感监测情况







	
<p>间隔扩建区防治责任范围遥感影像</p>	<p>间隔改造区防治责任范围遥感影像</p>
	
<p>牵张场防治责任范围遥感影像</p>	<p>施牵张场防治责任范围遥感影像</p>
	
<p>塔基区 T7 防治责任范围遥感影像</p>	<p>塔基区 T11 防治责任范围遥感影像</p>

图 3-1 防治责任范围遥感监测图

### 3.2 土石方流向情况监测

#### 3.2.1 方案设计弃土弃渣情况

根据已批复的水土保持方案报告表，该工程挖填方总量为 7312m<sup>3</sup>，其中挖方量为 3656m<sup>3</sup>（含表土剥离量 625m<sup>3</sup>，基础土方量 3031m<sup>3</sup>），填方量 3656m<sup>3</sup>（含表土回覆量 625m<sup>3</sup>，基础土方量 3031m<sup>3</sup>），无余方，无借方。项目区土石方平衡情况见表 3-4。

表 3-4 项目区方案设计土石方平衡情况表 单位：m<sup>3</sup>

防治分区	挖方			填方			余方	借方
	表土	基础土方	合计	表土	基础土方	合计		
间隔扩建区	45	150	195	45	150	195	0	0
间隔改造区	30	70	100	30	70	100	0	0
塔基区	550	2811	3361	550	2811	3361	0	0
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0
施工道路区	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	625	3031	3656	625	3031	3656	0	0

#### 3.2.2 土石方流向监测结果

本工程挖填方总量为 4458m<sup>3</sup>，其中挖方量 2229m<sup>3</sup>（含表土剥离量 652m<sup>3</sup>，基础土方量 1577m<sup>3</sup>），填方量 2229m<sup>3</sup>（含表土回覆量 652m<sup>3</sup>，基础土方量 1577m<sup>3</sup>），无余方，无借方。间隔扩建区和间隔改造区由于土方量较小且土建施工时段较短，开挖土方临时堆放于施工范围内，基础施工结束后及时进行回填，线路工程临时堆土均临时堆放在各分区临时占地内，各分区临时堆土均采取了临时苫盖等措施。

项目区土石方平衡监测情况见表 3-5。

表 3-5 项目分区土石方平衡监测结果一览表 单位：m<sup>3</sup>

防治分区	挖方			填方			余方	借方	调入	调出
	表土	基础土方	合计	表土	基础土方	合计				
间隔扩建区	45	140	185	45	140	185	0	0	0	0
间隔改造区	0	66	66	0	66	66	0	0	0	0
塔基区	607	1371	1978	607	1371	1978	0	0	0	0
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施工道路区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	652	1577	2229	652	1577	2229	0	0	0	0

#### 3.2.3 土石方变化情况

实际监测情况与方案设计相比，挖填方总量减少了 2854m<sup>3</sup>，其中挖方量减

少了 1427m<sup>3</sup>，填方量减少了 1427m<sup>3</sup>，无余方，无借方。设计和实际监测结果详细对比情况见表 3-6。

表 3-6 方案设计土石方与实际监测情况对比表 单位: m<sup>3</sup>

分区	方案设计①						监测结果②						增减情况②-①					
	开挖		回填		余方	借方	开挖		回填		余方	借方	开挖		回填		余方	借方
	表土剥离	基础开挖	表土回覆	基础回填			表土剥离	基础开挖	表土回覆	基础回填			表土剥离	基础开挖	表土回覆	基础回填		
间隔扩建区	45	150	45	150	0	0	45	140	45	140	0	0	0	-10	0	-10	0	0
间隔改造区	30	70	30	70			0	66	0	66			-30	-4	-30	-4		
塔基区	550	2811	550	2811	0	0	607	1371	607	1371	0	0	57	-1440	57	-1440	0	0
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施工道路区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小计	<b>625</b>	<b>3031</b>	<b>625</b>	<b>3031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>1577</b>	<b>652</b>	<b>1577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>-1454</b>	<b>27</b>	<b>-1454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
合计	<b>3656</b>		<b>3656</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2229</b>		<b>2229</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1427</b>		<b>-1427</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

各分区土石方变化原因主要是：

#### (1) 间隔扩建区

方案设计阶段间隔扩建区扩建间隔 2 个，实际施工与方案设计一致，场地现状为草皮，施工前对草皮区域进行表土剥离，表土剥离面积与剥离厚度与方案设计一致，表土剥离量  $45\text{m}^3$  与方案设计一致；间隔扩建区需对扩建基础进行开挖，由于开挖深度减少，导致基础开挖土方量减少，实际施工中基础土方开挖量为  $140\text{m}^3$ ，较方案设计减少  $10\text{m}^3$ ，土方变化较小。

基础施工结束后需对开挖区域进行基础回填，经向施工单位复核，由于间隔扩建区土方量较小，开挖土方全部进行回填，因此基础土方回填量为  $140\text{m}^3$ ，较方案设计减少  $10\text{m}^3$ 。

#### (2) 间隔改造区

方案设计阶段间隔改造区改造出现间隔 1 个，实际施工与方案设计一致。现状为碎石压盖，碎石上长有杂草，实际无表土剥离，表土剥离量较方案设计减少  $30\text{m}^3$ ；间隔改造区需对基础进行开挖，由于开挖深度减少，导致基础开挖土方量减少，实际施工中基础土方开挖量为  $66\text{m}^3$ ，较方案设计减少  $4\text{m}^3$ ，土方变化较小。

基础施工结束后需对开挖区域进行基础回填，经向施工单位复核，由于间隔改造区土方量较小，开挖土方全部进行回填，因此基础土方回填量为  $66\text{m}^3$ ，较方案设计减少  $4\text{m}^3$ 。实际无表土剥离，故表土回覆较方案设计减少  $30\text{m}^3$ 。

#### (3) 塔基区

方案设计阶段塔基区对永久占地及开挖区域进行表土剥离，实际施工时塔基数量较方案设计一致，由于塔基永久占地面积增加，因此实际表土剥离量为  $607\text{m}^3$ ，较方案设计  $550\text{m}^3$  增加  $57\text{m}^3$ ；由于实际施工过程中，采取柔性开挖基础塔基 1 基，较方案设计柔性开挖基础 5 基减少 4 基，基础土方开挖量减少，因此实际施工中基础土方开挖量为  $1371\text{m}^3$ ，较方案设计  $2811\text{m}^3$  减少了  $1440\text{m}^3$ ，因此，塔基区整体土方开挖量较方案设计阶段减少  $1383\text{m}^3$ 。

实际施工结束后，开挖的表土和基础土方需进行回填，因此表土回覆量较方案增加  $57\text{m}^3$ ；基础回填量较方案设计减少  $1440\text{m}^3$ 。塔基区整体土方回填量较方案设计阶段减少  $1383\text{m}^3$ 。

### **3.3 取土（石、料）监测**

本项目回填所需土方均来自项目本身的开挖土方，不设置专门的取土场。

### **3.4 弃土（石、料）监测**

本项目实际监测过程中未产生弃方，因此不设置专门的弃土场。

## 4 水土流失防治措施监测结果

### 4.1 工程措施监测结果

#### 4.1.1 工程措施设计情况

根据《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持方案报告表》，项目各分区工程措施设计情况见表 4-1。

表 4-1 水土保持工程措施方案设计情况统计表

防治分区	措施内容	单位	方案设计情况
间隔扩建区	表土剥离	m <sup>3</sup>	45
	土地整治	m <sup>2</sup>	150
间隔改造区	表土剥离	m <sup>3</sup>	30
	土地整治	m <sup>2</sup>	100
塔基区	表土剥离	m <sup>3</sup>	550
	土地整治	m <sup>2</sup>	6547
牵张场及跨越场区	土地整治	m <sup>2</sup>	2000
施工道路区	土地整治	m <sup>2</sup>	1080

#### 4.1.2 工程措施实施情况

根据施工组织设计资料及现场调查监测分析，本工程水土保持工程措施实施情况见表 4-2。

表 4-2 水土保持工程措施实施情况监测结果

防治分区	措施内容	单位	实际实施情况
间隔扩建区	表土剥离	m <sup>3</sup>	45
	土地整治	m <sup>2</sup>	150
间隔改造区	碎石压盖	m <sup>2</sup>	100
塔基区	表土剥离	m <sup>3</sup>	607
	土地整治	m <sup>2</sup>	5852
牵张场及跨越场区	土地整治	m <sup>2</sup>	3300
施工道路区	土地整治	m <sup>2</sup>	1312

#### 4.1.3 监测结果及变化原因分析

##### 4.1.3.1 监测结果

经现场勘查，建设单位对本工程各分区实施了相关水土保持工程措施，具体实施变化情况表 4-3，相关工程措施实施情况见图 4-1。

表 4-3 水土保持工程措施实施变化情况

防治分区	措施内容	单位	方案设计	实际实施	增减情况	实施位置	实施时间
间隔扩建区	表土剥离	m <sup>3</sup>	45	45	0	基础施工区域	2025.4
	土地整治	m <sup>2</sup>	150	150	0	除硬化区域	2025.11
间隔改造区	表土剥离	m <sup>3</sup>	30	0	-30	/	/
	土地整治	m <sup>2</sup>	100	0	-100	/	/
	碎石压盖	m <sup>2</sup>	0	100	100	裸露区域	2025.12
塔基区	表土剥离	m <sup>3</sup>	550	607	57	塔基区永久占地及开挖区域	2025.4-2025.7
	土地整治	m <sup>2</sup>	6547	5852	-695	硬化、鱼塘外区域	2025.9-2025.12
牵张场及跨越场区	土地整治	m <sup>2</sup>	2000	3300	1300	全区	2025.12
施工道路区	土地整治	m <sup>2</sup>	1080	1312	232	全区	2025.12

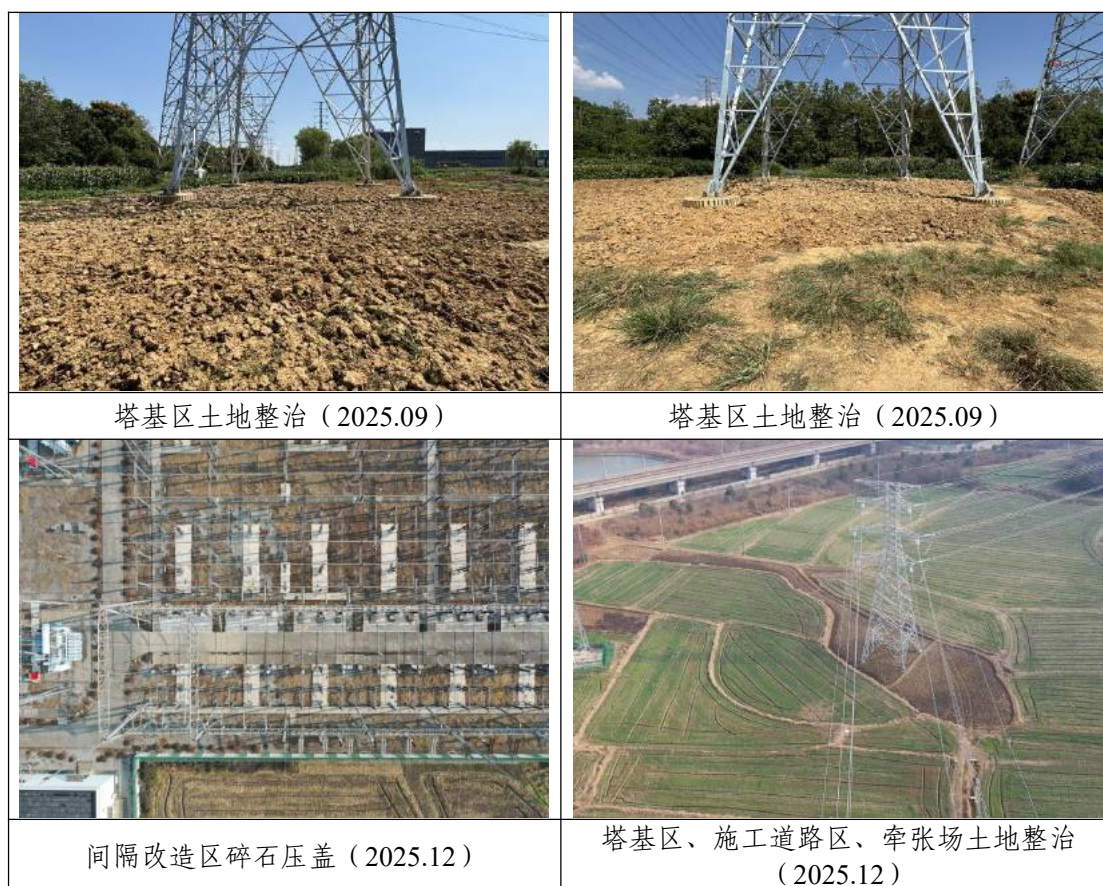


图 4-1 水土保持工程措施实施情况

#### 4.1.3.2 变化原因分析

##### (1) 间隔改造区

方案设计阶段间隔改造区改造出现间隔 1 个，实际施工与方案设计一致。施工前现状为碎石压盖，碎石上长有杂草，实际无表土剥离，表土剥离量较方案设计减少  $30\text{m}^3$ 。施工结束后，场地除了硬化区域，裸露地进行了碎石压盖，故碎石压盖面积较方案设计增加了  $100\text{m}^2$ ，无绿化场地，故无需土地整治，土地整治面积较方案设计减少  $100\text{m}^2$ 。

#### (2) 塔基区

方案设计阶段塔基区对永久占地及开挖区域进行表土剥离，实际施工时塔基数量较方案设计一致，由于塔基永久占地面积增加，因此实际表土剥离量为  $607\text{m}^3$ ，较方案设计  $550\text{m}^3$  增加  $57\text{m}^3$ 。由于部分塔基位置调整，实际施工有 2 基塔基位于鱼塘，较方案设计增加 1 基，施工结束后，恢复鱼塘，故土地整治面积减少，实际土地整治面积  $5852\text{m}^2$  较方案设计减少  $695\text{m}^2$ 。

#### (3) 牵张场及跨越场区

方案设计阶段，布设牵张场 2 处，每处占地面积约为  $600\text{m}^2$ ；跨越场地 4 处，每处  $200\text{m}^2$ ，均为临时占地。根据询问施工单位以及实地测量，实际施工过程中本项目共布设牵张场 5 处（牵引场 3 处、张力场 2 处），牵张场临时占地面积共  $2400\text{m}^2$ ；实际施工布设跨越场 9 处，跨越场临时占地面积共  $900\text{m}^2$ 。由于牵张场及跨越场区施工场地数量增加，因此，牵张场及跨越场区实际总占地面积  $3300\text{m}^2$ ，较方案设计增加  $1300\text{m}^2$ 。施工后期对该区全区进行土地整治措施，因此，牵张场及跨越场区实际土地整治面积  $3300\text{m}^2$  较方案设计增加  $1300\text{m}^2$ 。

#### (4) 施工道路区

方案设计阶段，共设计施工道路长度  $270\text{m}$ ，平均宽度约  $4\text{m}$ ，根据实地测量并结合遥感影像，实际共布设施工道路长约  $328\text{m}$ ，主要由于部分杆塔进场道路进行了调整，导致长度增加，因此实际布设施工道路较方案设计有所增加，同时为满足机械化施工要求，施工道路宽度为  $4\text{m}$ ，故施工道路区面积  $1312\text{m}^2$  较方案设计增加  $232\text{m}^2$ 。施工后期对该区全区进行土地整治措施，故施工道路区实际土地整治面积  $1312\text{m}^2$  较方案设计增加  $232\text{m}^2$ 。

## 4.2 植物措施监测结果

### 4.2.1 植物措施设计情况

根据《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持方案报告表》，

项目各分区植物措施设计情况见表 4-4。

表 4-4 水土保持植物措施方案设计情况统计表

防治分区	措施内容	单位	方案设计情况
间隔扩建区	铺植草皮	m <sup>2</sup>	150
间隔改造区	铺植草皮	m <sup>2</sup>	100
塔基区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	2171
施工道路区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	488

#### 4.2.2 植物措施实施情况

根据查阅施工组织设计资料及现场调查监测分析,工程水土保持植物措施实施情况见表 4-5。

表 4-5 水土保持植物措施实施情况监测结果

防治分区	措施内容	单位	实际实施情况
间隔扩建区	铺植草皮	m <sup>2</sup>	150
塔基区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	2699
牵张场及跨越场区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	290
施工道路区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	532

#### 4.2.3 监测结果及变化原因分析

##### 4.2.3.1 监测结果

经现场勘查,建设单位对本工程各分区实施了相关水土保持植物措施,具体实施情况及实施量见表 4-6,相关植物措施实施情况见图 4-2。

表 4-6 水土保持植物措施实施变化情况

防治分区	措施内容	单位	方案设计	实际实施	增减情况	实施位置	实施时间
间隔扩建区	铺植草皮	m <sup>2</sup>	150	150	0	除硬化外占用的区域	2025.12
间隔改造区	铺植草皮	m <sup>2</sup>	100	0	-100	/	/
塔基区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	2171	2699	528	硬化、复耕、鱼塘以外的裸露地	2025.9-2025.12
牵张场及跨越场区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	0	290	290	除复耕以外的裸露地	2025.12
施工道路区	播撒草籽	m <sup>2</sup>	488	532	44	除复耕以外的裸露地	2025.12

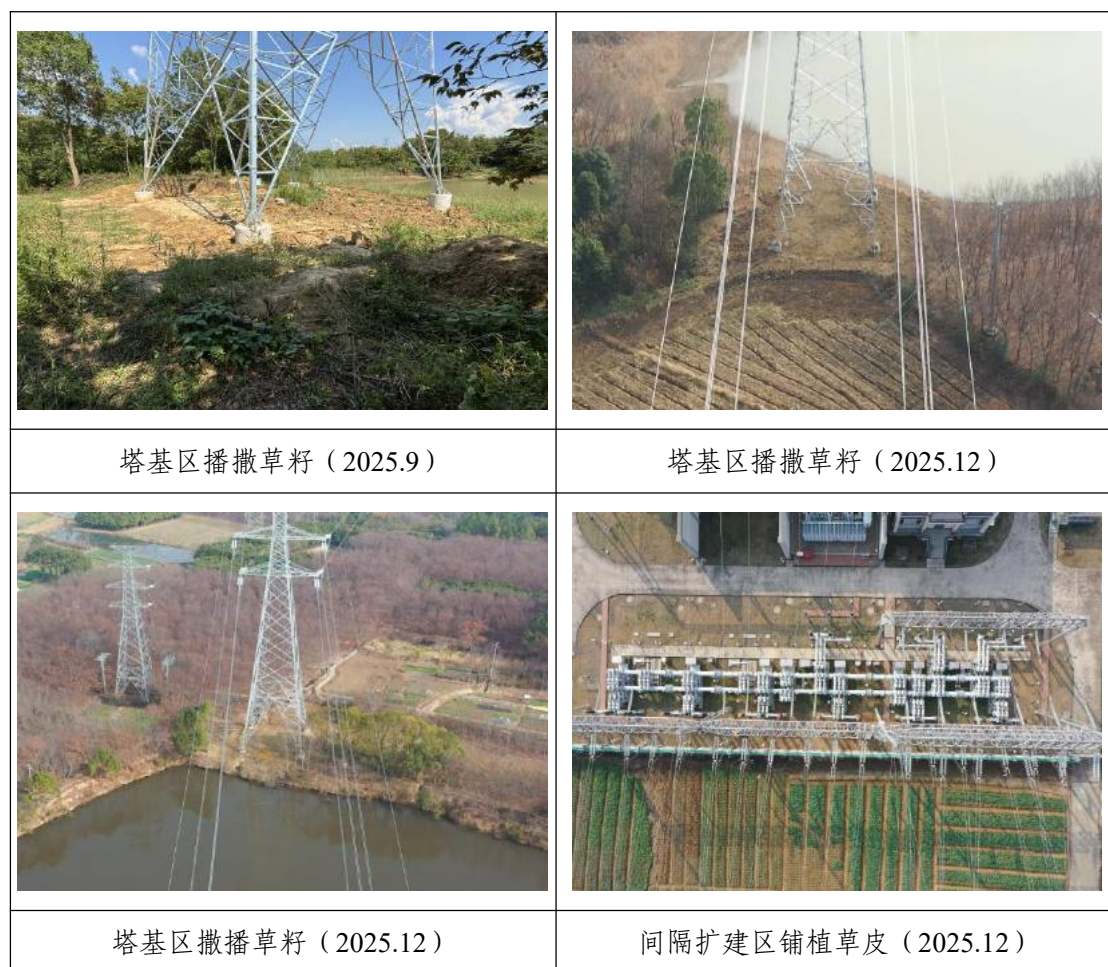


图 4-2 水土保持植物措施实施情况

#### 4.2.3.2 变化原因分析

##### (1) 间隔改造区

方案设计阶段间隔改造区改造出线间隔 1 个, 施工结束后, 场地除了硬化区域, 裸露地进行铺植草皮措施。经实地复核, 施工结束后, 裸露地实施了碎石压盖, 无绿化场地, 故无铺植草皮措施, 较方案设计减少 100m<sup>2</sup>。

##### (2) 塔基区

方案设计阶段, 考虑对塔基区除硬化、复耕、鱼塘以外的裸露地进行播撒草籽。经实地复核, 施工塔基数量与方案设计一致, 由于塔基占地面积较方案设计增加, 同时, 部分园地进行了撒播草籽措施, 所以绿化面积较方案设计增加, 导致塔基区播撒草籽面积 2699m<sup>2</sup> 较方案设计增加了 528m<sup>2</sup>。

##### (3) 牵张场及跨越场区

方案设计阶段, 该区无植物措施设计。经实地复核, 牵张场及跨越场实际占用耕地、园地和其他土地 (空闲地) 区域, 施工结束后对复耕以外的裸露区域进

行播撒草籽,因此牵张场及跨越场区实际播撒草籽面积 290m<sup>2</sup>较方案设计增加了 290m<sup>2</sup>。

#### (4) 施工道路区

方案设计阶段,考虑对施工道路区内占用的空闲地区域采取撒播草籽措施。经实地复核,实际施工阶段由于布设的临时道路面积增加,施工道路区实际占用其他土地(空闲地)面积较方案设计增加,因此施工道路区播撒草籽面积 532m<sup>2</sup>较方案设计增加了 44m<sup>2</sup>。

### 4.3 临时措施监测结果

#### 4.3.1 临时措施设计情况

根据《常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程水土保持方案报告表》,项目各分区临时措施设计情况见表 4-7。

表 4-7 水土保持临时措施方案设计情况统计表

防治分区	措施内容	单位	方案设计情况
间隔扩建区	密目网苫盖	m <sup>2</sup>	150
间隔改造区	密目网苫盖	m <sup>2</sup>	100
塔基区	泥浆沉淀池	座	6
	土质排水沟	m	900
	土质沉沙池	座	10
	密目网苫盖	m <sup>2</sup>	4500
牵张场及跨越场区	铺设钢板	m <sup>2</sup>	1200
	密目网铺垫	m <sup>2</sup>	700
施工道路区	铺设钢板	m <sup>2</sup>	785

#### 4.3.2 临时措施实施情况

根据查阅施工组织设计资料及现场调查监测分析,本工程水土保持临时措施实施情况见表 4-8。

表 4-8 水土保持临时措施实施情况监测结果

防治分区	措施内容	单位	实际实施情况
塔基区	泥浆沉淀池	座	10
	土质排水沟	m	610
	土质沉沙池	座	6
	密目网苫盖	m <sup>2</sup>	4250
牵张场及跨越场区	铺设钢板	m <sup>2</sup>	1400
	密目网铺垫	m <sup>2</sup>	900
施工道路区	铺设钢板	m <sup>2</sup>	820

## 4.3.3 监测结果及变化原因分析

## 4.3.3.1 监测结果

经现场勘查。工程建设过程中，建设单位对本工程各个分区实施了相关水土保持临时措施。具体实施变化情况见表 4-9，相关临时措施实施情况见图 4-3。

表 4-9 水土保持临时措施实施变化情况

防治分区	措施内容	单位	方案设计	实际实施	增减情况	实施位置	实施时间
间隔扩建区	密目网苫盖	m <sup>2</sup>	150	0	-150	/	/
间隔改造区	密目网苫盖	m <sup>2</sup>	100	0	-100	/	/
塔基区	泥浆沉淀池	座	6	10	4	灌注桩基础旁	2025.4-2025.7
	土质排水沟	m	900	610	-290	施工杆塔四周	2025.5-2025.7
	土质沉沙池	座	10	6	-4	施工杆塔四周	2025.5-2025.7
	密目网苫盖	m <sup>2</sup>	4500	4250	-250	堆土及裸露地表	2025.4-2025.12
牵张场及跨越场区	铺设钢板	m <sup>2</sup>	1200	1400	200	机械占压区域	2025.10-2025.12
	密目网铺垫	m <sup>2</sup>	700	900	200	裸露地表	2025.10-2025.12
施工道路区	铺设钢板	m <sup>2</sup>	785	820	35	松软路面区域	2025.4-2025.12



塔基区密目网苫盖 (2025.09)



塔基区密目网苫盖 (2025.09)



施工道路区铺设钢板 (2025.06)



施工道路区铺设钢板 (2025.09)



图 4-3 水土保持临时措施实施情况

#### 4.3.3.2 变化原因分析

##### (1) 间隔扩建区

本次间隔扩建区位于永和 220 千伏变电站预留场地，实际施工中，变电站处于带电运行状态，为了安全考虑，不布设苫盖措施，故实际苫盖面积为 0，较方案设计减少了 150m<sup>2</sup>。

##### (2) 间隔改造区

本次间隔改造区位于淦西 220 千伏变电站内，实际施工中，变电站处于带电运行状态，为了安全考虑，不布设苫盖措施，故实际苫盖面积为 0，较方案设计减少了 100m<sup>2</sup>。

##### (3) 塔基区

实际施工阶段，新建塔基 11 基，其中 10 基采用灌注桩基础，较方案设计灌注桩基础塔基增加 4 基，因此塔基区泥浆沉淀池 10 座较方案设计增加 4 基。

由于实际施工过程中塔基区仅对雨季进行基础施工的杆塔（6 基）布设临时排水沟、沉沙池，因此排水沟实际布设长度为 610m，较方案设计减少了 290m，沉沙池 6 座较方案减少了 4 座。

实际施工阶段，对塔基区临时堆土和裸露地表采取了苫盖措施，由于塔基区基础采取柔性开挖数量较方案设计减少 4 基，导致开挖土方量减少，堆土苫盖面积减少，因此塔基区苫盖面积较方案有所减少，因此密目网苫盖面积较方案减少 250m<sup>2</sup>。

##### (4) 牵张场及跨越场区

方案设计阶段，考虑对张场及跨越场区机械占用区域布设铺设钢板措施，实际施工阶段，由于牵张场及跨越场区面积较方案增加，机械占压区域面积较大，

施工单位对机械占压区域进行了铺设钢板处理，铺设钢板面积较方案设计增加 $200\text{m}^2$ ；其余裸露区域布设密目网铺垫措施，密目网铺垫措施较方案设计增加 $200\text{m}^2$ 。

#### (5) 施工道路区

实际施工阶段，布设临时施工道路长度较方案增加，施工道路区占地面积增加，松软路面较方案增加，故铺设钢板面积较方案设计增加了 $35\text{m}^2$ 。

### 4.4 水土保持措施防治效果

本工程在建设过程中，各区域大多采取了比较适宜的水土保持措施，措施形式多样、数量大、工程质量较高、防治效果较好。

通过对项目建设区现场调查监测分析，各防治区在采取水土保持措施后，水土流失防治效果均比较明显，且土壤侵蚀强度和水土流失面积及水土流失量均随着工程措施的完善和植物措施防治水土流失功能的发挥而逐渐下降。监测结果表明：

工程措施：表土剥离 $652\text{m}^3$ 、土地整治 $10614\text{m}^2$ ，碎石压盖 $100\text{m}^2$ 。各分区水土保持防治的工程措施基本能够满足相关水土保持的要求。水土保持工程措施防治责任基本得到落实。工程措施已按照相应的设计标准进行了施工，符合有关标准要求，能够起到良好的水土保持作用。

植物措施：铺植草皮 $150\text{m}^2$ ，播撒草籽 $3521\text{m}^2$ 。已按照相应的技术标准进行了施工，符合有关标准要求，能够起到良好的水土保持作用，最大限度地发挥林草的涵养水源、保持土壤的功能。

临时防护措施：密目网苫盖 $4250\text{m}^2$ 、密目网铺垫 $900\text{m}^2$ 、土质排水沟 $610\text{m}$ 、土质沉沙池 $6$ 座、泥浆沉淀池 $10$ 座、铺设钢板 $2220\text{m}^2$ 。总体上，各分区水土流失防治的临时措施基本已按照水土保持方案设计进行实施。水土保持临时措施对工程施工过程中的临时堆土防护可大幅减小施工可能产生水土流失影响。本工程在施工阶段按照相应的设计标准进行了施工，符合水土保持临时防护要求，起到了良好的水土保持作用。

## 5 土壤流失情况监测

### 5.1 监测时段划分

常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程监测时段划分为施工期和试运行期。各分区监测时段划分如下：

(1) 间隔扩建区

施工期：2025 年 4 月-2025 年 12 月；

试运行期：2026 年 1 月。

(2) 间隔改造区

施工期：2025 年 11 月-2025 年 12 月；

试运行期：2026 年 1 月。

(3) 塔基区

施工期：2025 年 4 月-2025 年 12 月；

试运行期：2026 年 1 月。

(4) 牵张场及跨越场区

施工期：2025 年 10 月-2025 年 12 月；

试运行期：2026 年 1 月。

(5) 施工道路区

施工期：2025 年 4 月-2025 年 12 月；

试运行期：2026 年 1 月。

在接受国网江苏省电力有限公司常州供电分公司的委托后，我单位于 2025 年第一季度、2025 年第二季度、2025 年第三季度、2026 年第一季度前往常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程进行了现场监测。

### 5.2 水土流失面积

#### 5.2.1 施工建设期水土流失面积

通过现场调查及测量结合查阅施工组织设计资料及施工单位相关现场资料分析，工程施工建设期水土流失总面积为 12070m<sup>2</sup>，其中，间隔扩建区水土流失面积为 200m<sup>2</sup>，间隔改造区水土流失面积为 150m<sup>2</sup>，塔基区水土流失面积为 7108m<sup>2</sup>，牵张场及跨越场区水土流失面积为 3300m<sup>2</sup>，施工道路区水土流失面积为 1312m<sup>2</sup>。

表 5-1 施工期土壤流失面积统计表 单位: m<sup>2</sup>

监测分区	时段	土壤流失面积
间隔扩建区	2025.04-2025.12	200
间隔改造区	2025.11-2025.12	150
塔基区	2025.04-2025.12	7108
牵张场及跨越场区	2025.10-2025.12	3300
施工道路区	2025.04-2025.12	1312
合计		12070

### 5.2.2 试运行期水土流失面积

本阶段主体工程均已完工,通过现场调查及测量,水土流失面积共计 3731m<sup>2</sup>。其中,间隔扩建区水土流失面积为 150m<sup>2</sup>,塔基区水土流失面积为 2739m<sup>2</sup>,牵张场及跨越场区水土流失面积为 300m<sup>2</sup>,施工道路区水土流失面积为 542m<sup>2</sup>。

表 5-2 试运行期土壤流失面积统计表 单位: m<sup>2</sup>

监测分区	时段	土壤流失面积
间隔扩建区	2026.01	150
塔基区	2026.01	2739
牵张场及跨越场区	2026.01	300
施工道路区	2026.01	542
合计		3731

## 5.3 土壤流失量

本工程建设过程中,土壤流失量为 2.31t,其中施工期 2.25t,试运行期 0.06t。施工期因降水量大而集中,项目区开挖土石方经降雨径流流失较多;试运行期因植被恢复较好,土壤流失显著降低。

### 5.3.1 施工期土壤流失量分析

通过调查监测,在结合本次监测时段内的降雨和扰动情况综合分析监测数据合理性的基础上,得出总体监测结果评价及水土流失量。本阶段土壤流失量为 2.25t,其中,间隔扩建区为 0.03t,间隔改造区为 0.003t,塔基区为 1.90t,牵张场及跨越场区为 0.12t,施工道路区为 0.20t。详见表 5-3。

表 5-3 施工期土壤流失量监测表

监测分区	时段	水土流失面积 (m <sup>2</sup> )	时段 (a)	流失量 (t)
间隔扩建区	2025.04-2025.12	200	0.67	0.03
间隔改造区	2025.11-2025.12	150	0.08	0.003
塔基区	2025.04-2025.12	7108	0.67	1.90
牵张场及跨越场区	2025.10-2025.12	3300	0.17	0.12

监测分区	时段	水土流失面积 (m <sup>2</sup> )	时段 (a)	流失量 (t)
施工道路区	2025.04-2025.12	1312	0.67	0.20
合计		<b>12070</b>	/	<b>2.25</b>

### 5.3.2 试运行期土壤流失量分析

通过调查监测,在结合本次监测时段内的降雨和扰动情况综合分析监测数据合理性的基础上,得出总体监测结果评价及水土流失量。本阶段试运行期的土壤流失量为 0.06t。详见表 5-4。

表 5-4 试运行期土壤流失量监测表

监测分区	时段	土壤流失面积 (m <sup>2</sup> )	时段 (a)	流失量 (t)
间隔扩建区	2026.01	150	0.08	0.002
塔基区	2026.01	2739	0.08	0.04
牵张场及跨越场区	2026.01	300	0.08	0.005
施工道路区	2026.01	542	0.08	0.01
合计		<b>3731</b>	/	<b>0.06</b>

### 5.4 取土、弃土弃渣潜在土壤流失量

本工程施工实际挖填方总量为 4458m<sup>3</sup>,其中挖方量 2229m<sup>3</sup>(含表土剥离量 652m<sup>3</sup>,基础土方量 1577m<sup>3</sup>),填方量 2229m<sup>3</sup>(含表土回覆量 652m<sup>3</sup>,基础土方量 1577m<sup>3</sup>),无余方,无借方。无取土、弃土弃渣潜在土壤流失量。

### 5.5 水土流失危害

本工程在施工及试运行期无水土流失危害事件。

## 6 水土流失防治效果监测

### 6.1 水土流失治理度

本工程扰动土地面积 12070m<sup>2</sup>，水土流失面积 12070m<sup>2</sup>，水土流失治理达标面积 12010m<sup>2</sup>。经计算，水土流失治理度约为 99.5%，达到方案要求的 98%的目标值。各防治分区情况详见表 6-1。

表 6-1 各防治分区水土流失治理情况表

防治分区	扰动土地面积 (m <sup>2</sup> )	水土流失面积 (m <sup>2</sup> )	水土流失治理达标面积 (m <sup>2</sup> )				水土流失治理度 (%)	防治标准 (%)	是否达标
			建筑物及场地道路硬化、水域面积	工程措施	植物措施	小计			
间隔扩建区	200	200	50	0	150	200	99.5	98	达标
间隔改造区	150	150	50	100	0	150			
塔基区	7108	7108	1256	3113	2699	7068			
牵张场及跨越场区	3300	3300	0	3000	290	3290			
施工道路区	1312	1312	0	770	532	1302			
<b>合计</b>	<b>12070</b>	<b>12070</b>	<b>1356</b>	<b>6983</b>	<b>3671</b>	<b>12010</b>			

注：治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再计列。

### 6.2 土壤流失控制比

工程区域容许土壤流失量为 500t/(km<sup>2</sup>·a)。根据水土保持监测结果显示，在施工过程中基础施工阶段土壤侵蚀量比较大。但由于工程各个区域在整个工程施工完毕后被建筑物覆盖或者植被覆盖，水土流失量逐渐变小，场地绿化工程等各项水土保持措施水土保持效益日趋显著。工程完工后，整个项目区治理后每平方公里年平均土壤流失量达到 150t/(km<sup>2</sup>·a)，各项水土保持措施较好地发挥了防治作用。土壤流失控制比约为 3.3，达到方案要求的 1.0 的目标值。

### 6.3 渣土防护率

通过调查分析，本工程土方临时堆放时布设了苫盖等临时措施，不设弃渣场。本工程建设临时堆土总量 2229m<sup>3</sup>，实际挡护的临时堆土数量 2213m<sup>3</sup>，渣土防护率约为 99.3%，达到方案要求的 99%的目标值。

## 6.4 表土保护率

根据查阅施工组织设计资料及施工单位相关现场资料分析,通过调查分析,项目区可剥离表土面积 10505m<sup>2</sup>,可剥离表土量为 2674m<sup>3</sup>,其中实际剥离的表土面积为 2415m<sup>2</sup>,剥离表土量 652m<sup>3</sup>,通过铺垫苫盖保护的表土面积为 7096m<sup>2</sup>,表土量为 1916m<sup>3</sup>。在采取保护措施后保护表土数量为 2568m<sup>3</sup>,表土保护率约为 96.0%,达到方案要求的 92%的目标值。

## 6.5 林草植被恢复率

本工程可恢复林草植被面积 3731m<sup>2</sup>,林草类植被面积 3671m<sup>2</sup>。经计算,林草植被恢复率约为 98.4%,达到方案要求的 98%的目标值。各分区情况详见表 6-2。

表 6-2 林草植被恢复率统计表

防治分区	可恢复植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草类植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草植被恢复率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
间隔扩建区	150	150	98.4	98	达标
塔基区	2739	2699			
牵张场及跨越场区	300	290			
施工道路区	542	532			
合计	3731	3671			

## 6.6 林草覆盖率

本工程项目区面积为 12070m<sup>2</sup>,恢复耕地面积 6883m<sup>2</sup>,扣除恢复耕地后面积 5187m<sup>2</sup>,林草类植被面积 3671m<sup>2</sup>,经计算,林草覆盖率约为 70.8% (扣除恢复耕地面积),达到方案要求的 27%的目标值。各分区情况详见表 6-3。

表 6-3 林草覆盖率统计表

防治分区	项目区面积 (m <sup>2</sup> )	恢复耕地面积 (m <sup>2</sup> )	扣除恢复耕地后面积 (m <sup>2</sup> )	林草类植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草覆盖率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
间隔扩建区	200	0	200	150	70.8	27	达标
间隔改造区	150	0	150	0			
塔基区	7108	3113	3995	2699			
牵张场及跨越场区	3300	3000	300	290			
施工道路区	1312	770	542	532			
合计	12070	6883	5187	3671			

综合以上分析，六项水土流失防治目标均已经达到了水土保持方案的要求，对比情况见表 6-4。

表 6-4 防治目标达标情况表

序号	六项指标	方案目标值	实际达到值	是否达标
1	水土流失治理度	98%	99.5%	达标
2	土壤流失控制比	1.0	3.3	达标
3	渣土防护率	99%	99.3%	达标
4	表土保护率	92%	96.0%	达标
5	林草植被恢复率	98%	98.4%	达标
6	林草覆盖率	27%	70.8%	达标

## 7 结论

### 7.1 水土流失动态变化

#### 7.1.1 防治责任范围

监测结果表明，本工程水土流失防治责任范围为 12070m<sup>2</sup>。

#### 7.1.2 土壤流失量

工程实际发生土壤流失总量 2.31t，工程实际土壤流失总量与水土保持方案预测量 11.65t 相比减少了 9.34t。主要因为工程建设过程中水土保持措施布设较为完善，很大程度上避免了水土流失。

#### 7.1.3 水土流失治理达标情况

截止 2026 年 1 月，该项目六项水土流失防治目标均已经达到了水土保持方案的要求。具体情况详见表 7-1。

表 7-1 水土保持防治指标监测结果表

指标名称	设计值	监测结果	评价
水土流失治理度	98%	99.5%	达标
土壤流失控制比	1.0	3.3	达标
渣土防护率	99%	99.3%	达标
表土保护率	92%	96.0%	达标
林草植被恢复率	98%	98.4%	达标
林草覆盖率	27%	70.8%	达标

### 7.2 水土保持措施评价

施工期主要采取临时措施进行防护，有效防治了水土流失；施工结束后，对易产生水土流失区域及时采取防护措施，按方案设计要求采取土地整治等工程措施和播撒草籽等植物措施相结合的方式，起到了较好的水土保持效果，水土流失面积得到全面治理，随着绿化逐渐恢复，各区域未见明显土壤侵蚀，生态环境得到较大的改善。综上，本工程的水土保持措施体系完整，起到了防治水土流失的作用。

### 7.3 存在问题及建议

#### 7.3.1 存在问题

本工程不存在水土保持问题。

### 7.3.2 建议

(1) 建设单位进一步加强水土保持宣传，提高水土流失防治意识。

(2) 建设单位继续严格落实水土保持方案，加强工程运行期隐患巡查，对发现损毁的水土保持设施应予以及时补修，加强植被管护，全面提高水土流失防治效益。

## 7.4 综合结论

监测结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局合理，达到并超过了水土保持方案报告表的要求。施工期因工程建设活动产生了新的水土流失，但通过采取各类水土保持工程措施、植物措施和临时措施，工程建设造成的水土流失得到控制，取得了较好的生态效益。

综上所述，监测结果表明：本工程已完成水土保持方案报告表确定的防治任务，水土保持设施的完好率较高，已初步发挥其水土保持效益。

附件  
1

水土保持监测委托函

# 常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程 水土保持监测任务委托函

江苏核众环境监测技术有限公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）等的要求，我单位拟开展常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程的水土保持监测。

现委托贵公司进行该工程的水土保持监测并出具监测报告，请严格按照有关法律法规及标准规范的要求，结合工程建设实际情况，尽快开展现场监测及水土保持监测报告编制工作。

国网江苏省电力有限公司常州供电公司

2025 年 3 月



附件  
2

水土保持  
方案批复

# 江苏省水利厅行政许可决定书

苏水许可〔2024〕12号

## 省水利厅关于准予常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定

国网江苏省电力有限公司常州供电分公司：

你公司于2024年1月4日以告知承诺制方式申请的常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程水土保持方案行政许可，我厅于2024年1月8日受理（苏水许受〔2024〕6号）。经形式审查，提交的要件材料符合要求，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，决定准予行政许可。

一、该项目以“告知承诺制”方式进行审批，我厅不对项目水土保持方案报告表具体内容进行实质审查。你公司是项目水土流失防治责任主体，按照《水土保持行政许可承诺书》及水土保持方案报告表内容开展水土保持相关工作。如在水土保持工作中未按照规定要求以及承诺书内容履行相关责任和义务，由此导致的所有法律责任由你公司自行承担。

二、项目如发生地点、规模、水土保持措施及弃渣存放

地等重大变更，须报本厅重新审批，其他涉及水土保持方案的变更须报本厅备案。我厅将按照《省政府办公厅关于全面推行证明事项告知承诺制实施方案的通知》（苏政办发〔2020〕84号）要求加强项目事中事后监管，对你公司履行承诺情况进行监督检查。对不实承诺或者未履行承诺的，按规定开展责任追究和信用惩戒。常州市及溧阳市水行政主管部门应加强对辖区内水土保持方案实施情况的跟踪检查。

三、项目完工后你公司应当按照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》开展水土保持设施自主验收，验收结束后将验收材料向我厅报备。未经验收或验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

四、项目建设如涉及其他行政许可事项的，应当依法办理相应审批手续。

五、根据《财政部关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》等相关规定，需在项目开工前向税务机关一次性缴纳水土保持补偿费共计12211元（省级收入）。



抄送：常州市水利局，溧阳市水利局。

# 水土保持行政许可承诺书

编号：

项目名称	常州瓦屋牵引改变接永和变 220 千伏线路工程
建设地点	项目位于江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箦镇以及昆仑街道。永和 220kV 变电站间隔扩建区域中心点坐标为 (N31°31'54.00", E119°17'18.41")；淦西 220kV 变电站间隔改接区域中心点坐标为 (N31°25'54.13", E119°23'1.22")；淦西~瓦屋牵单线 $\pi$ 入永和变 220 千伏线路工程起于瓦屋山牵引站 (N31°31'56.31", E119°18'36.25")，终于永和变 (N31°31'54.00", E119°17'18.41")。
区域评估情况	开发区名称：无 水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间：无
水土保持方案公开情况	公示网站： <a href="http://www.js.sgcc.com.cn/cz/">http://www.js.sgcc.com.cn/cz/</a> 起止时间：2023 年 12 月 06 日至 2023 年 12 月 22 日 公众意见接收和处理情况：无
生产建设单位	名称：国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 统一社会信用代码：91320400834754220H 地址：常州市局前街 27 号 法人代表：王勇 联系电话：13813551360 授权经办人姓名：王一平 联系电话：15906119009 证件类型及号码：320405197308210224

<p>生产建设单位承诺内容</p>	<p>1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。</p> <p>4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。</p> <p>5.积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。</p> <p>7.其他需承诺的事项：</p> <p>法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）： 2023年12月27日</p>
<p>审批部门许可决定</p>	<p>上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。行政许可决定书随后送达。</p> <p>江苏省水利厅 2024年1月4日</p>

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。  
2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。  
3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。  
4.本表一式2份，生产建设单位、水行政主管部门各执1份。

附件  
3

水土保持监测实施方案

常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程

# 水土保持监测实施方案

建设单位：国网江苏省电力有限公司常州供电分公司

监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司

2025 年 3 月

# 目录

<b>1 建设项目及项目区概况</b> .....	<b>1</b>
1.1 项目概况.....	1
1.2 项目区概况.....	1
1.3 水土流失防治布局.....	3
<b>2 水土保持监测布局</b> .....	<b>6</b>
2.1 监测目标与任务.....	6
2.2 监测范围与分区.....	6
2.3 监测重点与布局.....	6
2.4 监测时段与监测频率.....	7
<b>3 监测内容和方法</b> .....	<b>8</b>
3.1 施工准备期.....	8
3.2 工程建设期.....	8
3.3 试运行期.....	8
<b>4 预期成果及形式</b> .....	<b>9</b>
4.1 监测记录表.....	9
4.2 水土保持监测报告.....	9
4.3 附件.....	9
<b>5 监测工作组织与质量保证</b> .....	<b>10</b>
5.1 监测项目组及人员组成.....	10
5.2 监测质量控制体系.....	10

# 1 建设项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程分为点型工程和线型工程，共扩建出线间隔 2 个，改造出线间隔 1 个，新建 220kV 架空线路 2.759km，新建角钢塔 11 基。具体包括：（1）永和 220 千伏变电站扩建工程：本期改造两组户外 220kV GIS 基础及埋件，扩建相应设备支架及基础；扩建场地通信余缆箱及埋管。基础采用钢筋混凝土独立基础，设备支架与基础采用杯口连接。配电装置同前期，采用户外 GIS 设备。本期扩建工程不征地，利用前期工程预留场地扩建。（2）淦西 220 千伏变电站改造工程：本期更名 1 回（原瓦屋牵引站改为永和），无一次设备改造内容，仅对间隔保护进行改造；本期扩建部分通信余缆箱及埋管。（3）淦西～瓦屋牵单线  $\pi$  入永和变 220 千伏线路工程：本期新建瓦屋牵-永和 220kV 架空线路 2.759km（双回架空线路 2.585km，单回架空线路 0.174km），共新建角钢塔 11 基（双回直线塔 4 基，双回耐张塔 6 基，单回耐张塔 1 基），采用柔性开挖基础、灌注桩基础。

本工程建设单位为国网江苏省电力有限公司常州供电分公司，水土保持方案编制单位为江苏辐环环境科技有限公司，水土保持监测单位为江苏核众环境监测技术有限公司。

根据江苏省水利厅批复的本工程水土保持方案报告表，本工程总占地面积 10176m<sup>2</sup>，其中永久占地 2154m<sup>2</sup>，临时占地 8022m<sup>2</sup>；工程挖填方总量为 7312m<sup>3</sup>，其中挖方量为 3656m<sup>3</sup>（含表土剥离量 625m<sup>3</sup>，基础土方量 3031m<sup>3</sup>），填方量 3656m<sup>3</sup>（含表土回覆量 625m<sup>3</sup>，基础土方量 3031m<sup>3</sup>），无余方，无借方。本工程计划于 2025 年 4 月开工建设，计划于 2025 年 12 月完工。

## 1.2 项目区概况

### （1）地形、地貌

本工程所在地为常州市溧阳市上兴镇、竹箦镇以及昆仑街道。项目区地貌单元属于高沙平原，新建线路沿线主要为农田、果园、空闲地以及养殖塘。沿线地形较平坦，高程起伏较小，沿线高程 14.5m（1985 国家高程，下同）左右，交通便利。

### （2）水文

溧阳市境内主要以南河、中河、北河汇全县山丘之水和高淳、郎溪部分客水，分别经宜溧漕河、北溪河注入西沈，东流入太湖。其中：南河，主要汇县境南部和西南部以及高淳、郎溪之水，经宜溧漕河、西沈注入太湖；中河，主要汇县境西部之水，经宜兴北溪河东流入太湖；北河，主要汇县境北部之水，经洮湖、渭湖流入太湖。河流最高水位，一般出现在7至9月，最低水位出现在12月至翌年3月。水位变化一般在2.50至5.50m，最大超过6m以上。水位变化大，除山丘区洪暴来水的特性外，在一定程度上还受长江、太湖倒灌或顶托的影响。线路沿线区域地势平坦，本项目跨越大兴河。大兴河位于溧阳市上兴镇的东面，为上兴镇两条县级河道之一，全长10.25km，流向自北向南。

### (3) 气候

常州市溧阳市位于中纬度北亚热带，气候属北亚热带季风气候，由于季风环流的影响，具有明显的季风气候特征，具四季分明、气候湿润、光照充足、雨量充沛、无霜期长的特点。夏季受温暖潮湿的海洋气团控制，天气炎热多雨；冬季受极地大陆气团控制，以寒冷、少雨天气为主。根据溧阳市气象站（1960-2024年）气象资料统计数据，项目区多年气象要素情况如下：

表 1-1 项目区主要气象气候特征

编号	气象要素		数值
1	气温(°C)	累年平均气温	15.2
		累年绝对最高气温极值	38.1
		累年绝对最低气温极值	-13.3
2	降水量(mm)	累年平均降水量	1049.6
		累年最大年降水量	1815.8(1991)
		累年最大月降水量	472.4(1991.07)
		累年最大日降水量	190.1(1972.03)
		累年最大1h降水量	102.9(1990.08)
3	气压(hPa)	累年平均气压	1016.7
4	相对湿度(%)	累年平均相对湿度	80
		累年最小相对湿度	11(1992)
5	风速/风向(m/s)	累年平均风速	2.9
		累年最大风速	18.3(1992.08.06)
		累年主导风向	E
6	雷暴日数(d)	累年平均雷暴日数	28.9
7	积雪深度(cm)	累年最大积雪深度	28(1984.01.19)

### (4) 地质、地震

根据搜集的资料，沿线在勘探深度范围内，地基土主要由第四系全新统冲积成因的粉质黏土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土夹粉土、粉质黏土混碎石、以及侏罗系上侏罗统的砂岩组成。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A“我国主要城镇抗震设防烈度、基本设计地震加速度和设计地震分组”规定，沿线地区抗震设防烈度均为 7 度，设计基本地震加速度均为 0.10g，设计地震分组为第一组。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），设计特征周期值 0.35s。

### （5）土壤植被

常州市土壤类型多样，主要有水稻土、黄棕壤、红壤、水稻土、潮土、石灰土、黄褐土等。北部沿江地区以长江冲积物为主，中部低洼地区以湖相冲积沉积物为主，南部丘陵区以残积、坡积和洪积物为主。项目区主要土壤类型为水稻土、黄棕壤土。

常州市地带性植被为北亚热带常绿落叶阔叶混交林。植被资源多分布在丘陵山区，如茅山山脉、南山-天目山山脉及太湖椒山岛等地，湖荡地区有部分自然植被，平原地区均为人工植被。从植被类型看，乔木、灌木和草丛多分布于丘陵山区，沼泽植被分布于江湖沿岸、低洼湿地，水生植被分布于湖泊、溪沟及池塘。项目区林草覆盖率为 25%，项目区植被主要为园地和农作物。

## 1.3 水土流失防治布局

### 1.3.1 水土流失防治责任范围

根据江苏省水利厅的批复文件，本工程水土流失防治责任范围为 10176m<sup>2</sup>，其中永久占地面积 2154m<sup>2</sup>，临时占地面积 8022m<sup>2</sup>。

各防治分区及相应面积见表 1-2 所示。

表 1-2 水土流失防治责任范围汇总表 单位：m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地类型				合计
	永久	临时	公共管理与公共服务用地	耕地	园地	其他土地	
间隔扩建区	200	0	200	0	0	0	200
间隔改造区	150	0	150	0	0	0	150
塔基区	1804	4942	0	1827	2575	2344	6746
牵张场及跨越场区	0	2000	0	800	1200	0	2000
施工道路区	0	1080	0	212	380	488	1080
<b>合计</b>	<b>2154</b>	<b>8022</b>	<b>350</b>	<b>2839</b>	<b>4155</b>	<b>2832</b>	<b>10176</b>

### 1.3.2 水土保持措施布局

根据江苏省水利厅批复的水土保持方案，本工程水土保持措施措施如下表：

表 1-3 水土流失分区防治措施总体布局表

分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
间隔扩建区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	铺植草皮	/
	临时措施	/	密目网苫盖
间隔改造区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	铺植草皮	/
	临时措施	/	密目网苫盖
塔基区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/
	临时措施	泥浆沉淀池	土质排水沟、土质沉沙池、密目网苫盖
牵张场及跨越场区	工程措施	/	土地整治
	临时措施	铺设钢板	密目网铺垫
施工道路区	工程措施	/	土地整治
	植物措施	/	撒播草籽
	临时措施	铺设钢板	/

### 1.3.3 水土流失重点区域和重点阶段

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀。根据现场踏勘调查情况以及输变电项目的建设特征，本工程水土流失重点区域是塔基区，施工期是工程建设过程中产生水土流失最为严重的时期。

### 1.3.4 水土流失防治目标

本工程水土流失防治目标最终修正值见表 1-4。

表 1-4 水土流失防治目标值

防治指标	目标值
水土流失治理度 (%)	98
土壤流失控制比	1.0
渣土防护率 (%)	99
表土保护率 (%)	92
林草植被恢复率 (%)	98
林草覆盖率 (%)	27

### 1.3.5 水土保持监测进度安排

2025 年 3 月，监测项目组接收到本项目水土保持监测技术服务委托，随后监测项目组立即着手搜集工程相关资料，并制定监测计划。本项目水土保持监测实施进度安排如下：

(1) 2025 年 3 月，监测准备阶段：

- ①编制监测实施方案；
- ②组建监测项目组；

(2) 2025 年 4 月~2026 年 12 月，监测实施阶段：

- ①监测人员进场
- ②全面开展监测，重点对扰动土地情况、水土流失及水土保持措施布设等情况进行监测；
- ③向建设单位提出水土保持监测意见；

(3) 2026 年 12 月，监测总结阶段：

- ①汇总、分析各阶段监测数据成果；
- ②分析评价防治效果；
- ③编制与报送水土保持监测总结报告。

### 1.3.6 监测准备期现场调查评价

通过现场调查，结合遥感影像等资料，对本项目地形地貌、土壤植被、土地利用、水土流失现状、水土保持设施等情况进行了调查，结果统计如下表所示。

表 1-4 施工准备期各分区调查情况统计

分区内容	间隔扩建区	间隔改造区	塔基区	牵张场及跨越场区	施工道路区
地形地貌	平原	平原	平原	平原	平原
土壤植被	/	/	水稻土,狗尾根 草等灌草植物	水稻土,狗尾根 草等灌草植物	水稻土,狗尾根 草等灌草植物
土地利用现状	公共管理与公共 服务用地	公共管理与公共 服务用地	耕地、园地、其 他土地	耕地、园地、其 他土地	耕地、园地、其 他土地
水土流失现状	微度,几无水土 流失	微度,几无水土 流失	微度,几无水土 流失	微度,几无水土 流失	微度,几无水土 流失
水土保持设施	无	无	无	无	无

## 2 水土保持监测布局

### 2.1 监测目标与任务

#### 2.1.1 监测目标

通过开展水土保持监测工作,及时掌握生产建设阶段和运行初期的水土流失情况,了解各项水土保持措施的防治效果。通过监测来监督和指导水土保持方案的实施,并对需补充水土保持措施的制定相应的补充治理方案,使水土流失得到控制。

#### 2.1.2 监测任务

本项目开展水土保持监测的主要任务是:

- (1) 及时、准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果。
- (2) 掌握项目水土保持措施工程量。
- (3) 提出水土保持建议,督促落实水土保持方案。

### 2.2 监测范围与分区

#### 2.2.1 监测范围

根据江苏省水利厅的批复,本工程水土保持监测范围为方案确定的水土流失防治责任范围 10176m<sup>2</sup>。

#### 2.2.2 监测分区

根据批复的水土保持方案中水土流失防治分区,结合本工程实际,本项目水土保持监测分区划分间隔扩建区、间隔改造区、塔基区、牵张场及跨越场区、施工道路区 5 个监测分区。

### 2.3 监测重点与布局

#### 2.3.1 监测重点

水土保持监测的重点包括:水土保持方案落实情况,扰动土地及植被占压情况,水土保持措施(含临时防护措施)实施状况,水土保持责任制度落实情况等。根据水土保持方案中水土流失预测结果以及现场踏勘情况综合分析,水土流失重点监测区域为塔基区,水土流失重点阶段为施工期。

#### 2.3.2 监测布局

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的规定,结合本工程水土保持方案的设计,针对本项目区工程特点、施工布置、水土流失的特

点和水土保持措施布局特征，遵循代表性、方便性、少受干扰的原则，对于扰动范围、水土流失和措施布设情况基本每季度监测一次。

表 2-1 水土保持监测点位表

序号	监测分区	监测方法	监测点性质	监测内容
1	间隔扩建区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测间隔扩建区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况、防护效果情况及后期植被恢复情况
2	间隔改造区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测间隔扩建区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果情况
3	塔基区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测塔基区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况
4	牵张场及跨越场区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测牵张场及跨越场区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况
5	施工道路区	实地测量、资料分析、无人机低空遥感监测	巡查监测	监测施工道路区施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况

## 2.4 监测时段与监测频率

### 2.4.1 监测时段

本工程水土保持监测从委托监测当月（2025年3月）开始，至设计水平年（2026年12月）结束。

设计水平年的下半年进行6项水土流失防治目标达到情况监测，并进行资料整编和编写水土保持验收所需的水土保持监测总结报告。

### 2.4.2 监测频率

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），监测频次按以下确定：

水土保持措施、扰动地表面积、土壤流失量、水土保持工程措施、临时措施等每季度监测记录一次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录一次；遇暴雨（24h降雨量 $\geq 50\text{mm}$ ）、大风等情况应及时加测；水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

## 3 监测内容和方法

### 3.1 施工准备期

施工准备期的监测目的是掌握项目建设前生态环境本底状况，主要监测内容包括防治责任范围内的地形地貌、地面组成物质、水文气象、土壤植被、土地利用现状、水土流失状况等基本信息。监测组于 2025 年 3 月进场，进行调查监测。

### 3.2 工程建设期

施工期水土保持监测主要包括扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失情况、水土流失隐患与危害、水土保持措施等内容。

扰动土地情况包括地表扰动的方式、范围、面积、扰动强度等；取土（石、料）弃土（石、渣）情况包括取土（石、料）场、弃土（石、渣）场的位置、方量；水土流失情况包括水土流失形式、土壤流失量等；水土流失隐患与危害情况包括项目区发生的滑坡、崩塌等灾害情况以及对工程安全和下游的影响；水土保持措施情况包括项目区各项工程措施、植被措施、临时措施的数量和质量。

### 3.3 试运行期

试运行期水土保持监测主要包括水土保持措施运行状况及防护效果监测，水土流失六项防治指标达标情况评价两部分内容。

#### （1）水土保持措施运行状况及防护效果监测

主要包括水土流失防治措施的数量和质量：林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖率；防护工程的稳定性、完好程度和运行情况；各项防治措施的拦渣保土效果。

#### （2）水土流失六项防治目标监测

根据试运行期工程建设损坏水土保持设施面积、扰动地表面积、工程防治责任范围面积、工程建设区面积、水土流失防治措施的防治面积、防治责任范围内可绿化面积、已采取的植物措施面积等各项水土保持监测结果，计算本项目的水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率等 6 项防治目标的达到值。

## 4 预期成果及形式

### 4.1 监测记录表

包括原始监测数据记录表等。

### 4.2 水土保持监测报告

水土保持监测报告包括监测季度报告表、监测总结报告。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）的要求：每个季度的第一个月前编制完成上一季度的水土保持监测季度报告；监测工作结束后编制完成水土保持监测总结报告。

### 4.3 附件

包括图件、影像资料以及监测相关文件资料等。

## 5 监测工作组织与质量保证

### 5.1 监测项目组及人员组成

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等标准的要求，水土保持监测单位应设立监测项目组。监测项目组的主要职责是：负责监测项目的组织、协调和实施；负责监测进度、质量、设备配置和项目管理；负责与施工单位日常联络，收集主体工程进度、施工报表等资料；负责日常监测数据采集，做好原始记录；负责监测资料汇总、复核、成果编制与报送；开展施工现场突发性水土流失事件应急监测。

为保障监测工作高质量、高效率完成，我公司组织了一支专业知识强、业务水平熟练、监测设备齐全、监测经验丰富的水土保持队伍，成立了水土保持监测项目组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工。同时加强与建设单位、施工单位以及地方水行政主管部门的联系，促进监测工作的顺利进行。为做好该工程水土保持监测，保证监测质量，该工程水土保持监测实施项目负责人负责制，项目组成员分工负责制。该工程水土保持监测项目组设总监测工程师 1 名，监测工程师 1 名，监测员 1 名。监测成员统计如下：

表 5-1 监测项目组成员及分工

职位名称	姓名	职称	职责
总监测工程师	樊虹呈	工程师	项目组负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量
监测工程师	蒋莉	工程师	负责监测数据的汇总、校核和分析
监测员	黄春清	工程师	协助完成监测数据的采集和整理

### 5.2 监测质量控制体系

#### 5.2.1 监测项目管理制度

为了保障监测实施，本公司在人员、设备、资金、车辆等方面将给予监测工作组最大的支持。通过各个方面的保障措施，可使得该项目水土保持监测工作得以顺利的组织实施，也能够更好的对项目进行管理。

我公司将向建设单位报送监测成果，并在水土保持设施竣工验收之前提交水土保持监测总结报告，监测总结报告满足水土保持设施竣工验收要求。

#### 5.2.2 现场监测人员工作制度

水土保持监测必须严格按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》

(GB/T 51240-2018)、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)等标准的要求,监测数据不得弄虚作假,将监测过程中发现的问题及时向业主汇报,并提出处理意见,将施工建设的水土流失危害降到最低。

(1) 监测前需对仪器设备进行检查,确保监测数据准确可靠;

(2) 监测时必须做好原始调查记录(包括调查时间、人员、地点、调查基本数据、照片及存在的主要问题等),并有调查人员、记录人员及校核、审查签字,做到手续完备;

(3) 对每次监测结果进行统计分析,做出综合评价。若发现异常情况,应立即通知建设单位,采取补救措施;

(4) 监测成果报告实行定期上报制,监测单位应按时提交符合要求的季报、重大情况报告,报送建设单位,作为监督检查和验收达标的依据之一。

### 5.2.3 监测项目进度控制

为保证水土保持监测实施进度,顺利完成监测总结报告为验收提供资料,我公司将采取一系列进度控制措施。

(1) 建立项目现场监测计划,及时协调监测组人员进行现场监测,保证监测频率达到规范要求,并根据现场施工情况和暴雨情况及时作出调整。

(2) 加强与建设单位、施工单位的沟通与协调,针对现场发现的问题及时进行反馈,提出整改措施建议。

(3) 现场监测结束后及时对监测数据进行整理和总结,按照要求撰写监测报告。

### 5.2.4 质量保证制度

监测项目组按照批复的水土保持方案报告表和实施方案规定的监测重点、内容、时段和防治目标,每次现场监测工作都需制定具体监测计划,并对每个监测周期的监测结果和防治目标进行量化比较和统计分析。为了保证监测成果质量,本项目实行“全流程管理、分环节控制”的质量控制和保证体系。项目负责人、监测业务主管必须把好质量关,出现问题及时更正,未经修正不得进入下一个作业工序;对不能及时解决的问题,要及时上报,以便研究讨论解决。在完成每一次监测工作时,必须进行自查自验;合格后方可填写监测表格。

监测的全部技术资料和成果,必须通过校核、审核、审定等手续,方可应用于监测工作或作为监测成果。

### 5.2.5 档案管理

本项目水土保持监测成果按照我公司档案管理的要求建立档案,重要成果资料进行归档保存。水土保持监测结束后,编制的水土保持监测总结报告应作为水土保持竣工验收的附件。

附件 4

水土保持监测意见书


# 常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程

## 水土保持监测意见书

项目名称	常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程
建设地点	江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司
监测人员	蒋利 董青
监测时间	2025 年 3 月 28 日
监测意见	2025 年 3 月 28 日,监测小组对常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程现场情况进行了水土保持现场监测。此时,工程正处于施工前期准备阶段,施工单位暂未进场施工。占地类型为公共管理与公共服务用地、耕地、园地及其他土地。
	
塔基场地 (暂未施工)	塔基场地 (暂未施工)



# 常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程

## 水土保持监测意见书

项目名称	常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程
建设地点	江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电公司
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司
监测人员	蒋利 董青
监测时间	2025 年 6 月 24 日
监测意见	2025 年 6 月 24 日, 监测小组对常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程现场情况进行了水土保持现场监测。现阶段正在进行塔基础施工, 现场措施布设较好。
	
施工道路区	塔基础
现阶段正在进行塔基础施工, 现场措施布设较好, 可以有效的防治水土流失。	



# 常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程

## 水土保持监测意见书

项目名称	常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程
建设地点	江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司
监测人员	蒋莉 薛青
监测时间	2025 年 9 月 16 日
监测意见	2025 年 9 月 16 日,监测小组对常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程沿线情况进行了水土保持现场监测。现阶段工程塔基基础已基本完工,正在进行组塔及架线。通过现场监测,场地存在部分裸露场地,建议及时布设密目网苫盖措施。
	
塔基区土地整治	塔基区施工场地
	
塔基区土地整治	塔基区土地整治
现阶段塔基基础已基本完工,正在进行组塔及架线,场地存在部分裸露场地,建议及时布设密目网苫盖措施。	





# 常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程



## 水土保持整改回复情况

项目名称	常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程
建设地点	江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电公司
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司
整改时间	2025 年 9 月 19 日
监测意见	2025 年 9 月 16 日，接到监测单位对常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程现场的监测意见，我公司立即组织人员对工程现场进行整改，对裸露区域补充密目网苫盖。现场整改情况反馈如下：
	

# 常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程

## 水土保持监测意见书

项目名称	常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程
建设地点	江苏省常州市溧阳市上兴镇、竹箐镇以及昆仑街道
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司
监测人员	蒋莉 薛青
监测时间	2026 年 1 月 25 日
监测意见	2026 年 1 月 25 日,监测小组对常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程沿线情况进行了水土保持现场监测。现阶段工程已完工,现场恢复情况良好。具体情况如下。
	
塔基区撒播草籽	塔基区撒播草籽
	
塔基区复耕	塔基区复耕

	
<p>间隔扩建区铺植草皮</p>	<p>间隔改造区碎石压盖</p>
<p>现阶段工程已完工，现场恢复情况良好。</p>	

附件  
5

水土保持监测季度报告

# 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2025年3月

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程				
建设单位联系人及电话	王一平 15906119009	监测项目负责人（签字）：  2025年4月6日	生产建设单位（盖章）  2025年4月9日			
	填表人及电话		黄春清 13770677667			
主体工程进度		本工程计划于 2025 年 4 月开工，于 2025 年 12 月完工，此时，工程正处于施工前期准备阶段，施工单位暂未进场施工。				
指标		设计总量	本季度新增	累计		
扰动地面面积 (m <sup>2</sup> )	合计		10176	0	0	
	间隔扩建区		200	0	0	
	间隔改造区		150	0	0	
	塔基区		6746	0	0	
	牵张场及跨越场区		2000	0	0	
	施工道路区		1080	0	0	
弃土（石、渣）量 (m <sup>3</sup> )	合计量/弃渣场总数		/	/	/	
	弃渣场 1		/	/	/	
	弃渣场 2		/	/	/	
	渣土防护率(%)		99	0	0	
损坏水土保持设施数量 (m <sup>2</sup> )		7337	0	0		
水土保持工程进度	工程措施	间隔扩建区	表土剥离 (m <sup>3</sup> )	45	0	0
			土地整治 (m <sup>2</sup> )	150	0	0
	间隔改造区	表土剥离 (m <sup>3</sup> )	30	0	0	
		土地整治 (m <sup>2</sup> )	100	0	0	
	塔基区	表土剥离 (m <sup>3</sup> )	550	0	0	
		土地整治 (m <sup>2</sup> )	6547	0	0	
	牵张场及跨越场区		土地整治 (m <sup>2</sup> )	2000	0	0
	施工道路区		土地整治 (m <sup>2</sup> )	1080	0	0
	植物措施	间隔扩建区	铺植草皮 (m <sup>2</sup> )	150	0	0
		间隔改造区	铺植草皮 (m <sup>2</sup> )	100	0	0
		塔基区	播撒草籽 (m <sup>2</sup> )	2171	0	0
		施工道路区	播撒草籽 (m <sup>2</sup> )	488	0	0

	临时措施	间隔扩建区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	150	0	0
		间隔改造区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	100	0	0
		塔基区	泥浆沉淀池 (座)	6	0	0
			土质排水沟 (m <sup>3</sup> )	900	0	0
			土质沉沙池 (座)	10	0	0
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	4500	0	0
		牵张场及跨越场区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	1200	0	0
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	700	0	0
		施工道路区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	785	0	0
水土流失影响因子	降雨量(mm)		/	86.1	86.1	
	最大 24 小时降雨(mm)		/	26.9	/	
	极大风速 (m/s)		/	8.2	/	
	平均风速 (m/s)		/	3.8	/	
土壤流失量(t)			/	0	0	
水土流失灾害事件			无			
存在问题与建议		无				
水土保持监测“绿黄红”三色评价		<p>常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程计划于 2025 年 4 月开始施工，现阶段工程正处于施工前期准备阶段，施工单位暂未进场施工，未产生较大的水土流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。</p> 				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程		
监测时段和防治责任范围		2025 年第一季度，0 公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	项目暂未开工
	表土剥离保护	5	5	项目暂未开工，表土剥离尚未实施
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场
水土流失状况		15	15	项目暂未开工
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本工程尚未施工，未实施工程措施
	植物措施	15	15	本工程尚未施工，未实施植物措施
	临时措施	10	10	本工程尚未施工，未实施临时措施
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害
合计		100	100	评价为“绿色”

# 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2025年4月至2025年6月

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程				
建设单位联系人及电话	王一平 15906119009	监测项目负责人（签字）：  2025年7月7日	生产建设单位（盖章）：  2025年7月10日			
	填表人及电话		黄春清 13770677667			
主体工程进度		本工程于2025年4月开工，计划于2025年12月完工，目前项目正在进行塔基基础施工和间隔扩建区施工。				
指标		设计总量	本季度新增	累计		
扰动地面面积（m <sup>2</sup> ）	合计		10176	4700	4700	
	间隔扩建区		200	200	200	
	间隔改造区		150	0	0	
	塔基区		6746	3800	3800	
	牵张场及跨越场区		2000	0	0	
	施工道路区		1080	700	700	
弃土（石、渣）量（m <sup>3</sup> ）	合计量/弃渣场总数		/	/	/	
	弃渣场1		/	/	/	
	弃渣场2		/	/	/	
	渣土防护率(%)		99	>99	>99	
损坏水土保持设施数量（m <sup>2</sup> ）		7337	3600	3600		
水土保持工程进度	工程措施	间隔扩建区	表土剥离（m <sup>3</sup> ）	45	45	45
			土地整治（m <sup>2</sup> ）	150	0	0
	间隔改造区	表土剥离（m <sup>3</sup> ）	30	0	0	
		土地整治（m <sup>2</sup> ）	100	0	0	
	塔基区	表土剥离（m <sup>3</sup> ）	550	486	486	
		土地整治（m <sup>2</sup> ）	6547	0	0	
	牵张场及跨越场区		土地整治（m <sup>2</sup> ）	2000	0	0
	施工道路区		土地整治（m <sup>2</sup> ）	1080	0	0
	植物措施	间隔扩建区	铺植草皮（m <sup>2</sup> ）	150	0	0
		间隔改造区	铺植草皮（m <sup>2</sup> ）	100	0	0
		塔基区	播撒草籽（m <sup>2</sup> ）	2171	0	0
		施工道路区	播撒草籽（m <sup>2</sup> ）	488	0	0


	临时措施	间隔扩建区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	150	0	0
		间隔改造区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	100	0	0
		塔基区	泥浆沉淀池 (座)	6	7	7
			土质排水沟 (m <sup>3</sup> )	900	200	200
			土质沉沙池 (座)	10	2	2
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	4500	1752	1752
		牵张场及跨越场区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	1200	0	0
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	700	0	0
		施工道路区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	785	650	650
水土流失影响因子	降雨量(mm)		/	376.8	376.8	
	最大 24 小时降雨(mm)		/	77.5	/	
	极大风速 (m/s)		/	8.6	/	
	平均风速 (m/s)		/	4.2	/	
土壤流失量(t)			/	0.82	0.82	
水土流失灾害事件			无			
存在问题与建议		无				
水土保持监测“绿黄红”三色评价		<p>常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程于 2025 年 4 月开始施工, 现阶段正在进行塔基基础施工和间隔扩建区施工, 未产生较大的水土流失危害, 水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。</p> 				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程		
监测时段和防治责任范围		2025 年第二季度，0.4700 公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	各区每处施工场地面积扩大未超过 1000m <sup>2</sup>
	表土剥离保护	5	5	已扰动区域表土剥离已实施，且表土剥离保护措施未实施面积未超过 1000m <sup>2</sup>
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场
水土流失状况		15	15	水土流失总量未超过 100m <sup>3</sup>
水土流失防治成效	工程措施	20	20	部分工程措施按施工进度已实施
	植物措施	15	15	本工程施工尚未结束，未实施植物措施
	临时措施	10	6	部分临时措施已实施，现场存在部分裸露地表
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害
合计		100	96	评价为“绿色”

# 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2025年7月至2025年9月

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程				
建设单位联系人及电话	王一平 15906119009	监测项目负责人(签字):  2025年10月10日	生产建设单位(盖章):  2025年10月13日			
	填表人及电话		黄春清 13770677667			
主体工程进度		本工程于2025年4月开工,计划于2025年12月完工,现阶段塔基基础和间隔扩建区基础已基本完工,正在进行组塔及架线。				
指标		设计总量	本季度新增	累计		
扰动地面面积(m <sup>2</sup> )	合计		10176	3920	8620	
	间隔扩建区		200	0	200	
	间隔改造区		150	0	0	
	塔基区		6746	3308	7108	
	牵张场及跨越场区		2000	0	0	
	施工道路区		1080	612	1312	
弃土(石、渣)量(m <sup>3</sup> )	合计量/弃渣场总数		/	/	/	
	弃渣场1		/	/	/	
	弃渣场2		/	/	/	
	渣土防护率(%)		99	>99	>99	
损坏水土保持设施数量(m <sup>2</sup> )		7337	2520	6120		
水土保持工程进度	工程措施	间隔扩建区	表土剥离(m <sup>3</sup> )	45	0	45
			土地整治(m <sup>2</sup> )	150	0	0
	间隔改造区	表土剥离(m <sup>3</sup> )	30	0	0	
		土地整治(m <sup>2</sup> )	100	0	0	
	塔基区	表土剥离(m <sup>3</sup> )	550	121	607	
		土地整治(m <sup>2</sup> )	6547	2341	2341	
	牵张场及跨越场区		土地整治(m <sup>2</sup> )	2000	0	0
	施工道路区		土地整治(m <sup>2</sup> )	1080	0	0
	植物措施	间隔扩建区	铺植草皮(m <sup>2</sup> )	150	0	0
		间隔改造区	铺植草皮(m <sup>2</sup> )	100	0	0
		塔基区	播撒草籽(m <sup>2</sup> )	2171	810	810
		施工道路区	播撒草籽(m <sup>2</sup> )	488	0	0


	临时措施	间隔扩建区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	150	0	0
		间隔改造区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	100	0	0
		塔基区	泥浆沉淀池 (座)	6	3	10
			土质排水沟 (m <sup>3</sup> )	900	410	610
			土质沉沙池 (座)	10	4	6
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	4500	1900	3652
		牵张场及跨越场区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	1200	0	0
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	700	0	0
		施工道路区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	785	170	820
水土流失影响因子	降雨量(mm)		/	419.9	796.7	
	最大 24 小时降雨(mm)		/	90.8	/	
	极大风速 (m/s)		/	8.6	/	
	平均风速 (m/s)		/	4.3	/	
土壤流失量(t)			/	0.94	1.76	
水土流失灾害事件			无			
存在问题与建议		无				
水土保持监测“绿黄红”三色评价		<p>常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程于 2025 年 4 月开始施工，现阶段塔基基础和间隔扩建区基础已基本完工，正在进行组塔及架线，未产生较大的水土流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。</p> 				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程		
监测时段和防治责任范围		2025 年第三季度，0.8620 公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围控制	15	13	塔基区面积扩大 1300m <sup>2</sup> ，超过 1000m <sup>2</sup> ，扣 2 分。其他区面积未超 1000m <sup>2</sup> 。
	表土剥离保护	5	5	已扰动区域表土剥离已实施，且表土剥离保护措施未实施面积未超过 1000m <sup>2</sup>
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场
水土流失状况		15	15	水土流失总量未超过 100m <sup>3</sup>
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	部分工程措施按施工进度已实施
	植物措施	15	15	部分植物措施按施工进度已实施
	临时措施	10	4	部分临时措施已实施，现场存在部分裸露地表
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害
合计		100	92	评价为“绿色”

# 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2026年1月

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程				
建设单位联系人及电话	王一平 15906119009	监测项目负责人（签字）：  2026年2月5日	生产建设单位（盖章）  2026年2月10日			
	填表人及电话		黄春清 13770677667			
主体工程进度		本工程于 2025 年 4 月开工，于 2025 年 12 月完工，现阶段工程已全部完工。				
指标		设计总量	本季度新增	累计		
扰动地面面积 (m <sup>2</sup> )	合计		10176	0	12070	
	间隔扩建区		200	0	200	
	间隔改造区		150	0	150	
	塔基区		6746	0	7108	
	牵张场及跨越场区		2000	0	3300	
	施工道路区		1080	0	1312	
弃土（石、渣）量 (m <sup>3</sup> )	合计量/弃渣场总数		/	/	/	
	弃渣场 1		/	/	/	
	弃渣场 2		/	/	/	
	渣土防护率(%)		99	> 99	> 99	
损坏水土保持设施数量 (m <sup>2</sup> )		7337	0	8596		
水土保持工程进度	工程措施	间隔扩建区	表土剥离 (m <sup>3</sup> )	45	0	45
			土地整治 (m <sup>2</sup> )	150	0	150
	间隔改造区	表土剥离 (m <sup>3</sup> )	30	0	0	
		土地整治 (m <sup>2</sup> )	100	0	0	
		碎石压盖 (m <sup>2</sup> )	0	0	100	
	塔基区	表土剥离 (m <sup>3</sup> )	550	0	607	
		土地整治 (m <sup>2</sup> )	6547	0	5852	
	牵张场及跨越场区		土地整治 (m <sup>2</sup> )	2000	0	3300
	施工道路区		土地整治 (m <sup>2</sup> )	1080	0	1312
	植物措施	间隔扩建区	铺植草皮 (m <sup>2</sup> )	150	0	150
		间隔改造区	铺植草皮 (m <sup>2</sup> )	100	0	0
		塔基区	播撒草籽 (m <sup>2</sup> )	2171	0	2699

		牵张场及跨越场区	播撒草籽 (m <sup>2</sup> )	0	0	290
		施工道路区	播撒草籽 (m <sup>2</sup> )	488	0	532
	临时措施	间隔扩建区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	150	0	0
		间隔改造区	密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	100	0	0
		塔基区	泥浆沉淀池 (座)	6	0	10
			土质排水沟 (m <sup>3</sup> )	900	0	610
			土质沉沙池 (座)	10	0	6
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	4500	0	4250
		牵张场及跨越场区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	1200	0	1400
			密目网苫盖 (m <sup>2</sup> )	700	0	900
施工道路区	铺设钢板 (m <sup>2</sup> )	785	0	820		
水土流失影响因子	降雨量(mm)			/	39.0	910.5
	最大 24 小时降雨(mm)			/	14.7	/
	极大风速 (m/s)			/	6.2	/
	平均风速 (m/s)			/	3.5	/
土壤流失量(t)				/	0.06	2.31
水土流失灾害事件				无		
存在问题与建议		无				
水土保持监测“绿黄红”三色评价		<p>常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程于 2025 年 4 月开始施工，于 2025 年 12 月完工，现阶段工程已全部完工，未产生较大的水土流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。</p> 				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		常州瓦屋牵引变改接永和变 220 千伏线路工程		
监测时段和防治责任范围		2026 年第一季度，1.2070 公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	各区施工场地面积扩大未超过 1000m <sup>2</sup>
	表土剥离保护	5	5	已扰动区域表土剥离已实施，且表土剥离保护措施未实施面积未超过 1000m <sup>2</sup>
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本工程不设弃渣场
水土流失状况		15	15	水土流失总量未超过 100m <sup>3</sup>
水土流失防治成效	工程措施	20	20	工程措施按施工进度已全部实施
	植物措施	15	9	植物措施按施工进度已全部实施，部分植被生长不佳
	临时措施	10	10	临时措施已实施
水土流失危害		5	5	未产生水土流失危害
合计		100	94	评价为“绿色”

附件  
6

水土保持监测影像资料



施工道路区铺设钢板（2025年6月24日）



塔基区临时排水沟（2025年6月24日）



施工道路区铺设钢板（2025年9月16日）



塔基区临时排水沟（2025年9月16日）



塔基区土地整治（2025年9月16日）



塔基区土地整治（2025年9月16日）



塔基区撒播草籽（2025年9月16日）



塔基区密目网苫盖（2025年9月22日）



塔基区密目网苫盖（2025年9月22日）



塔基区、施工道路区、牵张场复耕  
（2026年1月25日）



塔基区撒播草籽（2026年1月25日）



塔基区撒播草籽（2026年1月25日）



塔基区撒播草籽（2026年1月25日）



塔基区复耕（2026年1月25日）



间隔扩建区铺植草皮（2026年1月25日）



间隔改造区碎石压盖（2026年1月25日）


附件  
7

项目区施工前后遥感影像对比图


	
<p>塔基区施工前影像（2024.10）</p>	<p>塔基区施工后影像（2026.01）</p>
	
<p>塔基区施工前影像（2024.10）</p>	<p>塔基区施工后影像（2026.01）</p>
	
<p>间隔改造区施工前影像（2024.10）</p>	<p>间隔改造区施工后影像（2026.01）</p>



附  
图

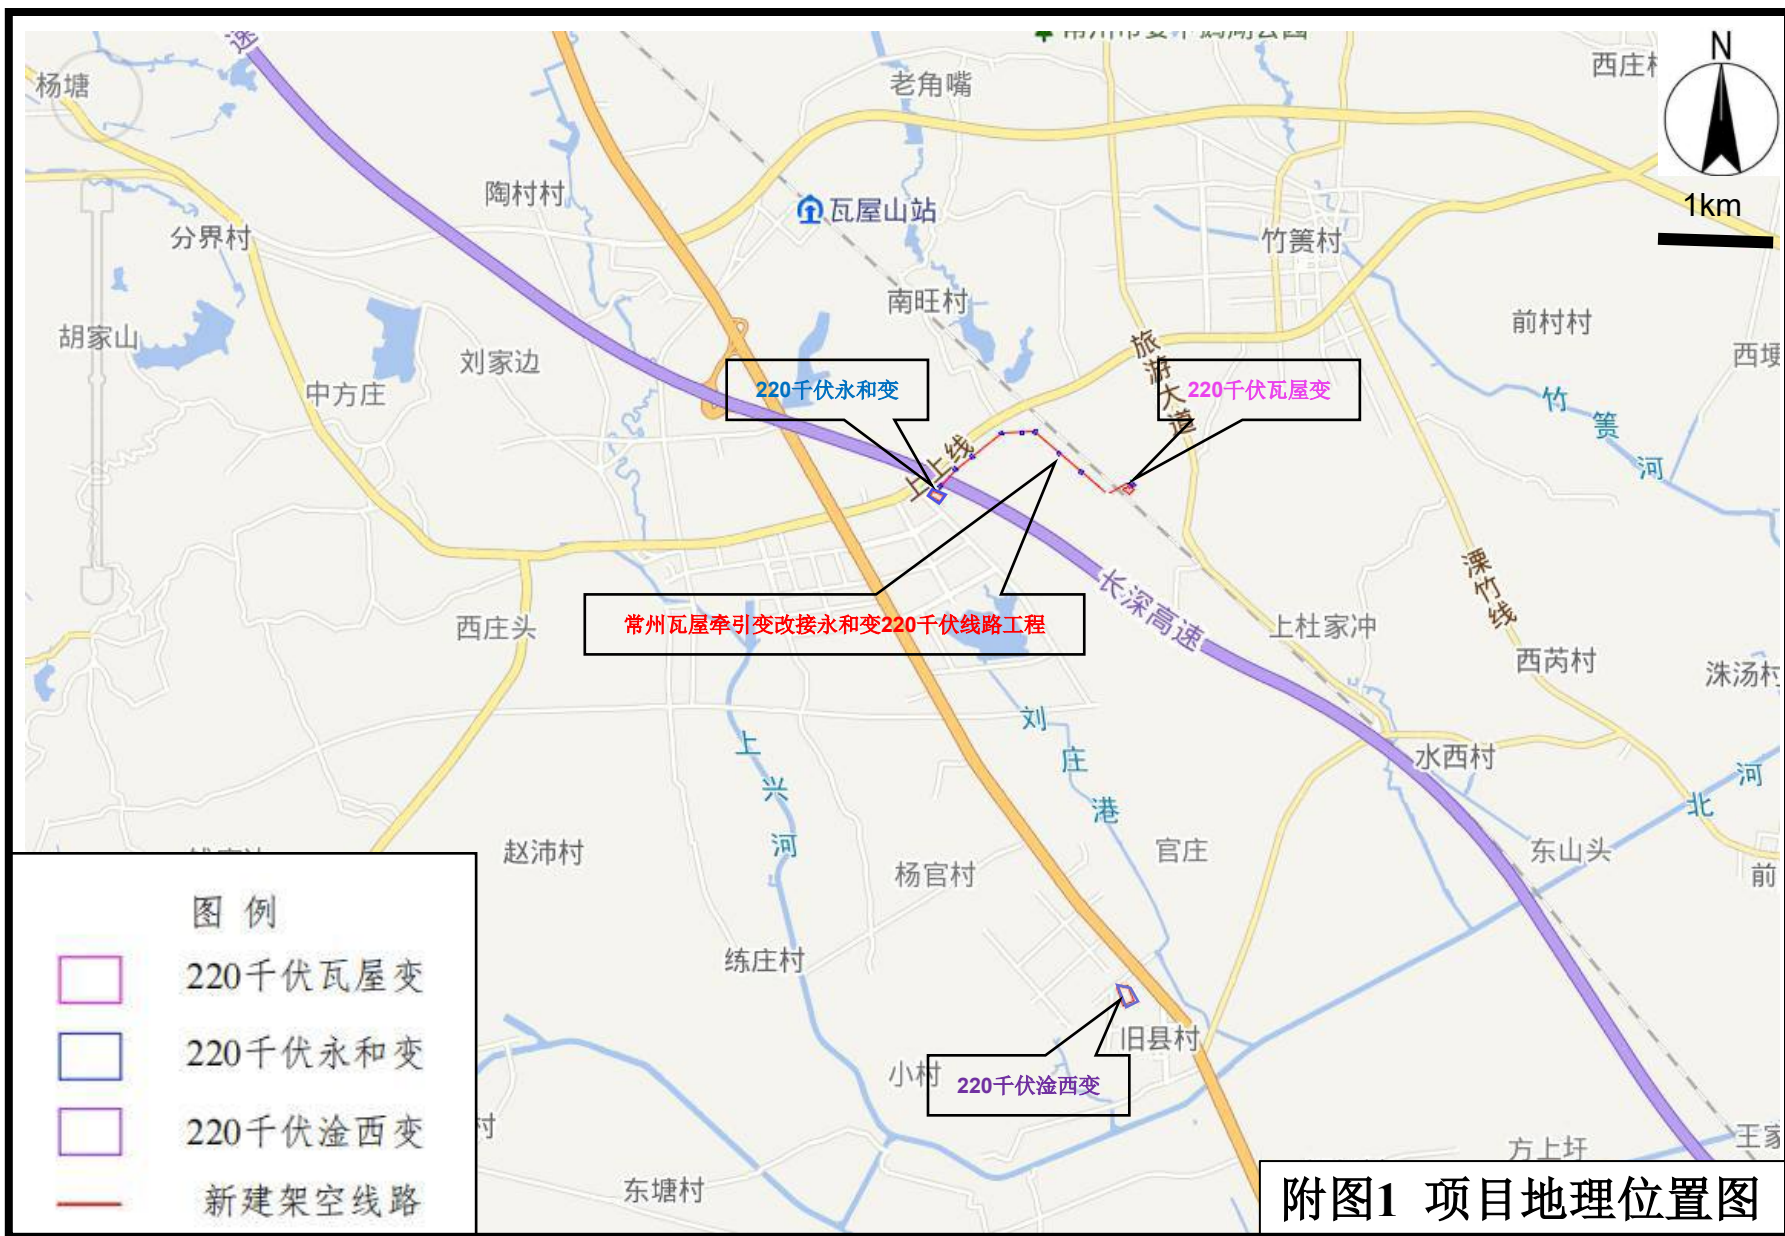

附图1 项目地理位置图

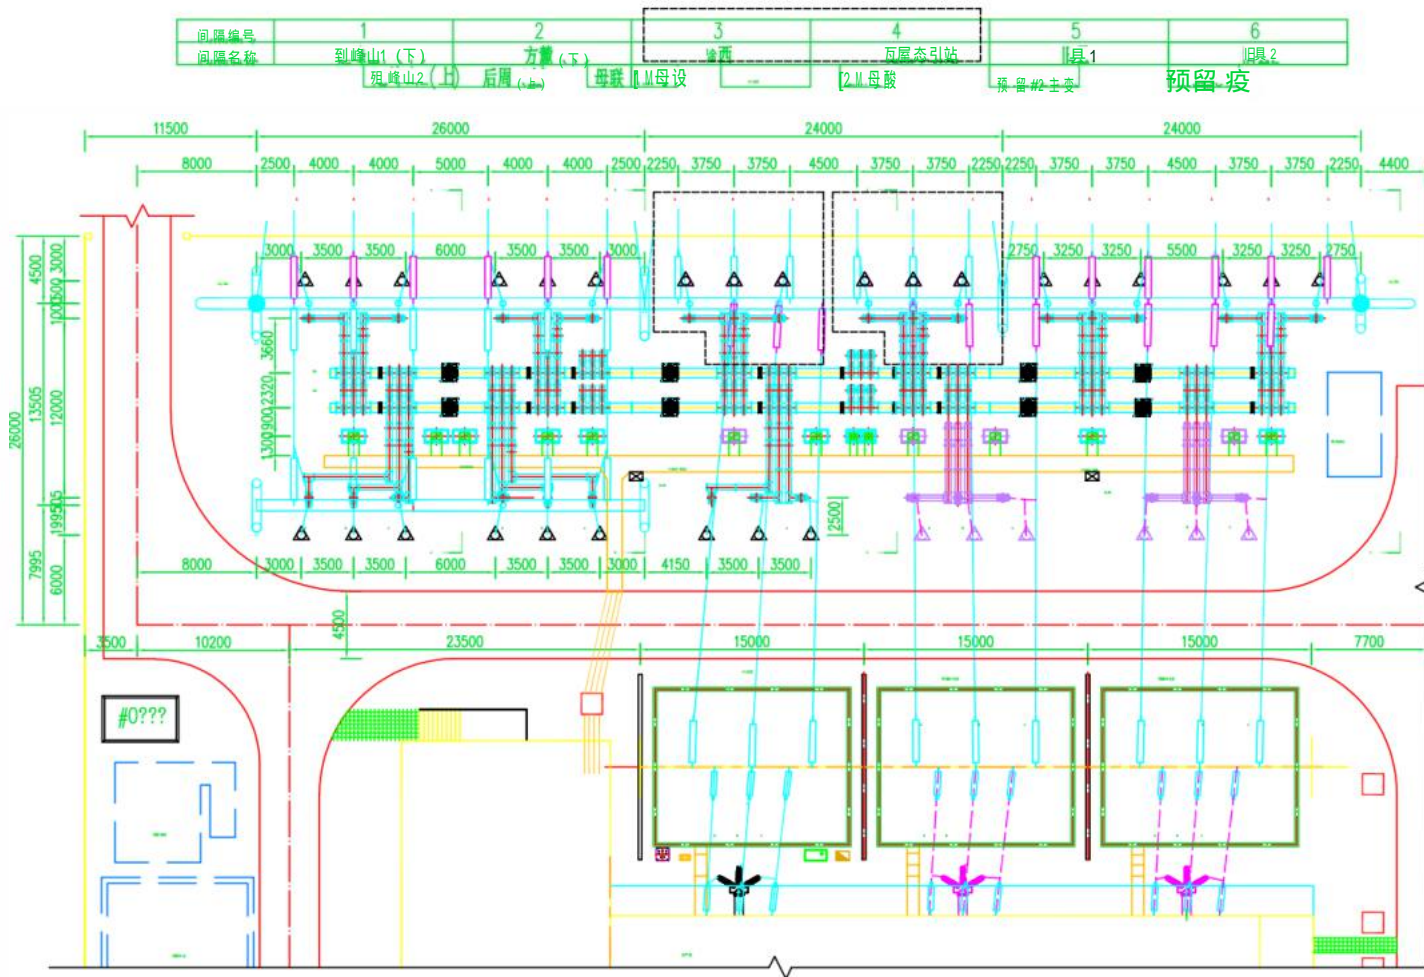

建构筑物一览表

编号	名称	单位	数量	备注
1	正安装、验	m <sup>2</sup>	2759.46	前已建
2	变电站大门	樘	1	前已建
3	围墙	m	3848	前已建
4	主基础及流	樘	1	有 P 引
5	事故油池	樘	1	P
6	雨水原箱	樘	1	已
7	防水上	樘	1	前已建
8	穿管池	樘	1	前已建
10	40m 高立杆	套	2	前已建
11	自所级	m <sup>2</sup>	61.3	数量总表


主要技术经济指标表

编号	指标名称	单位	数量	备注
1	址总用比面积		1.2467	合18.7000亩
(1)	因用地面积		0.8326	合12.4889亩
(2)	五层外3.0m用地面积	hm <sup>2</sup>	0.1190	合1.7850亩
(3)	进站道路用地面积		0.1413	合2.1195亩
14L	边角用地面积		0.1538	合2.3070亩
7	进站道路长度	m	223	前已完成
8	建筑面积	m <sup>2</sup>	2820.76	
9	砖罐量	m <sup>3</sup>	1600	前已建

说明：虚线框内为本期工程内容：本期扩建220kV出线间隔2回（至瓦屋牵引站、涂西变各回）。

永和220kV 变电站间隔扩建工程

附图2 间隔扩建区平面布置图

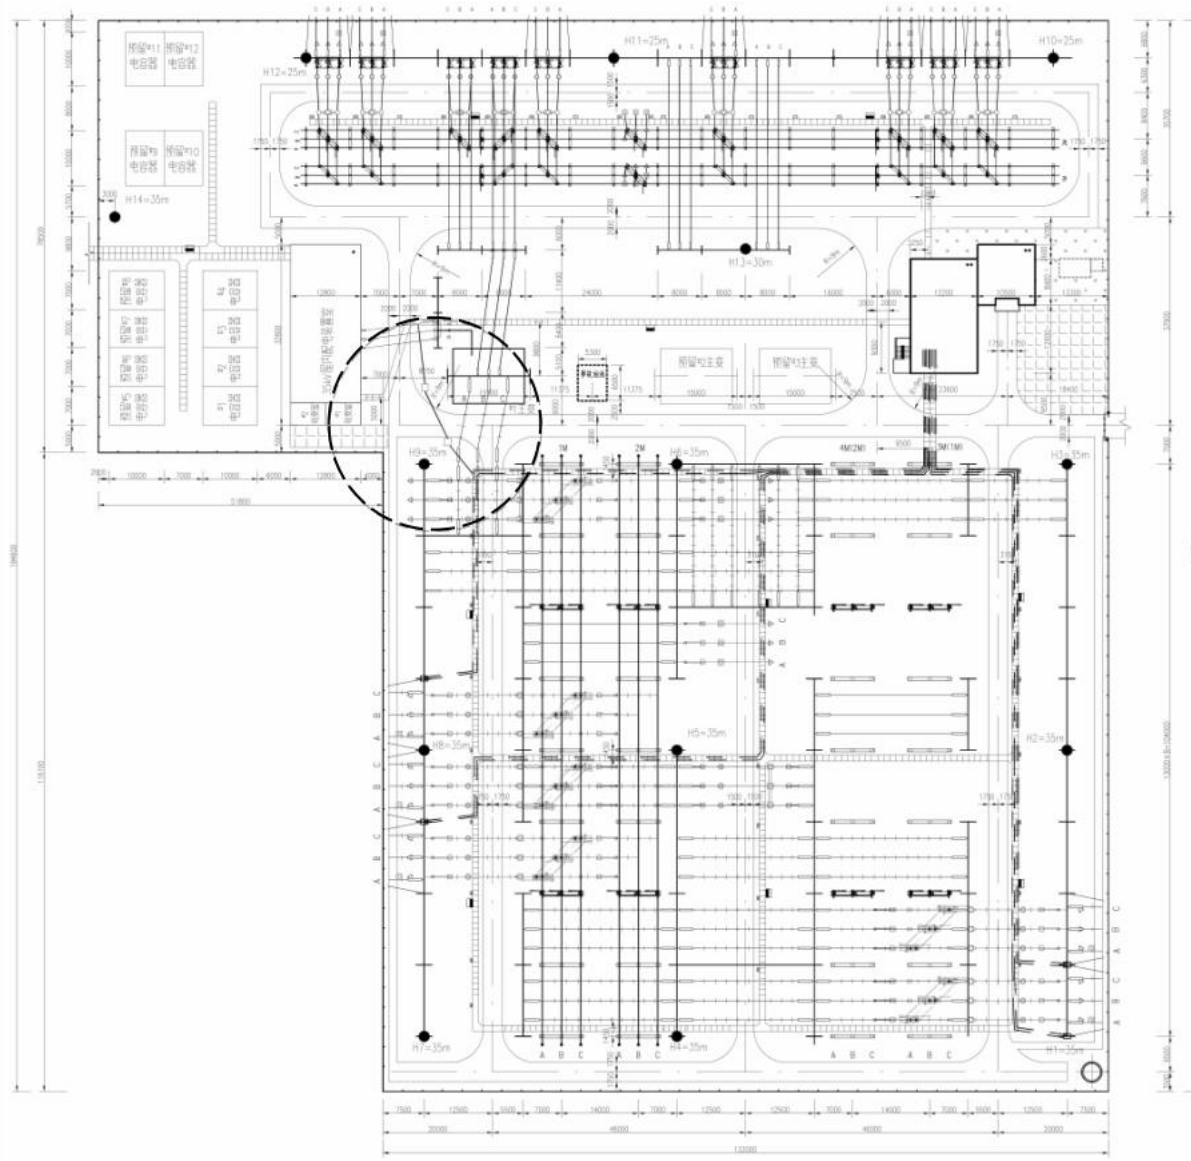

- 联
1. 站内地设计平海拔土 0.000m 相S于1985国家高程系86.30m.
  2. 本图扩建设内容在总图范围内,扩建设水塘由设计单位负责
  3. 本工程结束后,所有房屋拆除工程由设计单位负责
  4. 图中尺寸均以毫米(m)为单位的。

### 淦西220kV变电站间隔改造工程

附图3 间隔改造区平面布置图



1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C

D

E

F

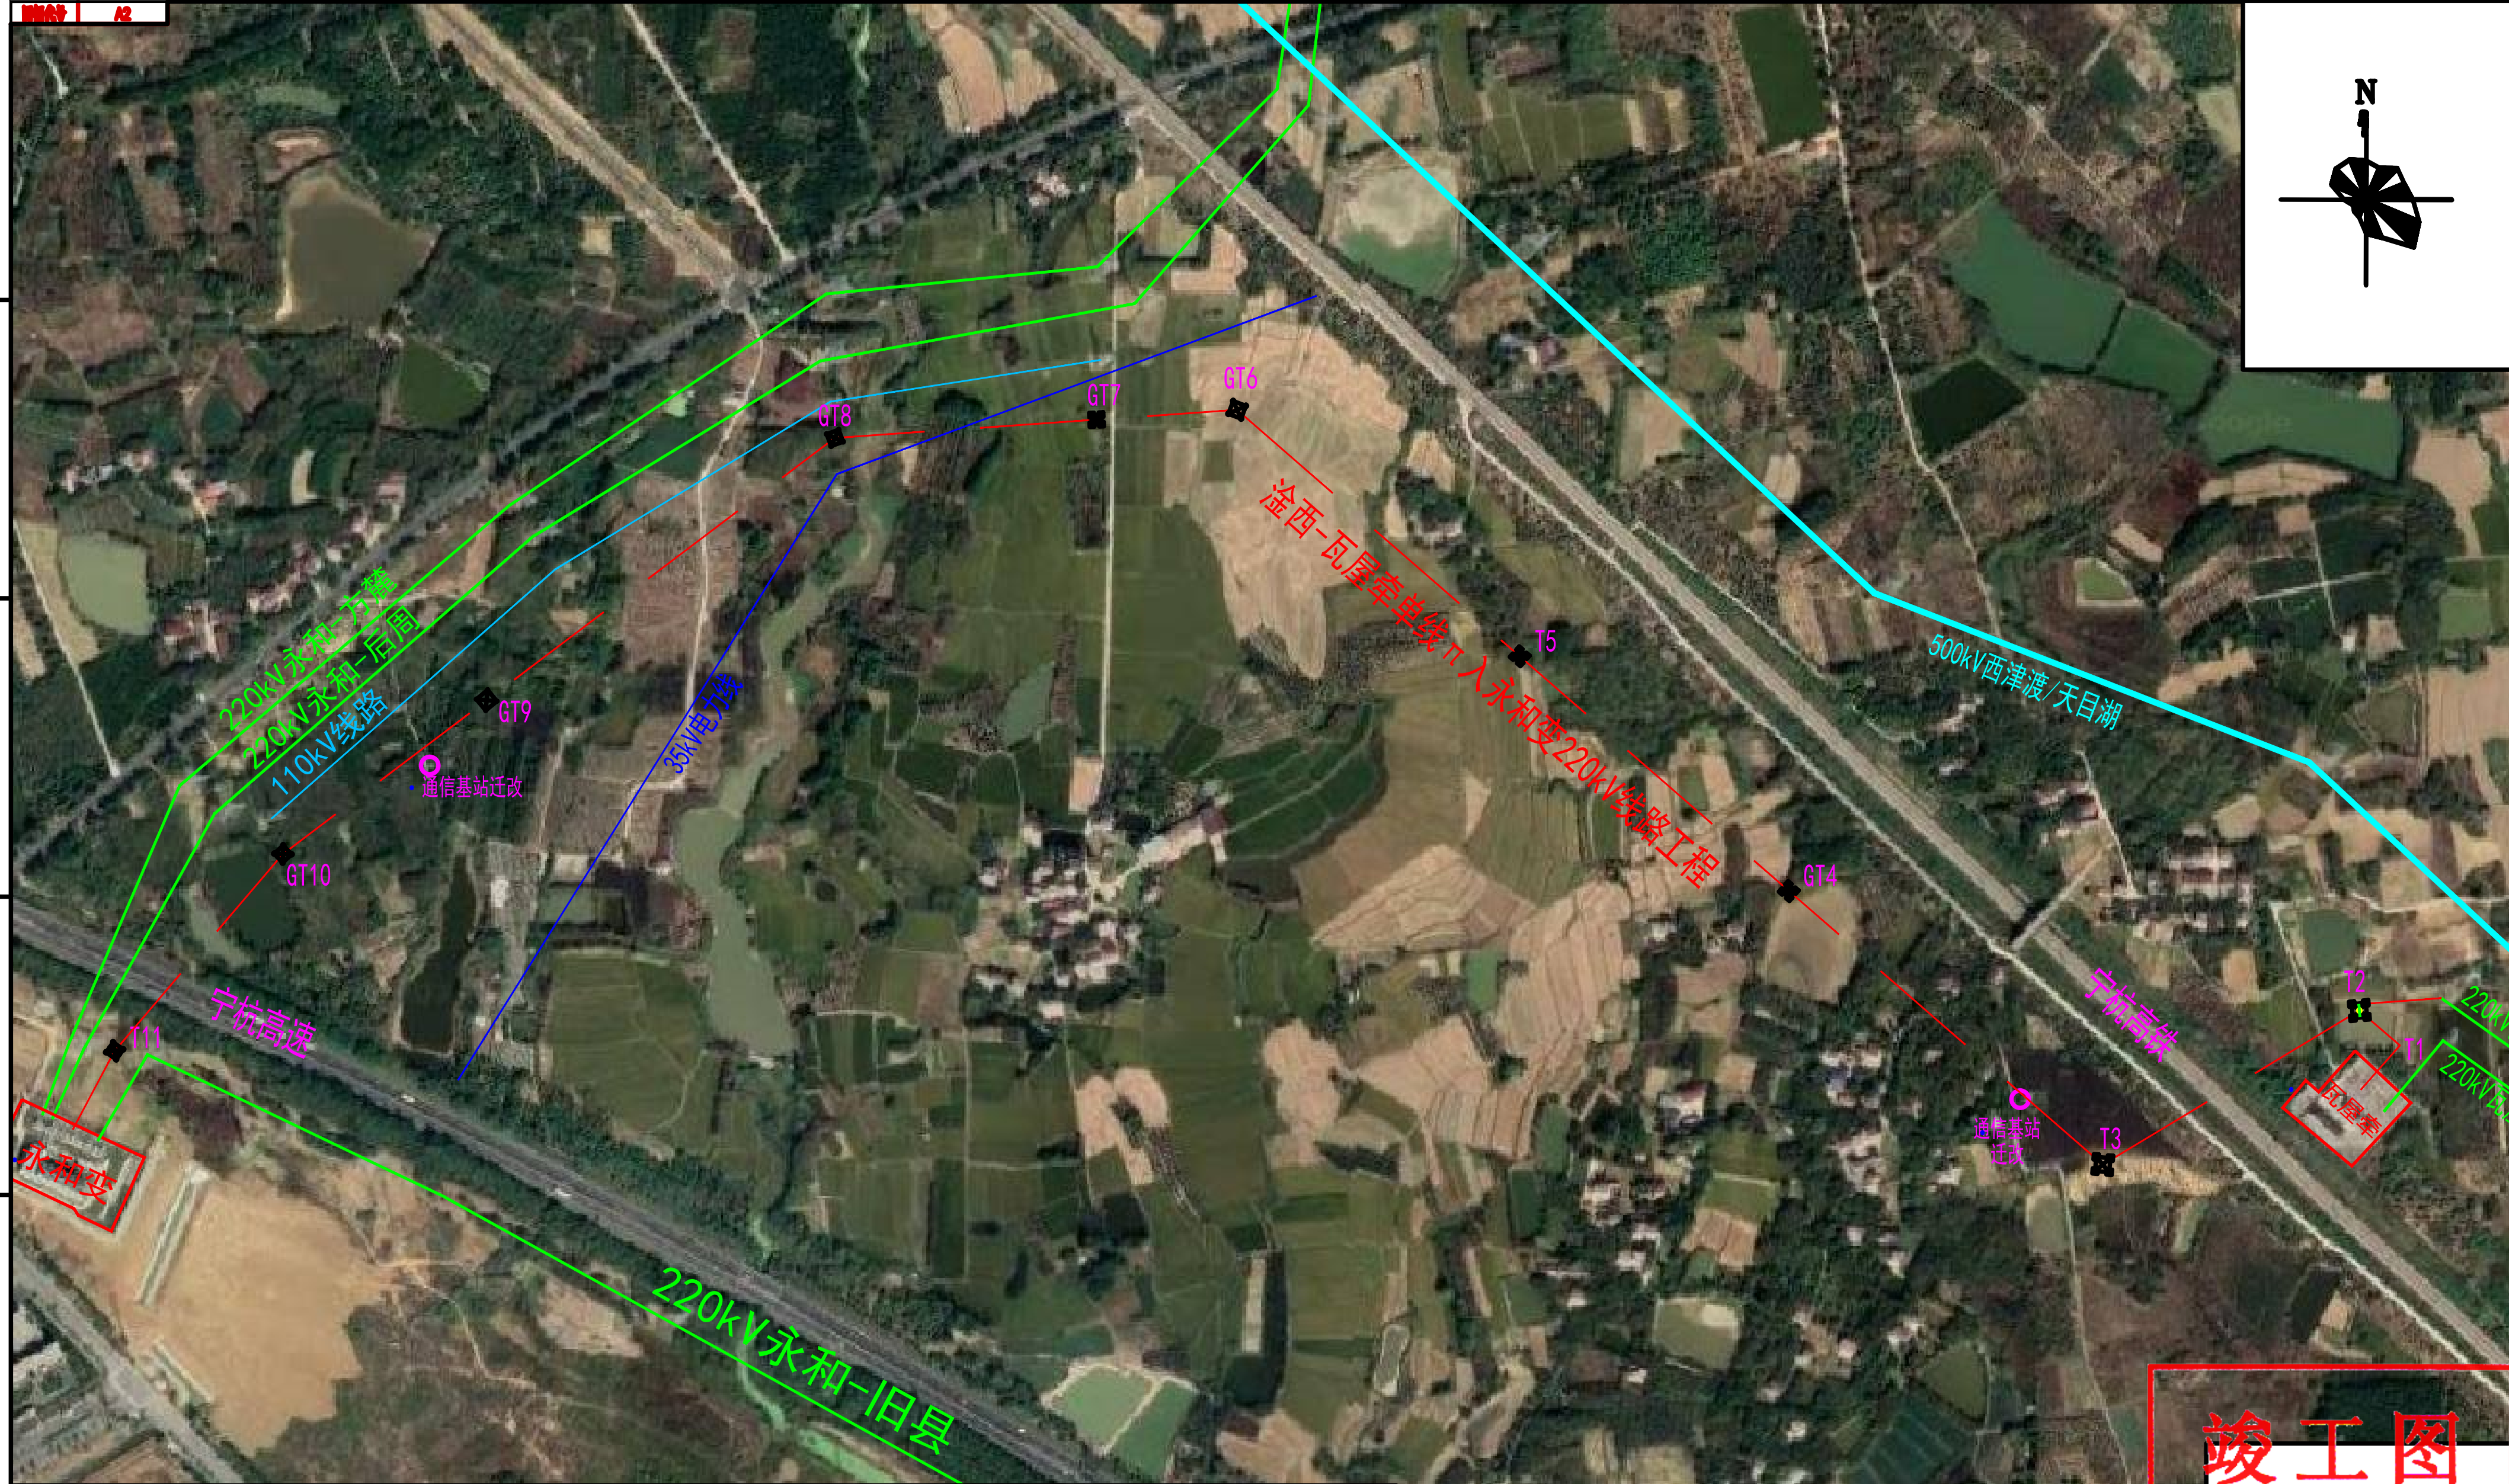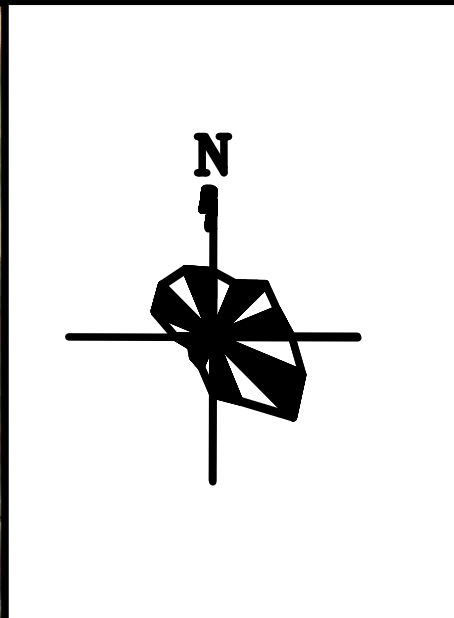


**竣工图**  
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

说明：  
本工程将淦西-瓦屋牵220kV单回线路在瓦屋牵引出线段开环，新建同塔双回路空线路向西走线后再再向南跨越宁杭高铁，后转向西沿宁杭高铁南侧走线，至X002县道东侧后转向南，沿现状220kV与110kV线路通道平行走线至永和变附近，跨越宁杭高速后接入永和变。分别形成220kV淦西-永和单回线路，220kV瓦屋牵-永和单回线路。新建线路长2.759km，其中同塔双回路段2.585km，单回路段0.174km。  
导线采用2×JL3/G1A-400/35钢芯铝绞线，地线采用2根72芯OPGW-150。

附图4 线路路径图

CEEC 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.				淦西-瓦屋牵单线接入永和变220kV线路工程		竣工图	
设计	彭伟	校核	彭伟	审核			
审核	——	编制	——	比例 1:4000			
校核	——	日期	2025年11月	图号 S33061Z-A01-02			

1 2 3 4 5 6 7 8

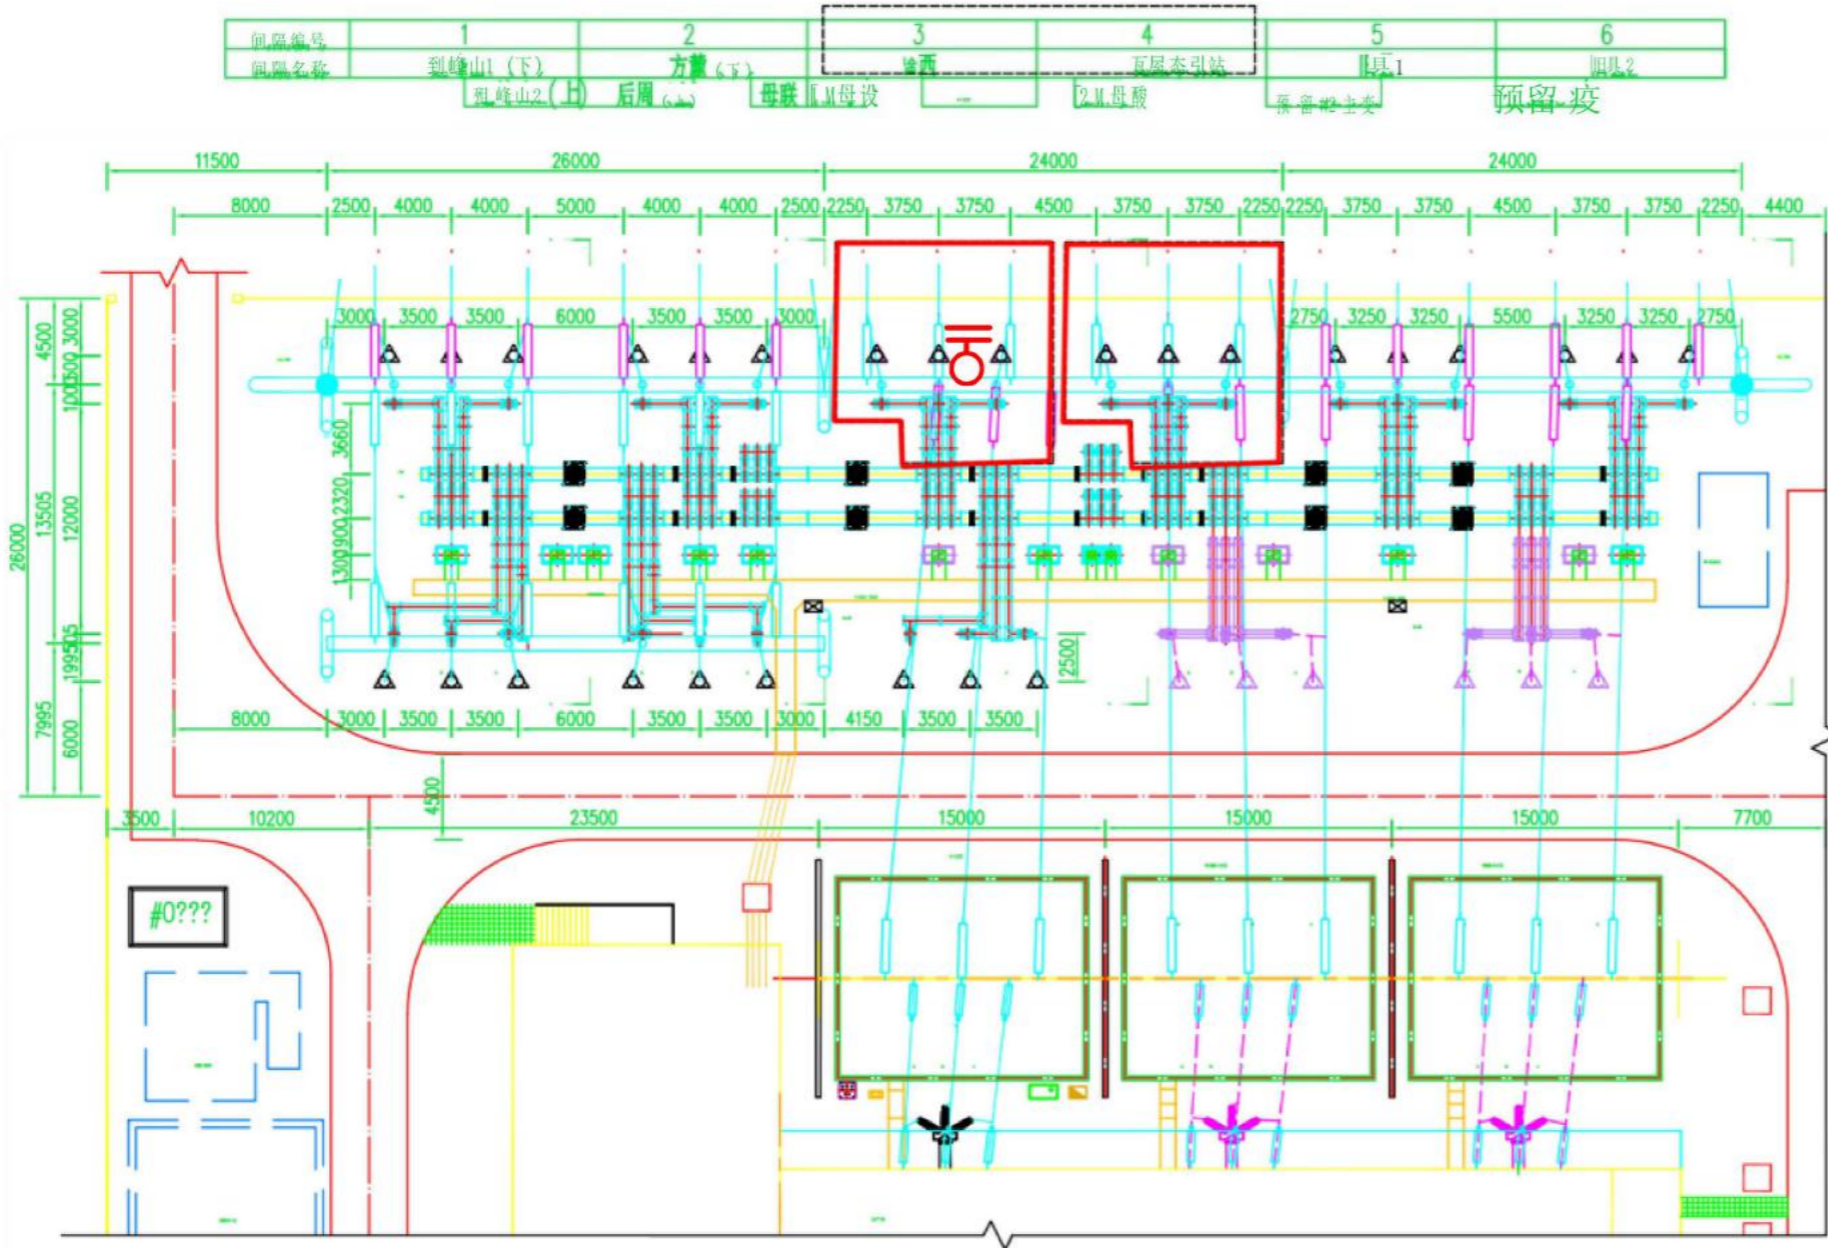

各防治分区监测内容、方法及频次

防治分区	监测频次	监测内容	监测方法
间隔扩建区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况、防护效果情况及后期植被恢复情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
间隔改造区	共2次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
塔基区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
牵张场及跨越场区	共2次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
施工道路区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析

永和220kV变电站间隔扩建工程


实际发生的防治责任范围 单位: m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地类型				合计
	永久	临时	公共管理与公共服务用地	耕地	园地	其他土地	
间隔扩建区	200	0	200	0	0	0	200
间隔改造区	150	0	150	0	0	0	150
塔基区	1995	5113	0	1844	2638	2626	7108
牵张场及跨越场区	0	3300	0	1400	1600	300	3300
施工道路区	0	1312	0	230	540	542	1312
合计	2345	9725	350	3474	4778	3468	12070



江苏核众环境监测技术有限公司

核定	樊虹呈	监测	设计
审查	谭彩云	水土保持	部分
校核	王	常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程	
设计	孙国宁	水土保持监测分区及监测点位图(间隔扩建区)	
制图			
比例	1:500		
设计证号		日期	2026.02
资质证书		图号	附图5-1

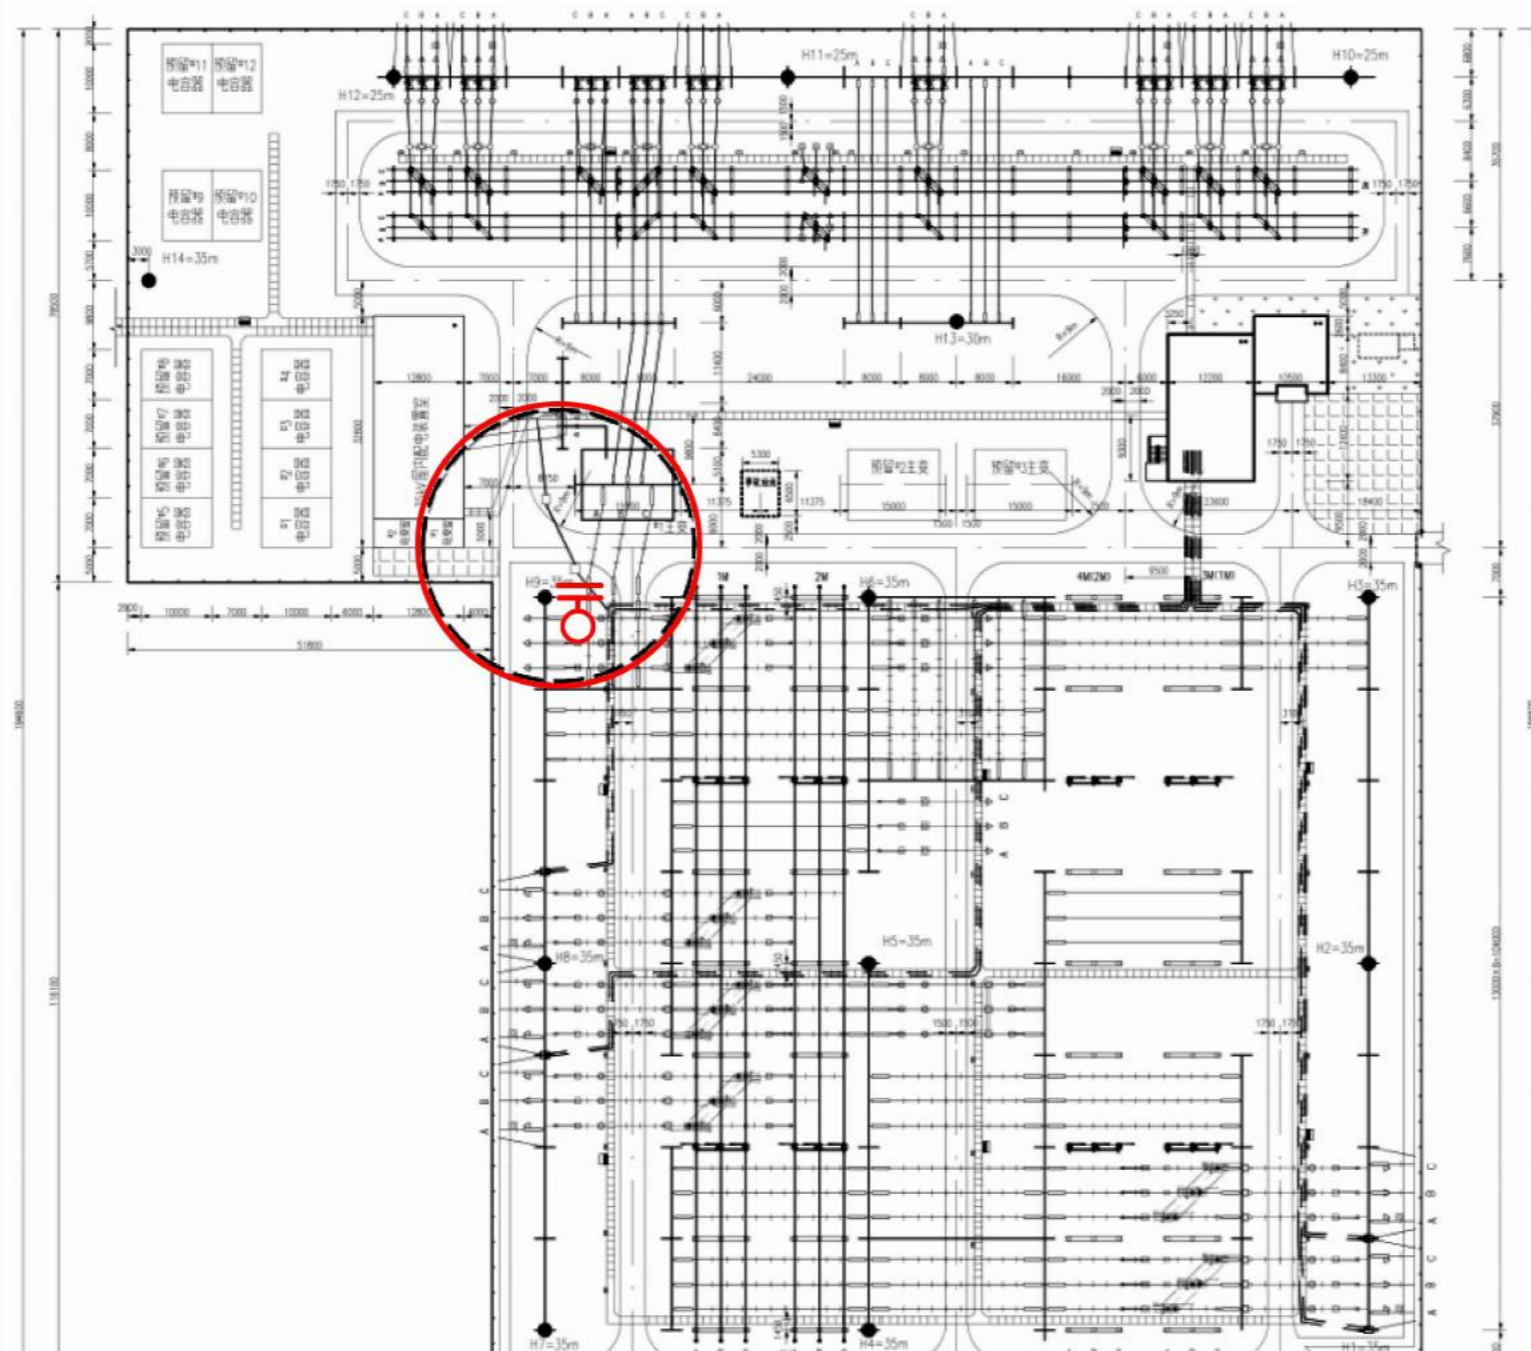

实际发生的防治责任范围 单位: m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地类型				合计
	永久	临时	公共管理与公共服务用地	耕地	园地	其他土地	
间隔扩建区	200	0	200	0	0	0	200
间隔改造区	150	0	150	0	0	0	150
塔基区	1995	5113	0	1844	2638	2626	7108
牵张场及跨越场区	0	3300	0	1400	1600	300	3300
施工道路区	0	1312	0	230	540	542	1312
合计	2345	9725	350	3474	4778	3468	12070

图例  
 间隔改造区  
 监测点位

各防治分区监测内容、方法及频次


防治分区	监测频次	监测内容	监测方法
间隔扩建区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况、防护效果情况及后期植被恢复情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
间隔改造区	共2次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
塔基区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
牵张场及跨越场区	共2次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
施工道路区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析

江苏核众环境监测技术有限公司

核定	樊虹呈	监测	设计
审查	谭彩云	水土保持	部分
校核	王	常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程	
设计	舒国宇	水土保持监测分区及监测点位图(间隔改造区)	
制图			
比例	1:1200		
设计证号		日期	2026.02
资质证号		图号	附图5-2

实际发生的防治责任范围 单位: m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地类型				合计
	永久	临时	公共管理与公共服务用地	耕地	园地	其他土地	
间隔扩建区	200	0	200	0	0	0	200
间隔改造区	150	0	150	0	0	0	150
塔基区	1995	5113	0	1844	2638	2626	7108
牵张场及跨越场区	0	3300	0	1400	1600	300	3300
施工道路区	0	1312	0	230	540	542	1312
合计	2345	9725	350	3474	4778	3468	12070

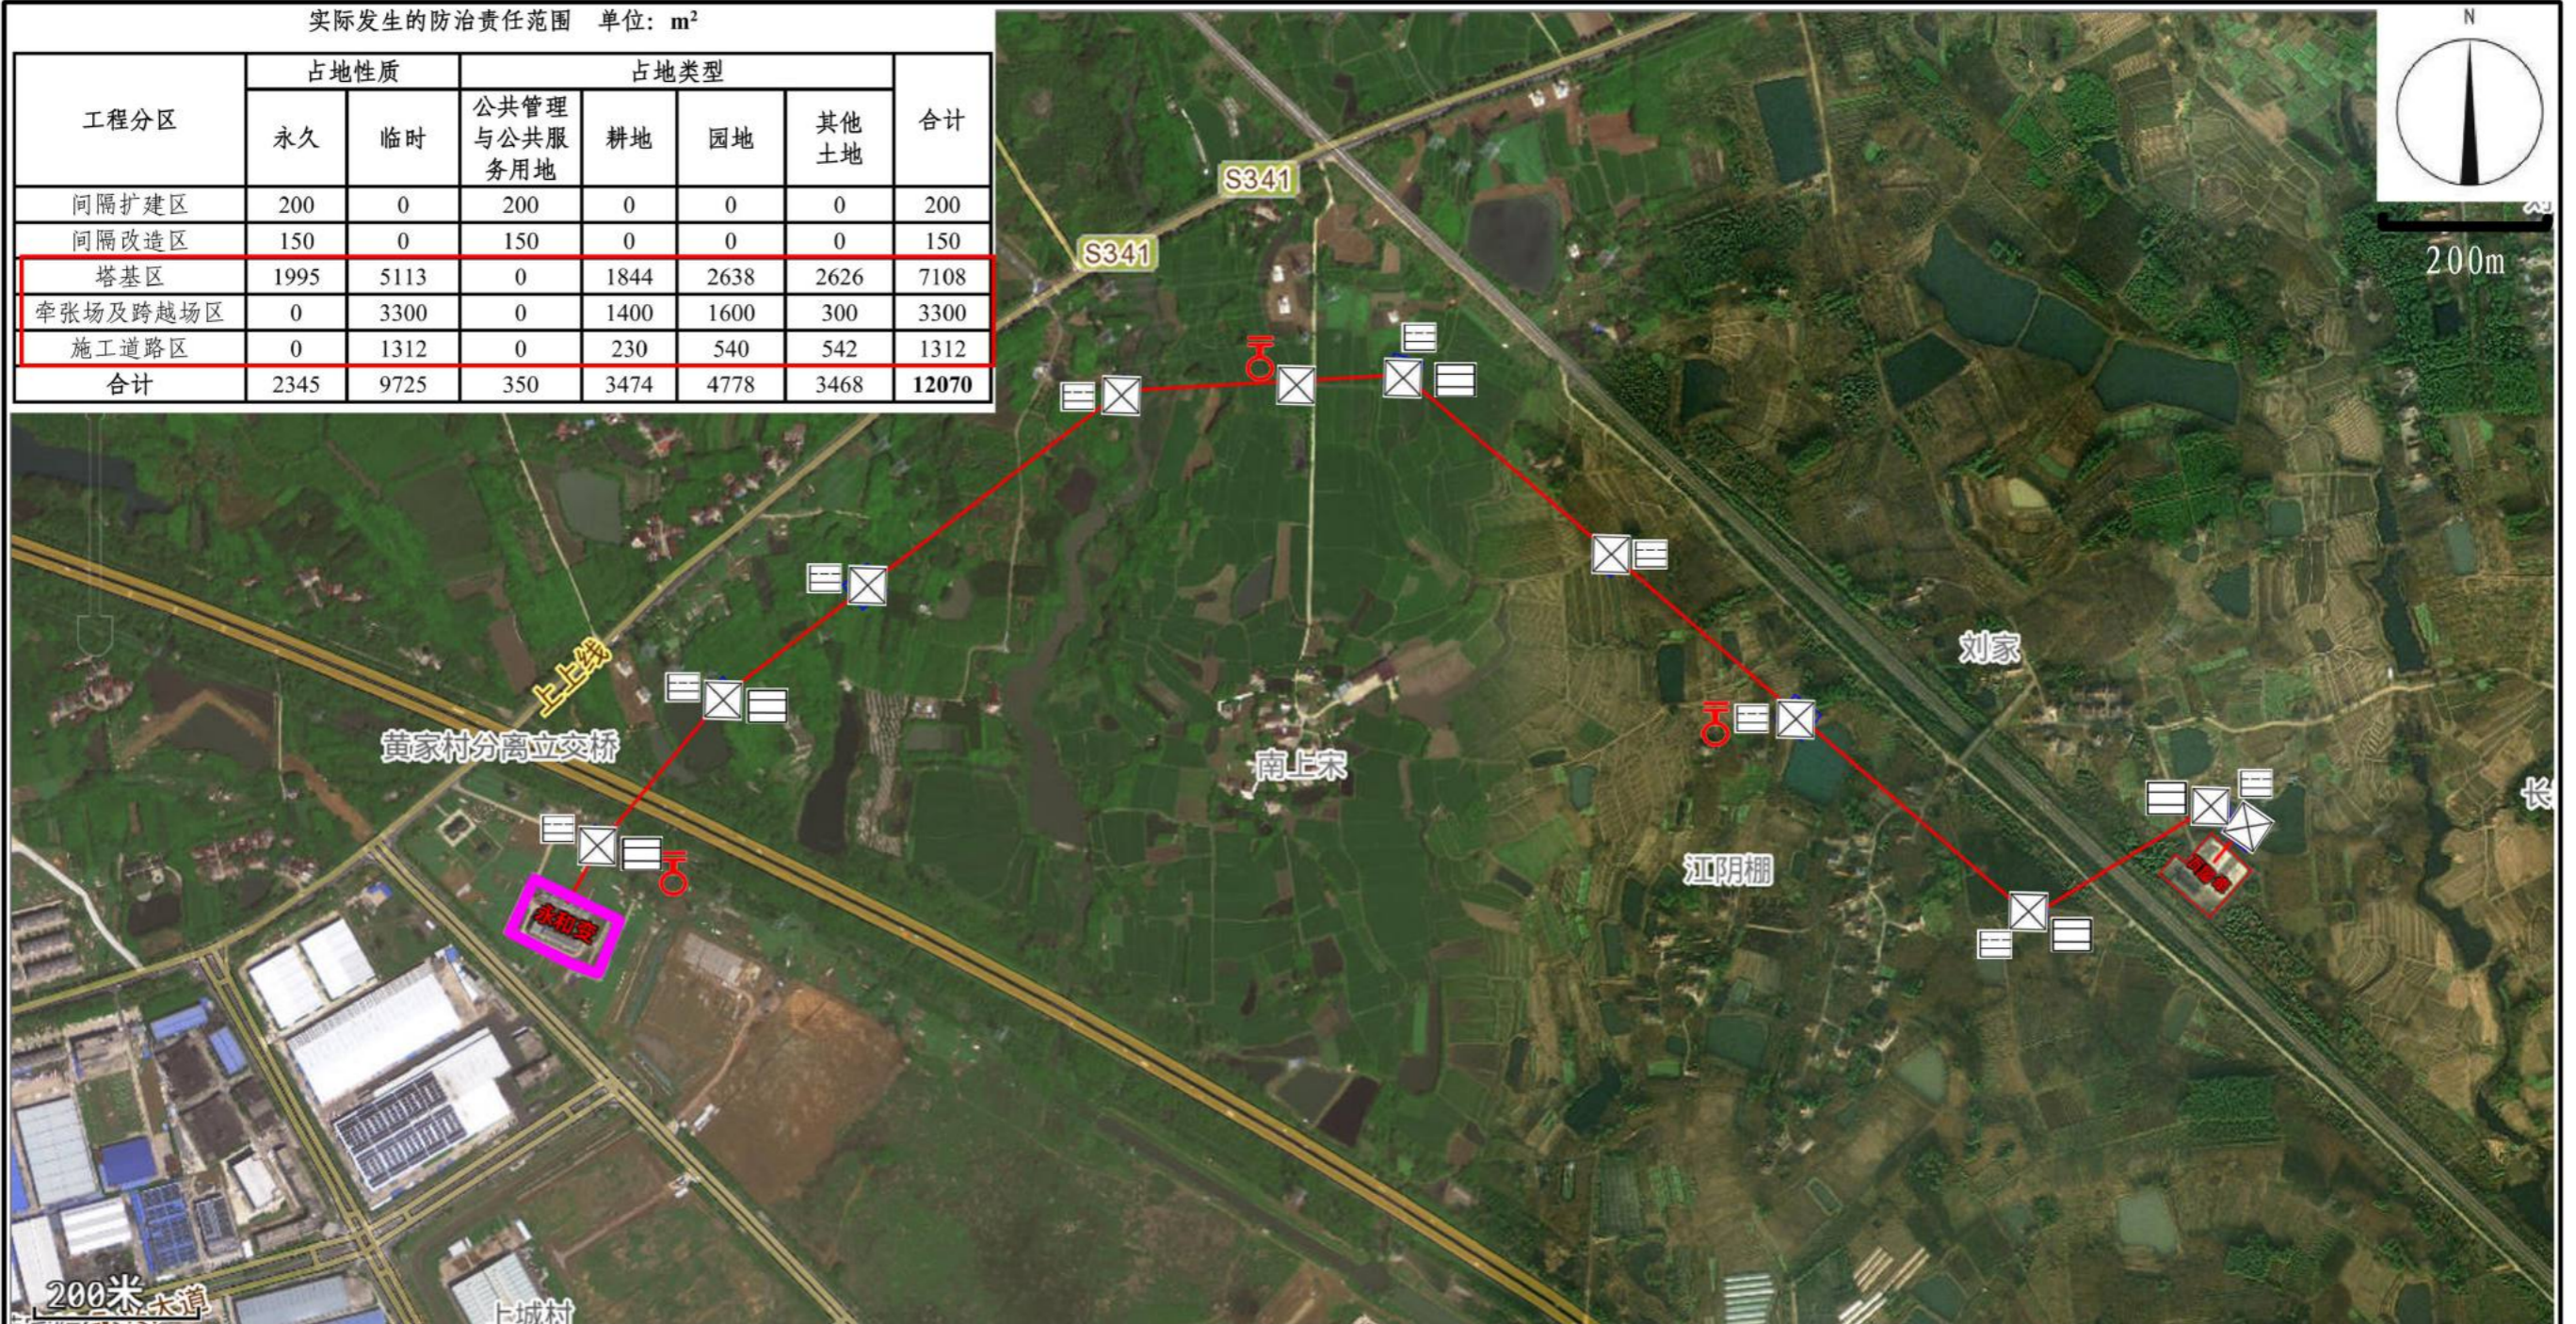

各防治分区监测内容、方法及频次

防治分区	监测频次	监测内容	监测方法
间隔扩建区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况、防护效果情况及后期植被恢复情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
间隔改造区	共2次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
塔基区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
牵张场及跨越场区	共2次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析
施工道路区	共4次	施工扰动土地面积、水土流失危害、水土保持措施实施情况及防护效果、后期植被恢复情况及复耕情况	实地测量、无人机低空遥感监测、资料分析

图例

- 新建架空
- 塔基区
- 牵张场及跨越场区
- 施工道路区
- 间隔扩建区
- 监测点位

江苏核众环境监测技术有限公司

核定	樊虹呈	监测	设计
审查	谭彩琴	水土保持	部分
校核	王	常州瓦屋牵引变改接永和变220千伏线路工程	
设计	胡国宇	水土保持监测分区及监测点位图(线路)	
制图		比例 见图	
设计证号		日期	2026.02
资质证号		图号	附图5-3
