

2026-ST
0007

江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园
(农光互补示范园) 项目 110 千伏送出工程

水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

2026年2月

2026-ST
0007

江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园
(农光互补示范园) 项目 110 千伏送出工程

水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

2026年2月

目 录

江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园(农光互补示范园)	
项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表	1
方案报告表补充说明	3
1 项目简况	3
1.1 项目概况	3
1.1.1 项目基本情况	3
1.1.2 项目组成情况	4
1.1.3 工程布置情况	5
1.1.4 工程占地情况	9
1.1.5 土石方平衡情况	10
1.1.6 项目施工进度情况	12
1.2 项目区概况	12
1.2.1 地形地貌	13
1.2.2 地质地震	13
1.2.3 水系情况	13
1.2.4 气候特征	13
1.2.5 土壤和植被	14
1.3 水土保持分析与评价	14
1.4 水土流失防治目标及防治责任范围	15
1.4.1 设计水平年	15
1.4.2 防治目标	15
1.4.3 防治责任范围	16
2 水土流失预测与水土保持措施布设	17
2.1 水土流失预测	17
2.1.1 预测单元	17
2.1.2 预测时段	17
2.1.3 土壤侵蚀模数	17
2.1.4 预测结果	19
2.1.5 水土流失危害分析	20
2.2 水土保持措施布设	20

2.2.1 水土保持措施总体布局	20
2.2.2 分区措施布设	21
2.2.3 水土保持措施工程量汇总	22
2.2.4 防治措施进度安排	23
3 水土保持投资估算及效益分析	25
3.1 投资估算成果	25
3.2 效益分析	27
3.2.1 水土流失治理度	27
3.2.2 土壤流失控制比	27
3.2.3 渣土防护率	27
3.2.4 表土保护率	27
3.2.5 林草植被恢复率	28
3.2.6 林草覆盖率	28
3.2.7 六项指标达标情况	28
3.3 水土保持管理	30
3.3.1 组织管理	30
3.3.2 后续设计	31
3.3.3 水土保持监测和监理	31
3.3.4 水土保持施工	31
3.3.5 水土保持设施验收	32

附件

- 附件 1 委托书
- 附件 2 核准批复
- 附件 3 可研批复
- 附件 4 规划文件
- 附件 5 占地情况说明函
- 附件 6 洪评承诺函

附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目区水系图
- 附图 3 项目总体布置图

- 附件 4 江苏省省级水土流失易发区图
- 附图 5 项目区土壤侵蚀强度分布图
- 附图 6 分区防治措施总体布局图
- 附图 7 塔基施工典型布置图
- 附图 8 土质排水沟、土质沉沙池典型设计图

江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表

项目概况	位置	项目位于连云港市海州区新坝镇境内。瀛洲~邓庄 π 入新坝光伏升压站 110 千伏线路工程起于 110kV 沐源海州新坝光伏升压站构架（/），终于本期新建 T14 塔（/）。				
	建设内容	<p>本工程为点型工程和线型工程，根据初设规模，共改造 110 千伏间隔 3 个，不涉及土建；新建架空线路路径总长约 4.07km，新建杆塔 14 基，均采用灌注桩基础；拆除杆塔 1 基。具体包括：</p> <p>（1）点型工程</p> <p>①瀛洲 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期保护间隔利旧，对间隔配套装置进行调试等，不涉及土建。</p> <p>②邓庄 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期更换 110 千伏线路光纤电流保护装置 1 套，不涉及土建。</p> <p>③穆圩 110 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期更换 110 千伏线路光差电流差动保护 1 套，新增 110 千伏母线保护 1 套，不涉及土建。</p> <p>（2）线型工程</p> <p>瀛洲~邓庄π入新坝光伏升压站 110 千伏线路工程：本期新建双回架空线路路径长 4.07km，新建角钢塔 14 基，均采用灌注桩基础；本期拆除 110kV 邓瀛 86C 线 138#双回路直线塔 1 基。</p>				
	建设性质	新建输变电工程	总投资（万元）	/		
	土建投资（万元）	/	占地面积（m ² ）	永久：1403	临时：9591	
				总面积：10994		
	动工时间	2026 年 6 月	完工时间	2026 年 10 月		
	土石方（m ³ ）	挖填方总量	挖方	填方	借方	余（弃）方
		4920	2460	2460	0	0
	取土（石、砂）场	/				
	弃土（石、砂）场	/				
项目区概况	涉及重点防治区情况	不涉及	地貌类型	平原		
	原地貌土壤侵蚀模数[t/km ² ·a]	140	容许土壤流失量[t/km ² ·a]	200		
项目选址（线）水土保持评价		项目选址（线）不涉及水土流失重点预防区和重点治理区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。因此，本项目无水土保持制约因素。				
预测水土流失总量（t）		16.76				
防治责任范围（m ² ）		10994				
防治标准等级及目标	防治标准等级	北方土石山区二级标准				
	水土流失治理度（%）	92	土壤流失控制比	1.0		
	渣土防护率（%）	95	表土保护率（%）	92		
	林草植被恢复率（%）	95	林草覆盖率（%）	22		
水土保持措施	防治分区	工程措施	植物措施	临时措施		
	塔基区	表土剥离 598m ³ 土地整治 5280m ²	撒播草籽 415m ²	泥浆沉淀池 14 座 防尘网苫盖 3500m ²		

江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 110 千伏送出工程
水土保持方案报告表

				土质排水沟 980m 土质沉沙池 14 座
	牵张场及跨越场区	土地整治 1900m ²	/	铺设钢板 700m ² 彩条布铺垫 500m ²
	施工道路区	土地整治 3560m ²	撒播草籽 108m ²	铺设钢板 3200m ²
水土保持 投资估算 (万元)	工程措施	2.14	植物措施	0.08
	临时措施	21.59	水土保持补偿费	1.0994
	独立费用	建设管理费		4.70
		工程建设监理费		0.60
		科研勘测设计费		4.50
总投资	36.39			
编制单位	江苏辐环环境科技有限公司		建设单位	国网江苏省电力有限公司连云港 供电分公司
法人代表 及电话	潘葳 /		法人代表 及电话	车凯 /
地址	南京市建邺区庐山路 168 号 1011 室		地址	连云港市海州区幸福路 1 号
邮编	210019		邮编	222000
联系人 及电话	胡菲 /		联系人 及电话	吴昊 /
电子信箱	/		电子信箱	/
传真	/		传真	/

方案报告表补充说明

1 项目简况

1.1 项目概况

1.1.1 项目基本情况

建设地点：项目位于连云港市海州区新坝镇境内。瀛洲~邓庄 π 入新坝光伏升压站 110 千伏线路工程起于 110kV 沐源海州新坝光伏升压站构架（/），终于本期新建 T14 塔（/）。

建设必要性：充分利用区域内优质清洁的太阳能资源，将其开发建设纳入地区经济发展重点产业，可有效带动区域清洁能源产业高质量发展。为了促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展，江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 110 千伏送出工程作为海州新坝光伏的送出工程，建设是非常必要的。

前期工作：（1）2025 年 8 月 20 日，连云港市自然资源和规划局以《关于江苏连云港现代高效农业科技示范园 110 千伏送出线路工程路径规划的批复意见》（连自然资海批复〔2025〕028 号）同意了本工程线路规划方案；（2）2025 年 9 月 29 日，国网江苏省电力有限公司连云港供电公司以《国网江苏省电力有限公司连云港供电公司关于江苏连云港中广核灌云县同兴镇 45 兆瓦光伏发电项目 110 千伏送出等工程（SDG2025110LY）可行性研究报告的批复》（连电发展可研批复〔2025〕5 号）对本工程可研进行了批复；（3）2026 年 1 月 7 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于南京会山 220 千伏输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2026〕12 号）对本工程核准进行了批复。（4）本工程架空线路跨越屠河、五道中沟、沙杭大沟，建设单位国网江苏省电力有限公司连云港供电公司正在开展本工程防洪评价招标工作，涉及防洪段线路取得洪评许可后方可开工建设，建设单位洪评承诺见附件。

本工程为点型工程和线型工程，根据初设规模，共改造 110 千伏间隔 3 个，不涉及土建；新建架空线路路径总长约 4.07km，新建杆塔 14 基，均采用灌注桩基础；拆除杆塔 1 基。具体包括：

（1）点型工程

①瀛洲 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期保护间隔利旧，对间隔

配套装置进行调试等，不涉及土建。

②邓庄 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期更换 110 千伏线路光纤电流保护装置 1 套，不涉及土建。

③穆圩 110 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期更换 110 千伏线路光差电流差动保护 1 套，新增 110 千伏母线保护 1 套，不涉及土建。

(2) 线型工程

瀛洲~邓庄 π 入新坝光伏升压站 110 千伏线路工程：本期新建双回架空线路路径长 4.07km，新建角钢塔 14 基，均采用灌注桩基础；本期拆除 110kV 邓瀛 86C 线 138#双回路直线塔 1 基。

工程占地：工程总占地 10994m²，其中永久占地 1403m²，临时占地 9591m²；主要占用耕地、其他土地（空闲地）。

工程挖填方：本工程土石方挖填总量为 4920m³，其中土石方开挖总量为 2460m³（含表土剥离 598m³，基础开挖 1856m³，建筑垃圾 6m³），填方量 2460m³（含表土回覆 598m³，基础回填 1856m³，建筑垃圾破碎深埋回填 6m³），无余方；无借方。

工期安排：工程计划于 2026 年 6 月开工，2026 年 10 月完工，总工期 5 个月。

工程投资：工程总投资/万元，其中土建投资约/万元。

1.1.2 项目组成情况

本工程由国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司统一建设。经济技术指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 项目主要经济技术指标表

一、基本概况			
项目名称	江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 110 千伏送出工程	工程性质	新建输变电工程
建设单位	国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司	建设期	2026.06-2026.10
建设地点	连云港市海州区新坝镇	总投资	/万元
电压等级	110kV	土建投资	/万元
工程规模	本工程为点型工程和线型工程，根据初设规模，共改造 110 千伏间隔 3 个，不涉及土建；新建架空线路路径总长约 4.07km，新建杆塔 14 基，均采用灌注桩基础；拆除杆塔 1 基。具体包括： (1) 点型工程		

<p>①瀛洲 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期保护间隔利旧，对间隔配套装置进行调试等，不涉及土建。</p> <p>②邓庄 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期更换 110 千伏线路光纤电流保护装置 1 套，不涉及土建。</p> <p>③穆圩 110 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：本期更换 110 千伏线路光差电流差动保护 1 套，新增 110 千伏母线保护 1 套，不涉及土建。</p> <p>(2) 线型工程</p> <p>瀛洲~邓庄π入新坝光伏升压站 110 千伏线路工程：本期新建双回架空线路路径长 4.07km，新建角钢塔 14 基，均采用灌注桩基础；本期拆除 110kV 邓瀛 86C 线 138#双回路直线塔 1 基。</p>	
二、架空经济技术指标	
电压等级	110kV
架空线路长度	新建双回架空线路长度 4.07km
杆塔使用基数	14 基角钢塔
导线型号	JL3/G1A-400/35
地线型号	OPGW-120
绝缘子型号	FXBW-110/70

1.1.3 工程布置情况

(1) 平面布置

瀛洲~邓庄 π 入新坝光伏升压站 110 千伏线路工程：线路自 110kV 沐源海州新坝光伏升压站构架出线接转角塔往西北方向走线，由南向北架空穿越 500kV 芦塘 5615 线/新伊 5614 线及 220kV 芦蓆 2W11 线/2W12 线后折向西，跨越沙杭大沟转向北走线，至 G204 国道北侧分支塔，开断 110kV 邓瀛 86C 线，形成 1 回线路至 220kV 瀛洲变和 1 回线路至 220kV 邓庄变。

图 1.1-1 线路路径走向图

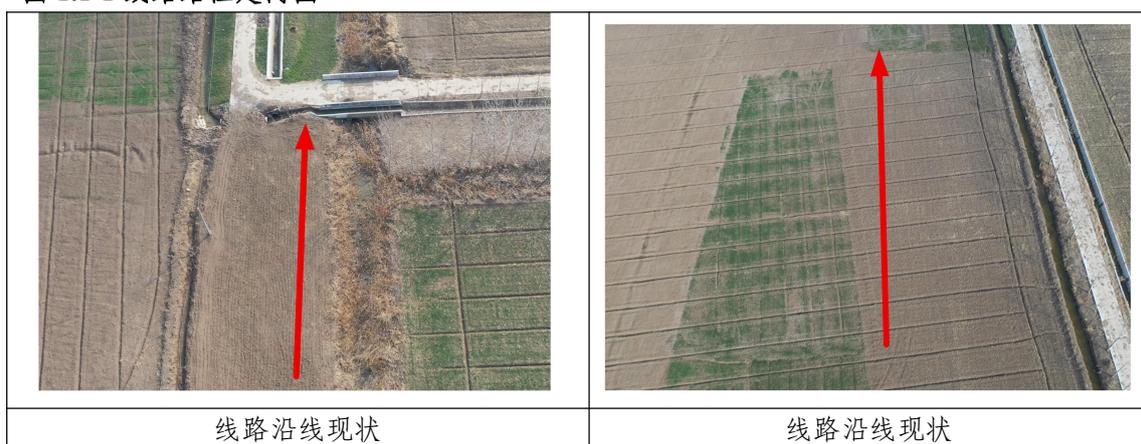


图 1.1-2 本工程线路沿线现状照片

(2) 竖向设计

线路所经地区地形平坦，水系发育。线路沿线高程为 0~4.59m（1985 国家高程基准，下同），沿线以耕地和其他土地（空闲地）为主，交通条件一般。本工程塔基竖向设计情况见表 1.1-3，基础一览图见图 1.1-3。

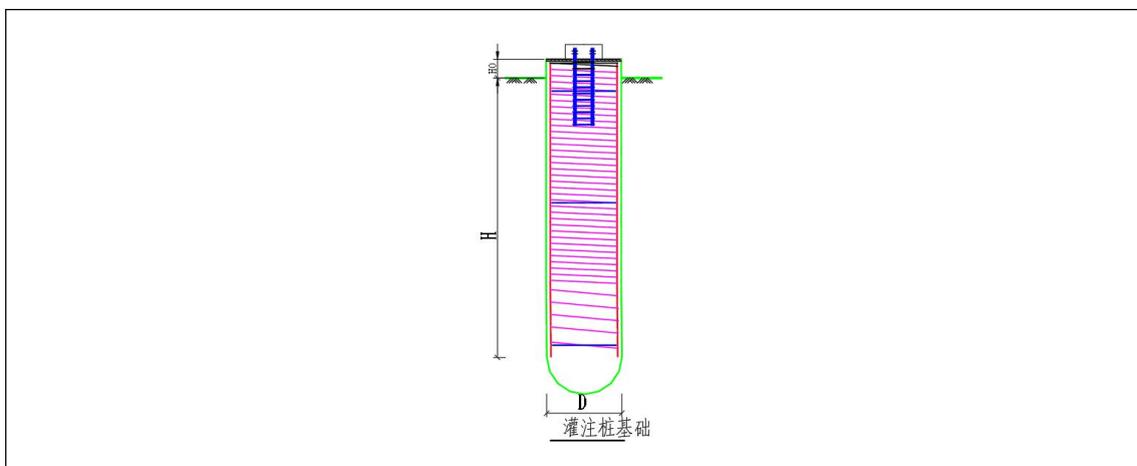


图 1.1-3 本工程塔基基础一览图

表 1.1-3 本工程塔基竖向设计一览表

基础类型	杆塔名称	基础数量	桩数 (个)	桩径 (m)	埋深 (m)
灌注桩基础	110-EC21S-Z2	24	1	0.80	11.00
	110-EC21S-Z3	4	1	0.80	13.00
	110-ED21S-DJ	4	1	1.40	17.00
	110-ED21S-J4	12	1	1.40	14.00
	110-ED21S-KJ	2	1	1.40	18.00
	110-ED21S-KJ	2	1	1.40	21.00
	110-ED21S-CY1	8	1	1.40	19.00
合计	/	56	/	/	/

(3) 施工组织

①施工用水、排水、用电、通信系统

用水：线路单个塔基用水量较少，施工过程中一般根据周边水源情况确定取水方案，线路附近有水源的，可就近采用取水管引接，如线路附近无任何水源，则可考虑采用水车就近输送水源来满足施工用水。

排水：本工程施工临时排水通过排水沟收集，至沉沙池沉淀后排入临近的排水沟中。本方案通过分析地形地貌确定排水方向，调查土壤类型和地下水情况，了解土壤透水性能，确定排水深度，同时调查分析施工现场周边环境情况，确定不会对周边环境造成影响。

用电：本工程施工过程中用电根据周边设施情况安排，周围已有用电用户区，

可按照安全用电规定引接用于施工用电,无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源。

通信:本工程施工场地内施工人员相对较少,可利用无线通信设备进行联络。

②施工生产生活区

本工程根据沿线的交通情况,拟租用已有库房或场地作为材料站,不新增防治责任范围。具体地点由施工单位根据施工中具体情况选定,便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。此外线路施工时由于线路塔基施工较分散,施工周期不长,因此工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。

③临时堆土

本工程塔基施工开挖的土方临时堆放在施工区域内设置的临时堆土区,并采用防尘网进行苫盖;表土在区域内单独设置堆土场地与其他土方分开,堆土边坡比不大于 1:1.0,堆土高度不超过 2.5m,施工后期全部回填并压实平整。

④施工道路

本工程施工对外交通主要解决建筑材料、塔材和牵引张拉设备等运输问题,可充分利用沿线附近的国道、省道、县道、乡道、村道通行,在已有的乡道和村道不能满足运输要求时适当的加宽改造;在无现有道路的情况下,开辟新的施工临时道路。经过实地踏勘本工程需设临时施工道路,长度约 890m,平均宽度约 4.0m,总占地面积约 3560m²。

⑤牵张场设置

为方便机械设备和导线的运输与吊装,在牵张场地内规划出施工通道,通道宽度在 4.0m 左右,一般满足一辆大卡车通行便可,通道做适当平整后铺设钢板,钢板铺设做到横平竖直,钢板搭头无上翘。根据设计文件、工程路线走向及地形条件,本工程布设牵张场 2 处,平均每处占地面积为 600m²,因此牵张场总占地面积约为 1200m²。

⑥跨越施工场地

本工程新建架空线路沿线需跨越其他公路 3 次,跨越 G204 国道、屠河、五道中沟和沙杭大沟各 1 次,共考虑布置 7 处跨越施工场地,每处跨越场面积按 100m² 计列。因此跨越场总占地面积为 700m²,工程主要跨越情况统计见表 1.1-4 及图 1.1-4。



图 1.1-4 本工程架空线路跨越情况照片

表 1.1-4 工程主要跨越情况统计表

序号	跨越对象	备注
1	道路	其他公路 3 次，G204 国道 1 次
2	河流	屠河、五道中沟和沙杭大沟各 1 次
合计		有 7 次跨越，每处跨越场面积按 100m ² 计列，结合现场跨越情况共布设跨越场 7 处，共占地 700m ² 。

(4) 施工工艺

①塔基施工

1) 表土剥离保护

塔基开挖前做好表层土壤的剥离和保护，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，堆土表面采用防尘网进行苫盖。

2) 灌注桩基础

灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔：成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注入人工泥浆或利用钻削下来的粘性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。扩壁泥浆与钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。当钻孔达到规定深度后，安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的泥浆被抽吸出来，施工结束后，泥浆在泥浆沉淀池中沉淀干化，就地深埋在施工区域内。每基灌注桩基础施工场地需设置一个泥浆沉淀池。

3) 杆塔拆除施工

杆塔拆除施工工艺流程为：现场勘测→停电验电→拆除附件→拆除导、地线→拆除金具、回收导线→拆除杆塔、回收塔材→拆除基础、破碎深埋（拆除深度不小于 1m）→施工场地清理。本工程采用分段分片方法拆除铁塔。由于拆除的塔基较分散，产生的建筑垃圾较少，考虑就地破碎回填至地表以下 1.0m，以不影响植被恢复。

②跨越架施工

跨越架一般采用双面跨越架或桁架式跨越的形式，施工顺序为：施工准备→

跨越架搭设→选用跨越结构形式和材料→安装承载索、封网。架搭设跨越架所用材料，一般多使用钢管或毛竹。为防止磨伤导线，封顶多采用毛竹或钢管外包裹毛竹片的办法。

1.1.4 工程占地情况

工程总占地面积约为 10994m²，其中永久占地为 1403m²，为塔基区永久占地 1403m²；临时占地为 9591m²，含塔基区临时占地 4131m²、牵张场及跨越场区占地 1900m²、施工道路区占地 3560m²。

(1) 塔基区

根据现场勘察和查阅设计文件，本工程新建 110 千伏架空线路路径长 4.07km，新建角钢塔 14 基，拆除角钢塔 1 基。新建一般角钢塔永久占地按（根开/1000+基础立柱宽+2m）²/基计列，新建电缆终端角钢塔永久占地按（根开/1000+基础立柱宽+5m）²/基计列，塔基施工总占地均按（根开/1000+基础立柱宽+12m）²/基计列。拆除角钢塔按 100m²/基计列，均为临时占地。

本工程塔基区总占地面积 5534m²，其中永久占地 1403m²，临时占地 4131m²。本工程线路铁塔占地情况见表 1.1-5。

(2) 牵张场及跨越场区

根据主体设计文件及线路沿线走向，本工程沿线需设置牵张场 2 处，平均每处占地面积约为 600m²；共设置跨越场地 7 处，每处跨越场面积按 100m²计列。因此，本工程牵张场及跨越场区总占地面积为 1900m²，均为临时占地。

(3) 施工道路区

本工程需布设施工临时道路长度约 890m，平均宽度约 4.0m，施工临时道路占地面积为 3560m²，均为临时占地。

本工程各分区占地情况见表 1.1-6。

表 1.1-6 工程分区占地情况统计表

单位：m²

分 区	占地性质		占地类型		总占地
	永久	临时	耕地	其他土地	
塔基区	1403	4131	5111	423	5534
牵张场及跨越场区	0	1900	1900	0	1900
施工道路区	0	3560	3452	108	3560
合 计	1403	9591	10463	531	10994

注：本工程占用的其他土地均为空闲地，沿线扰动区域均不涉及永久基本农田、生态保护红线和生态公益林。

1.1.5 土石方平衡情况

(1) 塔基区

塔基区占用耕地和其他土地（空闲地）。耕地和空闲地可剥离表土厚度均为30cm。施工前期对塔基区永久占地、泥浆沉淀池和拆除基础等开挖区域进行表土剥离，剥离面积1992m²，表土剥离量为598m³。剥离的表土堆放在塔基区的临时堆土区域，临时堆土采用防尘网临时苫盖。施工结束后对塔基区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土全部回覆利用，表土回覆量为598m³。

本工程拆除角钢塔1基，拆除角钢塔开挖面约16m²/基，挖深约1.5m，拆除角钢塔产生建筑垃圾约6m³/基，挖方量共24m³（建筑垃圾6m³）。由于拆除塔基较分散，单个塔基产生的建筑垃圾较少，考虑就地破碎回填至地表以下1.0m，以不影响植被恢复。填方量共24m³（建筑垃圾破碎深埋回填6m³）。无余方，无借方。

通过现场勘查和查阅设计资料，挖填土方情况统计见表1.1-7。

通过上表计算可得，全线塔基基础开挖产生的土方、钻渣和泥浆沉淀池开挖产生的土方共约为 1718m³。施工期在塔基区四周需设置临时土质排水沟，平均每个角钢塔设置临时排水沟 70m，共计开挖排水沟 980m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 78.4m³。在每基塔排水沟末端设置临时土质沉沙池，沉沙池放坡 1:1 开挖，池口尺寸长×宽为 3m×2.5m，深 1m，容积 3m³，共计 14 座，开挖土方 42m³。

综上所述，塔基区挖方量 2460m³（含表土剥离 598m³，基础开挖 1856m³，建筑垃圾 6m³），填方量 2460m³（含表土回覆 598m³，基础回填 1856m³，建筑垃圾破碎深埋回填 6m³），无余方；无借方。

（2）牵张场及跨越场区

牵张场及跨越场区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故牵张场及跨越场区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

（3）施工道路区

施工道路区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故施工道路区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

（4）工程土石方汇总

本工程土石方挖填总量为 4920m³，其中土石方开挖总量为 2460m³（含表土剥离 598m³，基础开挖 1856m³，建筑垃圾 6m³），填方量 2460m³（含表土回覆 598m³，基础回填 1856m³，建筑垃圾破碎深埋回填 6m³），无余方；无借方。具体土方平衡情况见表 1.1-8。

表 1.1-8 土石方挖填平衡情况表

单位：m³

工程分区	开挖			回填			借方	余方
	表土剥离	基础开挖	建筑垃圾	表土回覆	基础回填	建筑垃圾		
塔基区	598	1856	6	598	1856	6	0	0
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0

施工道路区	0	0	0	0	0	0	0	0
小计	598	1856	6	598	1856	6	0	0
合计	2460			2460			0	0

注：各行均可按“开挖+借方=回填+余方”进行平衡。




图 1.1-5 土石方平衡流向框图 单位：m³

表 1.1-9 表土调查情况表

工程分区	可剥离表土面积 (m ²)	剥离表土厚度 (m)	占地类型
塔基区	5111	0.30	耕地、其他土地
牵张场及跨越场区	1900	0.30	耕地
施工道路区	3452	0.30	耕地、其他土地

表 1.1-10 表土平衡一览表

单位：m³

工程分区	表土剥离	表土回覆	调入	调出	借方	综合利用
塔基区	598	598	0	0	0	0
合计	598	598	0	0	0	0



图 1.1-6 表土平衡流向框图 单位：m³

1.1.6 项目施工进度情况

本项目主体工程施工进度情况见表 1.1-11。

表 1.1-11 项目主体工程施工进度表

工程名称		施工期				
		2026 年				
		6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
杆塔施工	基础施工	—————				
	杆塔组立			—————		
	架线施工			—————		
	场地整理					—————

1.2 项目区概况

1.2.1 地形地貌

线路沿线地势平坦，沿线地貌为徐淮黄泛平原区，地貌单元为平原。地面高程为 0~4.59m，沿线以耕地和其他土地（空闲地）为主，交通条件一般。

1.2.2 地质地震

项目区在勘探深度范围内的地基土主要为第四系全新统冲积成因的粉质黏土，局部分布一定厚度的素填土。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）和勘查报告，本区抗震设防烈度为 7 度，属第三组，场地土为中软土，场地类别为 II 类，设计基本地震加速度值为 0.15g，根据场地类别和设计抗震分组可得特征周期为 0.45s。

1.2.3 水系情况

本工程位于连云港市，处于鲁中南丘陵山区与淮北平原的结合部，属于淮河流域沂沭泗水系下游片区。本工程架空线路跨越屠河、五道中沟、沙杭大沟，架空线路在跨越河道时，跨越处借助两岸地势优势，一档跨越，尽量减少对河道的影响。项目周边水系为通榆河。本工程新建杆塔不涉及河道管理范围。

本工程线路涉及的屠河、五道中沟、沙杭大沟等河道均位于鲁兰河流域。根据上述规划，确定本次屠河、五道中沟、沙杭大沟采用 10 年一遇排涝标准。地势平坦，水系较为发育，各河流水位相差不大，河流，水流平缓，河岸基本稳定，无明显冲淤变化，百年一遇洪水在无特殊情况下不会漫出河床。

通榆河南起新通扬运河（海安），北至柘汪工业园（赣榆），全长 375km，是江苏省东部沿海地区江水东引北调的水利、水运骨干河道，主要功能为供水（含调水、饮用水水源地）、治涝、航运，河道等级为二级，属于流域性河道。根据《连云港市水利工程管理办法》和河道管理范围划界成果，通榆河海州段河道管理范围为背水坡堤脚外至截水沟外沟口。

1.2.4 气候特征

项目所在地属暖温带季风气候区。地处暖温带南部边缘，冬季受北方高原南下的季风侵袭，以寒冷少雨天气为主，夏季受来自海洋的东南季风控制，天气炎热多雨，春秋两季处于南北季风交替时期，形成四季分明，差异明显，干、湿、冷、暖天气多变的气候特征。根据连云港气象站 1980~2024 年观测资料，各气象要素特征值见表 1.2-1。

表 1.2-1 项目区域气象特征值一览表

项目	内容		单位	连云港市
气温	历年年平均气温		°C	14.2
	极端最高气温		°C	37.5 (2002.7.15)
	极端最低气温		°C	-15.3 (1990.2.1)
降水	平均降水	多年	mm	892.4
	最大年降水	多年	mm	1549.7 (2003)
	最大日降水	多年	mm	266.8 (2000.8.30)
风速	历年年均风速		m/s	3.1
风向	全年主导风向		/	ES
相对湿度	多年平均		%	75
无霜期	全年		d	218
蒸发量	全年平均		mm	1469.6

1.2.5 土壤和植被

连云港市土壤有棕壤土、砂礓黑土、潮土、盐土 4 个土类、9 个亚类，16 个土属、33 个土种。本项目区土壤类型主要为棕壤土，可剥离表土厚度为 30cm。通过前期地勘，项目施工所涉及区域可剥离表土厚度约为 0.30m，可剥离表土面积为 10463m²。

项目区地处江苏东北部近海地域，受海洋调节，降水量较多，属暖温带湿润季风气候，植被类型属典型的落叶阔叶林。但是，由于农业开发历史悠久，自然植被受人类活动的广泛影响，原生自然植被不复存在，绝大多数被农田取代。落叶阔叶等地带性植被类型以人工栽培为主，主要有常绿针叶林、乔木、部分野生灌木和野生草本植物。乔木主要有意杨、枣树、中槐、泡桐等；灌木有野蔷薇、酸枣、花椒等；野生草本植物主要有山扁豆、马唐草、狗尾草、鸡眼草、蒲公英等。项目区现状主要为耕地和其他土地（空闲地），林草覆盖率约 15%。

1.3 水土保持分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）对工程水土保持制约性因素进行分析和评价。工程所在区不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；不属于水土流失严重、生态脆弱的地区；不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区；不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地，风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地和生态脆弱区等。

根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农〔2014〕48号），项目区所在地不涉及江苏省省级水土流失重点预防区和水土流失重点治理区。根据《连云港市水土保持规划（2016-2030）》，项目区所在地不涉及连云港市水土流失重点预防区和水土流失重点治理区。因此，本项目无水土保持制约因素。

1.4 水土流失防治目标及防治责任范围

1.4.1 设计水平年

主体工程计划 2026 年 6 月开工，2026 年 10 月完工，根据主体工程施工时间和水土保持措施实施进度安排，确认本方案设计水平年为主体工程完工后下一年，即 2027 年。

1.4.2 防治目标

本项目区所在地位于连云港市海州区新坝镇境内，根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，项目区属于北方土石山区——华北平原区——淮北平原岗地农田防护保土区——灌云灌南平原农田防护土壤保持区。根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农〔2014〕48号），项目区所在地不涉及江苏省省级水土流失重点预防区和水土流失重点治理区。根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，项目所在地新坝镇为江苏省省级水土流失易发区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），项目不涉及水土流失重点预防区和重点治理区等一级标准区域，但周边 500m 范围内有居民点，本项目水土流失防治标准应执行北方土石山区二级标准。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）4.0.7 节规定土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1。

因此本工程水土流失防治目标如下：施工期渣土防护率应达 90%，表土保护率 92%；至设计水平年，水土流失治理度应达 92%，土壤流失控制比应达 1.0，渣土防护率应达 95%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 22%。防治目标具体情况见表 1.4-1:

表 1.4-1 防治标准指标计算表

指标	标准值		侵蚀强度调整	方案目标值	
	施工期	设计水平年	微度	施工期	设计水平年
水土流失治理度 (%)	/	92	/	/	92
土壤流失控制比	/	0.85	+0.1	/	1.0
渣土防护率 (%)	90	95	/	90	95
表土保护率 (%)	92	92	/	92	92
林草植被恢复率 (%)	/	95	/	/	95
林草覆盖率 (%)	/	22	/	/	22

1.4.3 防治责任范围

按照“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），结合本工程占地概况、水土流失影响分析，对工程建设及生产可能造成水土流失范围进行界定，以确定水土流失防治责任范围。确定本工程水土流失防治责任范围为 10994m²，其中永久占地为 1403m²，临时占地为 9591m²。

表 1.4-2 水土流失防治责任范围表

单位：m²

防治分区	占地性质		防治责任范围
	永久占地面积	临时占地面积	
塔基区	1403	4131	5534
牵张场及跨越场区	0	1900	1900
施工道路区	0	3560	3560
合计	1403	9591	10994

2 水土流失预测与水土保持措施布设

2.1 水土流失预测

2.1.1 预测单元

本工程水土流失预测范围为 10994m²。预测单元为工程建设扰动地表的时段和形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本工程的预测单元为塔基区、牵张场及跨越场区和施工道路区。

2.1.2 预测时段

本工程为新建输变电工程，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。各区域水土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，并按照最不利情况考虑。施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。连云港市雨季主要是 6~9 月份。

本工程施工期为 2026 年 6 月~2026 年 10 月，自然恢复期取完工后 2 年。根据项目本身建设进度，水土流失预测时段情况详见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目水土流失预测分区及时段表

阶段	预测单元	施工时段	预测时段 (a)	主要内容
施工期	塔基区	2026.06-2026.10	0.75	塔基基础施工 (每基塔平均施工3个月)
	牵张场及跨越场区	2026.08-2026.10	0.50	架线施工 (平均每处施工2个月)
	施工道路区	2026.06-2026.10	0.75	车辆占压 (平均每处施工3个月)
自然恢复期	塔基区	2026.11-2028.10	2.00	无
	牵张场及跨越场区	2026.11-2028.10	2.00	无
	施工道路区	2026.11-2028.10	2.00	无

2.1.3 土壤侵蚀模数

根据现场勘查项目地形主要为平原，参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目所在地土壤侵蚀强度为微度，确定土壤侵蚀模数背景值为 140t/(km²·a)。

本工程施工期各区域侵蚀模数采取类比分析法，通过类比“江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程”获得。类比工程已于 2025 年 3 月通过了国网江苏省电力有限公司组织的水土保持设施验收，并投入运行，本工程水土保持监测单位为江苏方天电力技术有限公司，验收报告编制单

位为连云港市水利规划设计院有限公司。参考性分析对照详见表 2.1-2。

表 2.1-2 参考性分析对照表

项目	江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 110 千伏送出工程	江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程	类比结果
地理位置	连云港市海州区	连云港市徐圩新区	相近
气候条件	暖温带季风气候	暖温带季风气候	相同
年平均降水量	892.4mm	910.1mm	相近
地形地貌	平原	平原	相同
土壤类型	棕壤土	黄棕壤土	相同
水土流失强度	微度水蚀	微度水蚀	相同

表 2.1-3 类比项目实际监测侵蚀模数统计表

预测时段	江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程（类比）	
	防治分区	实际监测侵蚀模数[t/(km ² ·a)]
施工期	塔基区	662
	牵张场及跨越场区	426
	施工道路区	772

本工程与类比工程均为输变电项目，均位于连云港市，气候条件、地形地貌、土壤类型和水土流失强度等相同，年平均降水量相近。因此本工程与类比工程有一定的可比性。根据各区的施工特点对类比工程的侵蚀模数进行修正后可应用于本工程。

针对本工程的环境条件、扰动强度和防护措施条件等实际情况，对扰动地表后侵蚀模数的取值，在下列三个方面进行修正。

1) 环境条件：本工程多年平均降水量为 892.4mm，类比工程的多年平均降水量为 910.1mm，降雨量相近，因此，设置修正系数为 1.0。

2) 扰动强度：本工程土石方工程量和扰动地表的强度与类比工程相近，因此，根据不同分区，设置修正系数为 1.0。

3) 防护措施条件：类比工程所列监测结果是在工程施工过程中采取了一定的水土保持措施的基础上进行监测的，若施工过程中不采取任何措施，则工程扰动后的土壤侵蚀模数将会比监测结果大。而水土流失量预测的基础是按生产建设项目正常的设计功能，在无水土保持工程条件下可能产生的土壤流失量。因此，设置修正系数为 1.2-2.4。

自然恢复期：项目建成，植被种植完成后，开始发挥保水保土的作用，塔基

区除硬化部分自然恢复期水土流失治理达标，土壤侵蚀模数达到背景值，各防治分区的侵蚀模数见表 2.1-4。

表 2.1-4 扰动后土壤侵蚀模数类比表

预测时段	江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程（类比工程）		调整系数			江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 110 千伏送出工程（本工程）	
	预测单元	监测土壤侵蚀模数 [t/(km ² ·a)]	环境条件	扰动强度	防护措施条件	预测单元	预测土壤侵蚀模数 [t/(km ² ·a)]
施工期	塔基区	662	1	1	2.4	塔基区	1589
	牵张场及跨越场区	426	1	1	2.0	牵张场及跨越场区	852
	施工道路区	772	1	1	1.2	施工道路区	926

2.1.4 预测结果

根据上述确定的土壤侵蚀模数，按公式法进行各分区水土流失量估算。结合项目预测单元及预测时段划分，预测项目建设时如不采取水土保持措施可能产生土壤流失量，结果见表 2.1-5。

根据分时段计算结果可知，如不采取水保措施，项目在整个建设期可能产生土壤流失总量为 16.76t，新增土壤流失量为 12.66t。

表 2.1-5 项目水土流失量预测计算成果表

预测时段	预测单元	面积 (m ²)	预测时段 (a)	侵蚀模数背景值 [t/(km ² ·a)]	背景流失量 (t)	扰动后侵蚀模数 [t/(km ² ·a)]	水土流失总量 (t)	新增流失量 (t)	新增占比 (%)
施工期	塔基区	5534	0.75	140	0.58	1589	6.60	6.02	69.51
	牵张场及跨越场区	1900	0.50	140	0.13	852	0.81	0.68	
	施工道路区	3560	0.75	140	0.37	926	2.47	2.10	
小计	/	10994	/	/	1.08	/	9.88	8.80	
自然恢复期第一年	塔基区	5280	1	140	0.74	500	2.64	1.90	30.49
	牵张场及跨越场区	1900	1	140	0.27	500	0.95	0.68	
	施工道路区	3560	1	140	0.50	500	1.78	1.28	
小计	/	10740	/	/	1.51	/	5.37	3.86	
自然恢复期第二年	塔基区	5280	1	140	0.74	140	0.74	0	30.49
	牵张场及跨越场区	1900	1	140	0.27	140	0.27	0	
	施工道路区	3560	1	140	0.50	140	0.50	0	
小计	/	10740	/	/	1.51	/	1.51	0	
合计					4.10	/	16.76	12.66	100

注：自然恢复期塔基区水土流失面积已扣除硬化占地（新建一般角钢塔水土流失面积已扣除塔脚硬化占地，新建电缆终端塔水土流失面积已扣除永久占地）。

2.1.5 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力的下降、淤积水系等问题，而且治理难度大、费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成水土流失危害进行预测，根据预测结果采取有针对性的防治措施。

工程施工过程中可能造成水土流失危害，主要包括以下几个方面：

（1）破坏原地貌、加速土壤侵蚀。项目施工过程中扰动原地貌，损坏原有水土保持设施，原地貌破坏后涵养水源、保持水土功能丧失，地表裸露，土壤抗侵蚀能力急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，土壤侵蚀加速。

（2）项目在基础开挖、机械占压等施工过程中，如遇较强的降雨，若没有防护措施，在降雨及人为因素作用下将会产生大量泥沙，造成较为严重的水土流失，对项目本身的施工安全也会造成一定的威胁。

（3）工程施工中需开挖、堆置、回填土方，土方装卸堆存过程中易产生粉尘，在风力作用下，也易引起风蚀，并产生大气粉尘污染，对局部生态环境造成不良影响。

（4）工程施工扰动过程中，施工取水用水，排水排污等，如处理不充分，沉淀不彻底，容易破坏周边水系水质，严重时会对周边水系生态系统造成不良影响。

2.2 水土保持措施布设

2.2.1 水土保持措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，补充布设水土保持措施，开发与防治相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时突出重点防治工程措施和临时防治工程措施。各区水土流失防治措施设置情况详见表 2.2-1。

表 2.2-1 防治措施总体布局表

防治分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
塔基区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/

防治分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
	临时措施	泥浆沉淀池	土质排水沟、土质沉沙池、防尘网苫盖
牵张场及跨越场区	工程措施	/	土地整治
	临时措施	铺设钢板	彩条布铺垫
施工道路区	工程措施	/	土地整治
	植物措施	/	撒播草籽
	临时措施	铺设钢板	/

2.2.2 分区措施布设

(1) 塔基区

①工程措施

表土剥离：本工程主体设计中已考虑施工前期对塔基区永久占地、泥浆沉淀池和拆除基础等开挖区域进行表土剥离，剥离面积 1992m²，剥离厚度为 30cm，表土剥离量为 598m³。剥离的表层土堆放于塔基临时施工区域，待土建施工完成后全部用作覆土。

土地整治：本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区除硬化外裸露地表进行土地整治，主要包括场地清理、平整、表土回覆，整治面积为 5280m²，表土回覆量为 598m³，整治后的土地约 4865m² 达到复垦条件后交由土地权所有人进行复耕，其余 415m² 进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本工程主体设计中已考虑施工后期对塔基区占用空闲地区域采取撒播草籽的措施，撒播面积约 415m²，撒播草籽密度 150kg/hm²，撒播草籽总量为 6.23kg。

③临时措施

泥浆沉淀池：为减少钻孔灌注桩施工过程中产生的水土流失，在塔基基础外侧设置泥浆沉淀池，对钻渣泥浆进行沉淀和固化处理，禁止将钻渣泥浆排入周围农田和河流中。主体设计中已考虑在施工期间于灌注桩基础旁设置泥浆沉淀池，共设置 14 座。

防尘网苫盖：本方案补充在施工期间对施工区域临时堆土以及裸露地表进行苫盖，苫盖面积约 3500m²。

土质排水沟：本方案补充在施工期间于塔基施工区域四周设置临时土质排水沟，共计开挖排水沟 980m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深

0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 78.4m³。

土质沉沙池：本方案补充在塔基排水沟末端设置沉沙池，共计 14 座，沉沙池放坡 1:1 开挖，池口尺寸长×宽为 3m×2.5m，深 1m，容积 3m³，开挖土方 42m³。

(2) 牵张场及跨越场区

①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对牵张场及跨越场区全区进行土地整治，整治面积约 1900m²，主要包括场地清理、平整，整治后的土地达到复垦条件后全部交由土地权所有人进行复耕。

②临时措施

铺设钢板：本工程主体设计中已考虑在施工期间对牵张场及跨越场区内机械占压区域铺设一定数量的钢板，施工结束后土地整治即可恢复原地貌，铺设面积约 700m²。

彩条布铺垫：本方案补充在施工期间对牵张场及跨越场区域裸露地表进行彩条布铺垫，铺垫面积约 500m²。

(3) 施工道路区

①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对施工道路区全区进行土地整治，土地整治面积约 3560m²，主要包括场地清理、平整，整治后的土地约 3452m² 达到复垦条件后交由土地权所有人进行复耕，其余 108m² 进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期对施工道路区占用的空闲地区采取撒播草籽的措施，撒播面积约 108m²，撒播密度 150kg/hm²，撒播草籽总量为 1.62kg。

③临时措施

铺设钢板：本工程主体设计中已考虑在施工期间对施工道路区内松软路面区域铺设一定数量的钢板，施工结束后土地整治即可恢复地表植被，铺设面积约 3200m²。

2.2.3 水土保持措施工程量汇总

本工程水土保持措施工程量详见表 2.2-2。

表 2.2-2 本工程水土保持措施工程量汇总表

防治分区	措施类型		内容类别	单位	数量	布设位置	结构形式/ 植被类型	实施 时间	
塔基区	工程措施	主体 已有	表土剥离	m ³	598	永久占地、泥浆沉淀池和拆除基础等开挖区域	剥离厚度 0.3m, 剥离面积 1992m ²	2026.06-2026.08	
			土地整治	m ²	5280	除硬化外裸露地表	场地清理、平整、覆土	2026.10	
	植物措施	主体 已有	撒播草籽	m ²	415	占用空闲地区域	狗牙根草籽, 密度 0.015kg/m ²	2026.10	
	临时措施	主体 已有	泥浆沉淀池	座	14	灌注桩基础旁	半挖半填	2026.06-2026.08	
			方案 新增	防尘网苫盖	m ²	3500	临时堆土及裸露地表	6 针	2026.06-2026.09
		方案 新增	土质 排水 沟	长度	m	980	塔基施工区域四周	上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m	2026.06-2026.08
				土方量	m ³	78.4			
方案 新增	土质沉沙池	座	14	排水沟末端	顶长×顶宽×深为 3m×2.5m×1m, 坡比 1:1	2026.06-2026.08			
牵张场及跨越场区	工程措施	方案 新增	土地整治	m ²	1900	全区	场地清理、平整	2026.10	
	临时措施	主体 已有	铺设钢板	m ²	700	机械占压区域	6mm 厚钢板	2026.08-2026.09	
		方案 新增	彩条布铺垫	m ²	500	裸露地表	三色防水布	2026.08-2026.09	
施工道路区	工程措施	方案 新增	土地整治	m ²	3560	全区	场地清理、平整	2026.10	
	植物措施	方案 新增	撒播草籽	m ²	108	占用空闲地区域	狗牙根草籽, 密度 0.015kg/m ²	2026.10	
	临时措施	主体 已有	铺设钢板	m ²	3200	松软路面区域	6mm 厚钢板	2026.06-2026.09	

2.2.4 防治措施进度安排

参照主体工程施工进度, 各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施, 相互协调, 有序进行。坚持“因地制宜, 因害设防”的原则, 首先安排水土流失严重区域的防治措施, 在措施安排上, 工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑, 施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排, 植物措施可略为滞后, 但须根据植物的生物学特性, 合理安排季节实施, 并在总工期内完成所有水土保持措施。

表2.2-3 主体工程与水土保持工程实施进度表

防治分区	工程名称		施工期				
			2026年				
			6月	7月	8月	9月	10月
塔基区	主体工程		——	——	——	——	——
	工程措施	表土剥离	——	——	——		
		土地整治					——
	植物措施	撒播草籽					——
	临时措施	泥浆沉淀池	——	——	——		
		防尘网苫盖	——	——	——	——	
		土质排水沟	——	——	——		
土质沉沙池		——	——	——			
牵张场及跨越场区	工程措施	土地整治					——
	临时措施	铺设钢板			——	——	
		彩条布铺垫			——	——	
施工道路区	工程措施	土地整治					——
	植物措施	撒播草籽					——
	临时措施	铺设钢板	——	——	——	——	

注：“——”为主体工程进度；“——”为水土保持措施进度。

3 水土保持投资估算及效益分析

3.1 投资估算成果

本项目水土保持总投资为36.39万元，其中工程措施费用2.14万元；植物措施费用0.08万元；临时措施费用21.59万元，独立费用9.80万元（其中建设管理费4.70万元、工程建设监理费0.60万元、科研勘测设计费4.50万元），基本预备费1.68万元，水土保持补偿费为10994元，计为1.0994万元。

表 3.1-1 本工程水土保持投资估算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	主体已有	方案新增	合计
1	第一部分工程措施	1.89	0.25	2.14
2	第二部分植物措施	0.06	0.02	0.08
3	第三部分临时措施	18.89	2.70	21.59
4	第四部分独立费用	5.62	4.18	9.80
	一至四部分合计	26.46	7.15	33.61
5	基本预备费 5%	1.32	0.36	1.68
6	水土保持补偿费	1.0994	0	1.0994
7	水土保持总投资	28.88	7.51	36.39

表 3.1-2 水土保持工程措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
一	塔基区	/	/	/	1.89
(一)	表土保护工程				1.65
1	表土剥离*	m ²	1992	0.75	0.15
2	表土回覆*	m ³	598	25.15	1.50
(二)	土地整治工程				0.24
1	土地整治*				0.24
	全面整地	m ²	5280	0.45	0.24
二	牵张场及跨越场区	/	/	/	0.09
(一)	土地整治工程				0.09
1	土地整治				0.09
	全面整地	m ²	1900	0.45	0.09
三	施工道路区	/	/	/	0.16
(一)	土地整治工程				0.16
1	土地整治				0.16
	全面整地	m ²	3560	0.45	0.16
合计	/	/	/	/	2.14

注：带“*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-3 水土保持植物措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
一	塔基区	/	/	/	0.06

(一)	植被恢复与建设工程				0.06
1	撒播草籽*				0.06
	直播种草/不覆土	m ²	415	1.45	0.06
二	施工道路区	/	/	/	0.02
(一)	植被恢复与建设工程				0.02
1	撒播草籽				0.02
	直播种草/不覆土	m ²	108	1.45	0.02
合计	/	/	/	/	0.08

注：带“*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-4 水土保持临时措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
一	临时防护工程				20.97
(一)	塔基区	/	/	/	5.03
1	泥浆沉淀池*	座	14	1960	2.74
2	土质排水沟	m ³	78.4	25.38	0.20
3	土质沉沙池	m ³	42	23.60	0.10
4	临时覆盖				1.99
	防尘网苫盖	m ²	3500	5.69	1.99
(二)	牵张场及跨越场区	/	/	/	3.14
1	铺设钢板*	m ²	700	40	2.80
2	彩条布铺垫	m ²	500	6.80	0.34
(三)	施工道路区	/	/	/	12.80
1	铺设钢板*	m ²	3200	40	12.80
二	其他临时工程	%	2	22200	0.04
三	施工安全生产专项	%	2.5	231900	0.58
合计	/	/	/	/	21.59

注：带“*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-5 本工程水土保持其他费用估算详表

独立费用			
序号	费用名称	计算依据	合计(万元)
一	建设管理费	/	4.70
1	项目经常费	(第一~第三部分)×2.5%	0.60
2	水保专项验收	/	4.00
3	技术咨询费	(第一~第三部分)×0.4%	0.10
二	工程建设监理费	/	0.60
三	科研勘测设计费	/	4.50
1	工程科学研究试验费	/	/
2	工程勘测设计费	/	4.50
	水土保持方案编制费	/	4.50
合计			9.80

水土保持补偿费		
防治责任范围 (m ²)	单价 (元/m ²)	水土保持补偿费 (元)
10994	1	10994

3.2 效益分析

3.2.1 水土流失治理度

至设计水平年，项目建设可能造成的水土流失总面积 10994m²，水土流失治理达标面积 10982m²，水土流失治理度可达到 99.9%。具体计算见表 3.2-1。

表 3.2-1 水土流失治理度计算表

分区	防治责任范围面积 (m ²)	水土流失面积 (m ²)	水土流失治理达标面积 (m ²)				水土流失治理度 (%)	防治标准 (%)	是否达标
			建筑物及场地道路硬化面积	工程措施	植物措施	合计			
塔基区	5534	5534	254	4865	410	5529	99.9	92	达标
牵张场及跨越场区	1900	1900	0	1900	0	1900			
施工道路区	3560	3560	0	3452	101	3553			
综合值	10994	10994	254	10217	511	10982			

注：水土流失治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再重复计列。

3.2.2 土壤流失控制比

通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内的治理后每平方公里年均土壤流失量将小于水土流失防治责任范围内容许土壤流失量，项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量为 200t/(km²·a)，至设计水平年，各项水保措施发挥作用后，治理后每平方公里年平均土壤流失量可达到 140t/(km²·a)，控制比可达到 1.4。

3.2.3 渣土防护率

本项目临时堆土量约 2460m³，实际挡护的临时堆土量约 2448m³，渣土防护率可达到 99.5%。

3.2.4 表土保护率

本项目可剥离表土总量为 3139m³，在采取保护措施后保护表土数量为 2938m³，其中剥离保护的表土 598m³，通过苫盖的表土量为 2340m³，表土保护率可达到 93.6%。

3.2.5 林草植被恢复率

本工程可恢复林草植被面积 523m²，林草类植被面积 511m²，林草植被恢复率可达到 97.7%。

表 3.2-2 林草植被恢复率计算表

防治分区	可恢复林草植被面积 (m ²)	林草类植被面积 (m ²)	林草植被恢复率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	415	410	97.7	95	是
施工道路区	108	101			
综合值	523	511			

3.2.6 林草覆盖率

本项目建设总占地面积约 10994m²，根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018) 4.0.5 节规定恢复耕地面积在计算林草覆盖率时可在防治责任范围中扣除，因此本项目扣除恢复耕地后的建设总占地面积 777m²，方案实施后林草类植被面积为 511m²，林草覆盖率可达到 65.8%。

表 3.2-3 林草覆盖率统计表

防治分区	防治责任范围 (m ²)	恢复耕地面积 (m ²)	扣除恢复耕地后面积 (m ²)	林草类植被面积 (m ²)	林草覆盖率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	5534	4865	669	410	65.8	22	是
牵张场及跨越场区	1900	1900	0	0			
施工道路区	3560	3452	108	101			
合计	10994	10217	777	511			

3.2.7 六项指标达标情况

通过计算分析，至设计水平年水土流失防治目标的实现情况为：水土流失治理度 99.9%、土壤流失控制比 1.4、渣土防护率 99.5%、表土保护率 93.6%、林草植被恢复率 97.7%、林草覆盖率 65.8%。

表 3.2-4 防治效果汇总表

评估指标	计算方法	计算依据	单位	数量	计算结果	防治目标	达标情况
水土流失治理度 (%)	项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比	水土流失治理达标面积	m ²	10982	99.9	92	达标
		水土流失总面积	m ²	10994			
土壤流失控制比	项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比	容许土壤流失量	t/(km ² ·a)	200	1.4	1.0	达标
		治理后每平方公里年平均	t/(km ² ·a)	140			

评估指标	计算方法	计算依据	单位	数量	计算结果	防治目标	达标情况
		均土壤流失量					
渣土防护率(%)	项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比	拦挡临时堆土量	m ³	2448	99.5	95	达标
		临时堆土总量	m ³	2460			
表土保护率(%)	项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比	保护的表土数量	m ³	2938	93.6	92	达标
		可剥离表土总量	m ³	3139			
林草植被恢复率(%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比	林草类植被面积	m ²	511	97.7	95	达标
		可恢复林草植被面积	m ²	523			
林草覆盖率(%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比	林草类植被面积	m ²	511	65.8	22	达标
		项目建设区面积(扣除恢复耕地面积)	m ²	777			

3.3 水土保持管理

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），确保本水土保持方案防治措施按“三同时”的要求顺利实施，充分发挥水土保持措施的作用，使项目建设过程中的水土流失控制在方案目标值以内，促进项目区及周边生态环境的良性发展，特提出以下保证措施。

3.3.1 组织管理

根据国家有关法律法规，本工程水土保持方案为报告表项目，实施承诺制管理。建设单位承诺已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务；所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失，项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备；依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费；积极配合水土保持监督检查；愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。水土保持方案在报批前，生产建设单位应当通过其网站、生产建设项目所在地公共媒体网站或者相关政府网站向社会公开拟报批的水土保持方案全文，且持续公开期限不得少于10个工作日。对于公众提出的问题和意见，生产建设单位应当逐一处理与回应，并在水土保持行政许可承诺书中予以说明。

报告表经江苏省水利厅批复后，建设单位将成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，全力保证水土保持工作按计划进行。水土保持方案实施管理机构主要工作职责如下：①认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益；②建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，制定水土保持方案详细实施计划；③工程施工期间，与设计、施工单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持

设施的正常建设,最大限度减少人为造成的水土流失与生态环境的破坏;④深入工程现场进行检查,掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况;⑤建立、健全各项档案,积累、分析整编资料,为水土保持工程验收提供相关资料。

3.3.2 后续设计

经本方案分析,在全面落实方案提出的各项措施及建议后,本项目从工程选址选线、建设方案和水土流失防治等方面均符合水土保持法律法规、技术标准的规定。本方案各项措施实施后能有效控制因项目建设引起的新增水土流失,最大限度的保护与恢复水土资源与林草植被,基本达到保护生态环境的目的。本项目可研已批复,水土保持应纳入初步设计和施工图设计中。水土保持方案经批准后,对照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号),生产建设项目地点、规模发生重大变化,水土保持措施发生重大变更的,生产建设单位应当补充水土保持方案变更报告或修改水土保持方案,报原审批机关审批。

3.3.3 水土保持监测和监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)和《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号)中相关规定。对报告表项目水土保持监测工作未提出要求,因此,本工程建设单位可依据需要自行开展水土保持监测工作。凡主体工程开展监理工作的生产建设项目,应当按照国家建设监理、水土保持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件、工程施工合同、监理合同等,开展水土保持监理工作,由于本工程征占地面积在50公顷以下且挖填土石方总量在50万立方米以下,因此不对水土保持监理单位的人员配备和资质提出要求。

3.3.4 水土保持施工

施工过程中应注重保护表土植被,严格控制和管理车辆机械的运行范围,必要时设立保护地表及植被的警示牌,防止扩大对地表的扰动。对临时排水设施应进行经常性检查维护,保证其排水通畅。对建成的水土保持设施应有明确的管理维护要求。工程措施施工时,应对施工质量实时检查,对不符合设计要求或质量要求的工程,责令其重建,直到满足要求为止。植物措施工程施工时,应注意加强植物措施的后期管护工作,确保各种植物的成活率,发挥植物措施的水土保持效益。

3.3.5 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》的通知（苏水规〔2021〕8号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），生产建设项目的水土保持设施验收，由生产建设单位自主开展。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。存在下列情形之一的，水土保持设施验收结论应当为不合格：①未依法依规履行水土保持方案及重大变更编报审批程序的；②弃土弃渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；③水土保持措施体系、等级和标准或者水土流失防治指标未按照水土保持方案批复要求落实的；④存在水土流失风险隐患的；⑤水土保持设施验收材料明显不实、内容存在重大缺项、遗漏的；⑥水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的；⑦未依法依规缴纳水土保持补偿费的；⑧存在法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形的。

本项目为编制水土保持方案报告表项目，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织验收工作，形成验收鉴定书，明确验收结论。验收合格意见应当经三分之二以上验收组成员同意并签字。实行承诺制或者备案制管理的项目，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。


生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收鉴定书，公示时间不得少于20个工作日。生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，在水土保持设施验收通过3个月内向省水利厅报备验收材料。依法编制水土保持报告表和实行承诺制管理的生产建设项目，水土保持设施验收报备时只需提交水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书和向社会公开的时间、地点及方式等材料。

生产建设项目水土保持设施验收合格后，生产建设单位或者运行管理单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，

确保水土保持设施长期发挥效益。

附


图

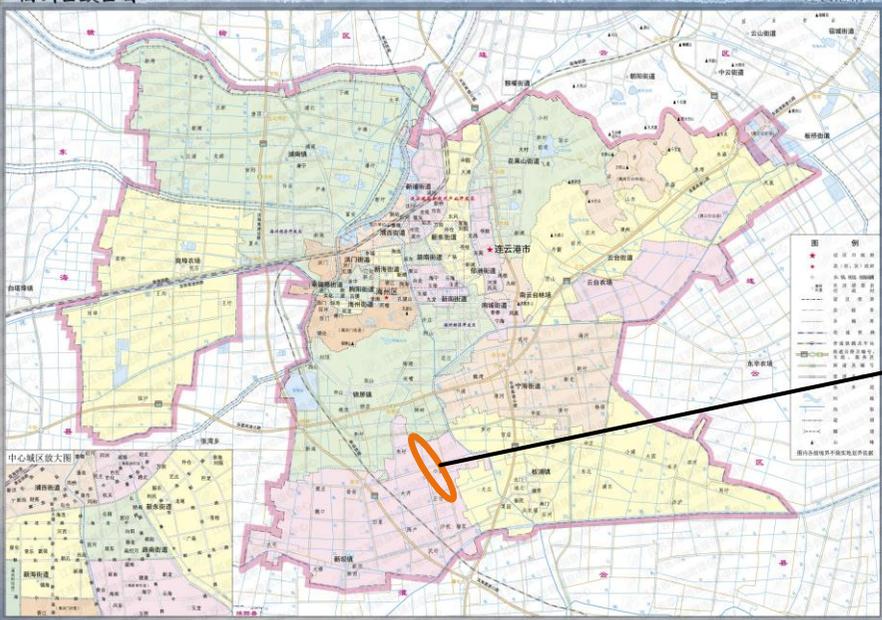

江苏省自然资源厅 审图号:苏S(2021)021号

比例尺:1:100,000

2021年12月



江苏连云港海州区新坝镇现代高效农业科技示范园
(农光互补示范园) 项目110千伏送出工程

图例
— 本期新建架空线路

附图1 项目地理位置图
