

江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴

光伏发电示范项目 110 千伏送出工程

# 水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

2026 年 2 月

江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴

光伏发电示范项目 110 千伏送出工程

# 水土保持方案报告表

建设位：国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

2026 年 2 月

## 江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 110 千伏送出工程 水土保持方案报告表

项目概况	位置	项目位于连云港市海州区宁海街道、板浦镇。瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程起于 110kV 日出东方光伏升压站 (N34°28'26.94", E119°16'04.89"), 终于 110kV 凤洲 737 线新立 T 接塔 (N34°30'50.11", E119°15'23.15"); 邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程起于本期新建 T9 (N34°29'26.87", E119°16'15.37"), 终于 110kV 邓浦 868 线新立 T 接塔 (N34°29'30.29", E119°16'16.22")。				
	建设内容	<p>根据初设规模,本工程由点型工程和线型工程组成,点型工程包括:本期更换 110kV 间隔保护 4 回,均不涉及土建;线型工程包括:新建架空线路路径长约 5.352km,新建杆塔 24 基;新建电缆线路路径长 0.73km,电缆土建通道长 0.825km。具体包括:</p> <p>(1) 点型工程</p> <p>①凤凰 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程:本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回,不涉及土建。</p> <p>②瀛洲 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程:本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回,不涉及土建。</p> <p>③邓庄 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程:本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回,不涉及土建。</p> <p>④板浦 110 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程:本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回,不涉及土建。</p> <p>(2) 线型工程</p> <p>①瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程:新建双回架空线路路径长约 5.272km,其中双设双架路径长 2.195km,新建双设单架路径长 3.077km。新建角钢塔 23 基,均采用灌注桩基础;新建电缆线路路径长 0.73km,电缆土建通道长度 0.825km,采用电缆排管、电缆井、电缆直埋和拉管相结合的方式敷设。</p> <p>②邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程:新建双设单架架空线路路径长 0.08km,新建 1 基角钢塔,采用灌注桩基础。</p>				
	建设性质	新建输变电工程		总投资(万元)		/
	土建投资(万元)	/		占地面积(m <sup>2</sup> )		永久: 3098 临时: 17811 总面积: 20909
	动工时间	2026 年 8 月		完工时间		2027 年 1 月
	土石方(m <sup>3</sup> )	挖填方总量	挖方	填方	借方	余(弃)方
		18506	9044	9462	1960	1542
	取土(石、砂)场	/				
	弃土(石、砂)场	/				
	项目区概况	涉及重点防治区情况	/		地貌类型	平原
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]	140		容许土壤流失量[t/(km <sup>2</sup> ·a)]	200	
项目选址(线)水土保持评价		项目选址(线)不涉及水土流失重点预防区和重点				

江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 110 千伏送出工程  
水土保持方案报告表

		治理区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。因此，项目无水土保持制约因素。		
预测水土流失总量 (t)		33.31		
防治责任范围 (m <sup>2</sup> )		20909		
防治标准等级及目标	防治标准等级		北方土石山区一级标准	
	水土流失治理度 (%)		95	土壤流失控制比 1.0
	渣土防护率 (%)		99	表土保护率 (%) 95
	林草植被恢复率 (%)		97	林草覆盖率 (%) 27
水土保持措施	防治分区	工程措施		植物措施
	塔基区	表土剥离 1011m <sup>3</sup> 土地整治 7694m <sup>2</sup>		撒播草籽 1970m <sup>2</sup> 泥浆沉淀池 25 座 土质排水沟 1600m 土质沉沙池 20 座 防尘网苫盖 6000m <sup>2</sup>
	电缆施工区	表土剥离 102m <sup>3</sup> 土地整治 3603m <sup>2</sup>		撒播草籽 1672m <sup>2</sup> 泥浆沉淀池 2 座 土质排水沟 177m 土质沉沙池 3 座 防尘网苫盖 2300m <sup>2</sup>
	施工道路区	土地整治 6040m <sup>2</sup>		撒播草籽 1800m <sup>2</sup> 铺设钢板 4000m <sup>2</sup>
	牵张场及跨越场区	土地整治 1400m <sup>2</sup>		/ 铺设钢板 1000m <sup>2</sup>
	总投资	52.08		
水土保持投资估算 (万元)	工程措施	3.92		植物措施 0.79
	临时措施	31.44		水土保持补偿费 2.0909
	独立费用	建设管理费		5.54
		工程建设监理费		0.91
		科研勘测设计费		5
编制单位	江苏辐环环境科技有限公司		建设单位 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司	
法人代表及电话	潘葳 /		法人代表及电话 车凯 /	
地址	南京市建邺区庐山路 168 号 1011 室		地址 连云港市海州区幸福路 1 号	
邮编	210019		邮编 222000	
联系人及电话	胡菲 /		联系人及电话 吴昊 /	
电子信箱	/		电子信箱 /	
传真	/		传真 /	

## 方案报告表补充说明

### 1 项目简况

#### 1.1 项目概况

##### 1.1.1 项目基本情况

建设地点：项目位于连云港市海州区宁海街道、板浦镇。瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程起于 110kV 日出东方光伏升压站，终于 110kV 凤洲 737 线新立 T 接塔；邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程起于本期新建 T9，终于 110kV 邓浦 868 线新立 T 接塔。

建设必要性：连云港日出东方普能新能源开发有限公司海州区板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目（以下简称“本项目”）位于江苏省连云港市海州区。本项目交流侧光伏建设容量为 150 兆瓦，由连云港日出东方普能新能源开发有限公司投资建设。本项目已获得连云港市海州区行政审批局审批的投资备案证（海审备〔2024〕128 号），本项目已申报并纳入江苏省 2024 年光伏发电市场化并网项目库，需要建设并网线路接入系统变电站。因此，建设本项目是必要的。

前期工作：（1）2025 年 9 月 12 日，连云港市自然资源和规划局以《关于江苏连云港日出东方公司海州区板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 110 千伏送出线路工程路径规划的批复意见》同意了本工程线路路径；（2）2025 年 10 月 29 日，国网江苏省电力有限公司连云港供电公司以《国网江苏省电力有限公司连云港供电公司关于江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 110 千伏送出工程（SDG2025110LY）可行性研究报告的批复》（连电发展可研批复〔2025〕6 号）对本工程可研进行了批复；（3）2026 年 1 月 7 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于南京会山 220 千伏输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2026〕12 号）对本工程核准进行了批复；（4）本工程架空线路穿越六兆河与城北河，建设单位国网江苏省电力有限公司连云港供电公司正在开展本工程防洪评价招标工作，涉及防洪段线路取得洪评许可后方可开工建设，建设单位洪评承诺见附件 6。

工程规模：根据初设规模，本工程由点型工程和线型工程组成，点型工程包括：本期更换 110kV 间隔保护 4 回，均不涉及土建；线型工程包括：新建架空

线路路径长约 5.352km，新建杆塔 24 基；新建电缆线路路径长 0.73km，电缆土建通道长 0.825km。具体包括：

(1) 点型工程

①凤凰 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。

②瀛洲 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。

③邓庄 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。

④板浦 110 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。

(2) 线型工程

①瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程：新建双回架空线路路径长约 5.272km，其中双设双架路径长 2.195km，新建双设单架路径长 3.077km。新建角钢塔 23 基，均采用灌注桩基础；新建电缆线路路径长 0.73km，电缆土建通道长度 0.825km，采用电缆排管、电缆井、电缆直埋和拉管相结合的方式进行敷设。

②邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程：新建双设单架架空线路路径长 0.08km，新建 1 基角钢塔，采用灌注桩基础。

工程占地：项目总占地 20909m<sup>2</sup>，其中永久占地 3098m<sup>2</sup>，临时占地 17811m<sup>2</sup>；主要占用耕地和其他土地。

工程挖填方：项目挖填方总量 18506m<sup>3</sup>，其中挖方总量 9044m<sup>3</sup>（含表土剥离 1113m<sup>3</sup>），填方总量 9462m<sup>3</sup>（含表土回覆 1113m<sup>3</sup>），借方量 1960m<sup>3</sup>，余方量 1542m<sup>3</sup>。

工期安排：项目计划于 2026 年 8 月开工，2027 年 1 月完工，总工期 6 个月。

工程总投资：项目总投资/万元，其中土建投资约/万元。

### 1.1.2 项目组成情况

本工程由国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司统一建设。经济技术指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 项目主要经济技术指标表

基本情况			
项目名称	江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 110 千伏送出工程	工程性质	新建输变电工程
建设单位	国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司	建设期	2026.08~2027.01
建设地点	海州区宁海街道、板浦镇	总投资	/万元
电压等级	110kV	土建投资	/万元
工程规模	<p>根据初设规模，本工程由点型工程和线型工程组成，点型工程包括：本期更换 110kV 间隔保护 4 回，均不涉及土建；线型工程包括：新建架空线路路径长约 5.352km，新建杆塔 24 基；新建电缆线路路径长 0.73km，电缆土建通道长 0.825km。具体包括：</p> <p>(1) 点型工程</p> <p>①凤凰 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。</p> <p>②瀛洲 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。</p> <p>③邓庄 220 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。</p> <p>④板浦 110 千伏变电站 110 千伏间隔保护工程：本站本期更换 110kV 间隔保护 1 回，不涉及土建。</p> <p>(2) 线型工程</p> <p>①瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程：新建双回架空线路路径长约 5.272km，其中双设双架路径长 2.195km，新建双设单架路径长 3.077km。新建角钢塔 23 基，均采用灌注桩基础；新建电缆线路路径长 0.73km，电缆土建通道长度 0.825km，采用电缆排管、电缆井、电缆直埋和拉管相结合的方式进行敷设。</p> <p>②邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程：新建双设单架架空线路路径长 0.08km，新建 1 基角钢塔，采用灌注桩基础。</p>		
架空经济技术指标			
电压等级	110kV		
新建架空线路长度	5.352km		
杆塔使用基数	新建杆塔 24 基		
导线型号	JL3/G1A-400/35		
地线型号	OPGW-120		
电缆经济技术指标			
电压等级	110kV		
新建电缆线路长度	0.73km ( 土建通道长度 0.825km )		
电缆型号	ZC-YJLW <sub>03</sub> -64/110-1×800mm <sup>2</sup>		
电缆敷设方式	排管、电缆井、直埋、拉管		

### 1.1.3 工程布置情况

#### ①瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程

本工程线路自光伏升压站向北同塔双回架空出线，跨越振浦路后向东跨越 35kV 板芦 322 线，至 G204 烟沪线西侧转向北，至孙庄东北侧分为两个单回线路，一回架空线路 T 接 110kV 邓浦 866 线 78#塔东侧接至新建分支塔，另一回线

路转电缆入地继续向北，穿越 110kV 邓浦 866 线、瀛浦 7B6 线，线路经过聚源新能源光伏板区，至燕板线南侧转电缆入地，至沙港新庄精勤中心小学北侧电缆上塔转架空，线路经过聚源新能源光伏板区，至六兆河北侧转向西，在瀛洲变西南侧转向北再向东，T 接至 110kV 凤洲 737 线 18#塔南侧接至新建分支塔。

### ②邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程

线路自孙庄东北侧电缆终端塔（瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程建设），向北架空 T 接 110kV 邓浦 868 线 78#塔东侧接至新建 T 接塔。

图 1.1-1 线路路径图

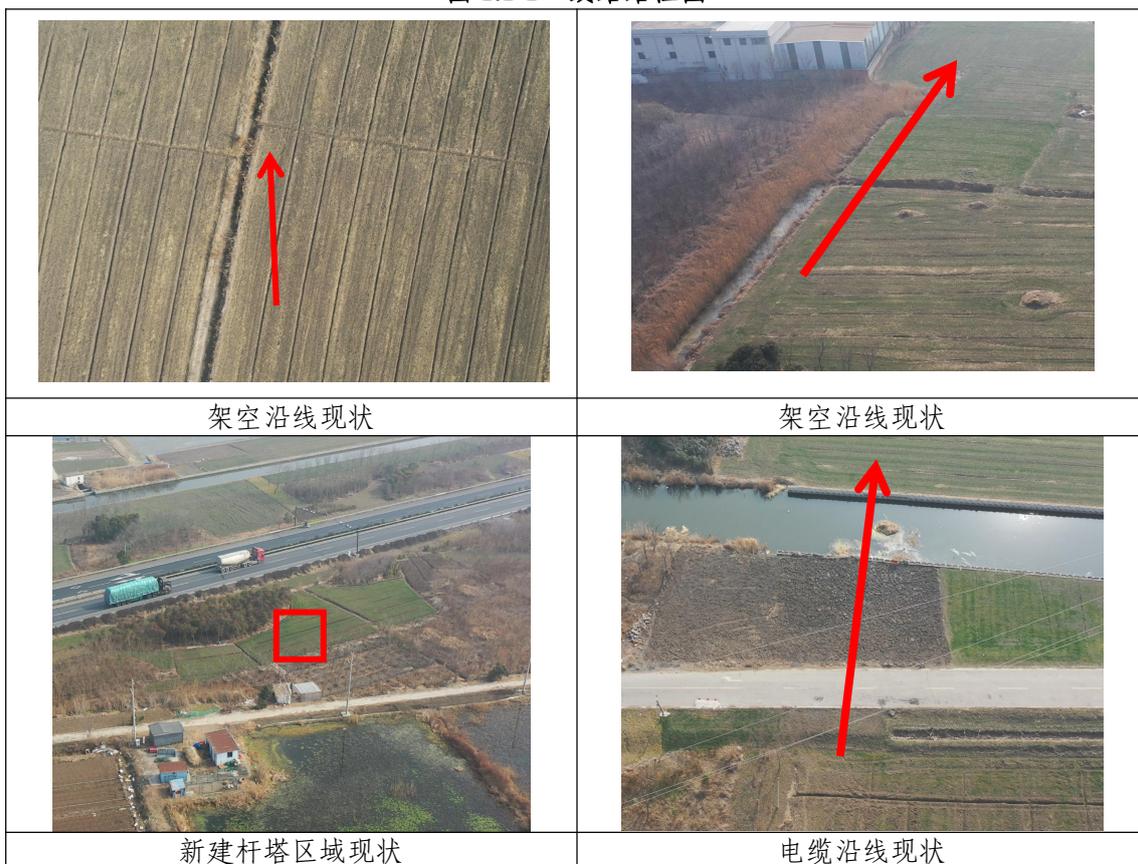


图 1.1-2 本工程线路沿线现状照片

### (1) 竖向设计

本工程线路沿线地面高程一般为 0.00~4.00m（1985 国家高程基准，下同），线路沿线地势略有起伏，水系发育，主要为耕地和其他土地。




图 1.1-3 本工程塔基基础一览图

表 1.1-3 本工程塔基竖向设计一览表


基础类型	适用塔型	呼高 (m)	基础数量	桩数 (个)	桩直径宽 (m)	埋深 (m)
<b>瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程</b>						
灌注桩基础	110-EC21S-Z1	27	4	1	0.8	10
			8	1	0.8	12
	110-EC21S-Z2	30	8	1	0.8	10
			12	1	0.8	12
		33	4	1	0.8	12
	110-ED21S-J4	21	8	1	1.6	16
			8	1	1.6	20
		24	4	1	1.6	16
			4	1	1.6	20
		33	2	1	1.6	16
			2	1	1.6	20
	110-ED21S-DJ	18	2	1	1.6	16
			2	1	1.6	18
		21	8	1	1.6	20
		24	4	1	1.6	16
			4	1	1.6	18
	30	2	1	1.6	16	
		2	1	1.6	20	
110-ED21S-TJ	18	4	1	1.6	20	
终端立柱平台			12	1	0.8	8
<b>邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程</b>						

灌注桩基础	110-ED21S-DJ	21	4	1	1.6	18
-------	--------------	----	---	---	-----	----

表 1.1-4 本工程电缆竖向设计一览表


类型		长度 (m)	开挖宽度 (m)	深度 (m)
电缆井	转角井 (2 座)	11	2.30	3.35
	直线井 (4 座)	36	2.30	3.35
排管		35	1.075	1.955
直埋		95	1.00	1.40
拉管 (2 处)		648	0.95 (管径)	
合计		825	/	

注：直线井与转角井覆土 h 按 0.3m 计；电缆排管覆土 H 按 0.7m 计。

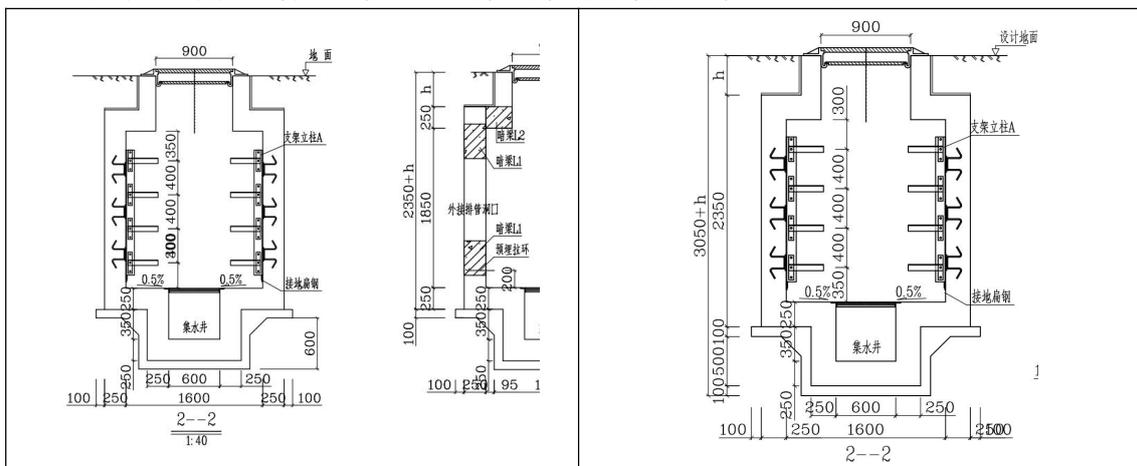


转角井断面图

直线井断面图

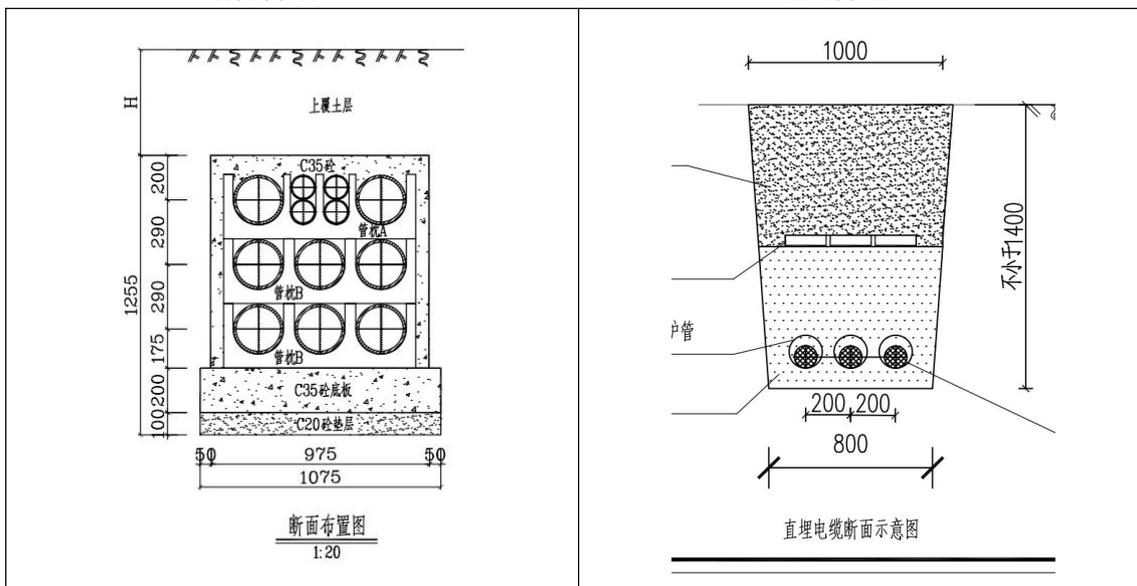

排管断面图

直埋断面图

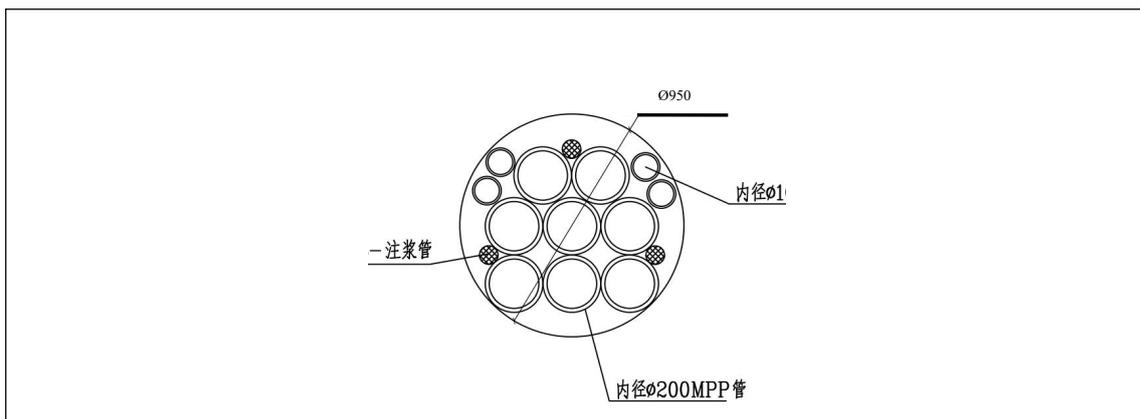

拉管断面图

图 1.1-4 电缆土建断面图

### (3) 施工组织

#### ① 施工用水、排水、用电、通信系统

用水：线路塔基及每段电缆施工用水量较少，施工供水可就近采用取水管引接附近河流抽水取水。

排水：施工过程中的雨水通过土质排水沟收集、经沉沙池沉淀处理后排入临近排水沟中。本工程外排雨水均通过沉沙池沉淀处理，且外排水量较小，不会对附近的排水沟造成影响。

用电：施工过程中用电根据周边设施情况安排，周围已有用电用户区，可按照安全用电规定引接用于施工用电，无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源。

通信：本工程施工场地内施工人员相对较少，可利用无线通信设备进行联络。

#### ② 施工生产生活区

本工程沿线拟租用已有库房或场地作为材料站，具体地点由施工单位根据施工中具体情况选定，便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。线路工程不设置固定的施工生活区，采取租用附近民房的方式，施工生产区布设在各区域的临时占地中。

#### ③ 临时堆土

塔基施工开挖的土方临时堆放在施工区域内设置的临时堆土区，并采用防尘网进行苫盖；电缆施工开挖土方临时堆放在开挖区域两侧，采取防尘网进行苫盖，并在远离开挖区域的一侧设置临时土质排水沟和沉沙池。表土在区域内单独设置堆土场地与其他土方分开，堆土边坡比不大于 1:1.0，堆土高度不超过 2.5m，施

工后期全部回填并压实平整。

#### ④施工道路

本工程交通尽量利用项目沿线已有的国道、省道、县道，在已有的乡道和村道不能满足运输要求时适当地加宽改造。在无现有道路的情况下，开辟新的施工临时道路。经过实地踏勘本工程需设临时施工道路，长度约 1510m，平均宽度约 4m，总占地面积约 6040m<sup>2</sup>。

#### ⑤牵张场设置

为方便机械设备和导线的运输与吊装，在牵张场地内规划出施工通道，通道宽度在 3.0m 左右，一般满足一辆大卡车通行便可，通道做适当平整后铺设钢板，钢板铺设做到横平竖直，钢板搭头无上翘。根据工程路线走向及地形条件，本工程布设牵张场 2 处，平均每处占地面积为 600m<sup>2</sup>，因此牵张场总占地面积约为 1200m<sup>2</sup>。

#### ⑥跨越施工场地

本工程沿线需跨越六兆河 1 次，城北河 1 次，共考虑布置 2 处跨越施工场地，平均每处占地面积约为 100m<sup>2</sup>，因此跨越场总占地面积为 200m<sup>2</sup>，工程主要跨越情况统计表见表 1.1-5。

表 1.1-5 工程主要跨越情况统计表

序号	跨越对象	备注
1	河流	1 次六兆河、1 次城北河
合计		有 2 次跨越，结合现场跨越情况共布设跨越场 2 处，占地共 200m <sup>2</sup> 。
		
城北河		

图 1.1-5 工程主要跨越河流

### (4) 施工工艺

#### ①塔基施工

### 1) 表土剥离保护

塔基开挖前做好表层土壤的剥离和保护，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，顶部采用防尘网进行苫盖。

### 2) 灌注桩基础

塔基灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔：成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注入人工泥浆或利用钻削下来的粘性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。扩壁泥浆与钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。当钻孔达到规定深度后，安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的泥浆被抽吸出来，施工结束后，泥浆在泥浆沉淀池中沉淀干化，就地深埋于施工区域 1.0m 以下。每基灌注桩基础施工场地需设置一个泥浆沉淀池。

本工程新建 5 基杆塔位于塘埂边缘，施工前先填土夯实，随后灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔，成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注入人工泥浆或利用钻削下来的粘性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。扩壁泥浆与钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。当钻孔达到规定深度后，安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的泥浆被抽吸出来，施工结束后，泥浆在泥浆沉淀池中沉淀干化，就地深埋于施工区域 1.0m 以下。灌注桩基础施工场地需设置一个泥浆沉淀池。填土范围为塔基根开外扩 8m，回填深度约 1.8m，施工结束后由土方运输单位将除铁塔根开范围外多余的填土清走。

### ② 电缆施工

电缆开挖前做好表层土壤的剥离和保护，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分别堆放在电缆临时施工场地内，堆土表面采用防尘网进行苫盖。

电缆施工采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，管道敷设顺序为：测量定线→清除障碍物→平整工作带→管沟开挖→钢管运输、布管→组装焊接→下沟→回填→竣工验收。挖完直埋电缆沟后，在沟底铺砂垫层，并清除沟内杂物，再敷设电缆，电缆敷设完毕后，要马上再填砂，并在电缆上面盖一层砖或者混凝土板来保护电缆。土方回填时按照后挖先填、先挖后填的原则进行施工。电缆工井中电缆采用三角排列，镀锌角钢臂式支撑。电缆支架通过开脚螺栓与电缆构筑物外接地装置相连；排管段电缆采用三角排列。

拉管施工前，应查明管道拟穿越地段的建筑基础，地下障碍物及各类地下管线的性质类型及空间位置，必要时请相关管线监护人员现场监护。拉管出入土角度不应大于  $20^\circ$ ，拉管轨迹的转弯半径应大于  $150\text{m}$ 。拉管与地下管线平行敷设时，扩孔与既有管线垂直净距不得小于 1.5 倍扩孔直径；拉管与既有管线交叉时，拉管与既有管线的垂直净距应大于 1 倍扩孔直径且不小于  $0.5\text{m}$ 。回拖管道过程中应避免发生扭转，拉管内应预留绳索且两端做好标记一一对应，以便电缆敷设；拉管施工完成后，必须在回扩孔内压密注浆以防塌陷；暂时不使用的管道应及时封堵。拉管管片采用钢筋混凝土，拉管内置电缆保护管，管材材质采用 MPP 管。拉管施工占地主要为拉管两头临时施工占地，拉管每处占地面积约为  $800\text{m}^2$ 。拉管的工作井与接收井均布置在临时占地内。

#### 1.1.4 工程占地情况

本工程总占地面积为  $20909\text{m}^2$ ，其中永久占地为  $3098\text{m}^2$ ，临时占地为  $17811\text{m}^2$ 。永久占地包括塔基区  $3090\text{m}^2$ ，电缆施工区  $8\text{m}^2$ ；临时占地包括塔基区  $6768\text{m}^2$ ，电缆施工区  $3603\text{m}^2$ ，施工道路区  $6040\text{m}^2$ ，牵张场及跨越场区  $1400\text{m}^2$ 。

##### (1) 塔基区

本工程新建架空线路长约  $5.352\text{km}$ ，新建一般角钢塔 17 基，电缆终端塔 7 基，新建电缆立柱平台 4 基。根据塔基施工典型设计，新建角钢塔施工总占地按  $(\text{根开}/1000 + \text{基础立柱宽} + 12\text{m})^2 / \text{基}$  计算，其中一般角钢塔永久占地按  $(\text{根开}/1000 + \text{基础立柱宽} + 2\text{m})^2 / \text{基}$  计算，电缆终端塔按  $(\text{根开}/1000 + \text{基础立柱宽} + 5\text{m})^2 / \text{基}$  计算；终端立柱平台与本期新建终端塔基共用场地，故独立电缆终端平台永久占地面积及施工临时占地面积不再重复计列。

本工程塔基区总占地面积  $9858\text{m}^2$ ，其中永久占地  $3090\text{m}^2$ ，临时占地  $6768\text{m}^2$ 。本工程线路铁塔占地情况见表 1.1-6。

表 1.1-6 本工程线路铁塔占地情况

塔基性质	铁塔型号	基数	根开/ 根径 (mm)	基础立柱 宽 (m)	永久占 地( $\text{m}^2$ )	临时占 地( $\text{m}^2$ )	总占地 ( $\text{m}^2$ )
<b>瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程</b>							
一般角 钢塔	110-EC21S-Z1	3	5110	0.8	188	774	962
	110-EC21S-Z2	5	5812	0.8	371	1361	1732
		1	6262	0.8	82	281	363
	110-ED21S-J4	4	7062	1.6	455	1253	1708

		2	7800	1.6	260	656	916
		1	10009	1.6	185	372	557
	110-ED21S-TJ	1	8750	1.6	153	347	500
电缆终端塔	110-ED21S-DJ	1	6382	1.6	169	230	399
		2	7091	1.6	375	481	856
		2	7800	1.6	415	501	916
		1	9218	1.6	250	271	521
终端立柱平台	4	/	/				
<b>邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程</b>							
电缆终端塔	110-ED21S-DJ	1	7091	1.6	187	241	428
<b>合计</b>		<b>28</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3090</b>	<b>6768</b>	<b>9858</b>

## (2) 电缆施工区

本工程新建电缆线路 0.73km，新建电缆土建通道长度 0.825km，其中电缆排管 35m，电缆直埋 95m，电缆井 6 座（共 47m），电缆拉管 648m。电缆施工作业宽度为一侧外 6m 用作堆放基础土方，一侧外扩 4m 用作堆放表土及施工机械占压。拉管施工占地主要为拉管两头临时施工占地，拉管每处占地面积约为 800m<sup>2</sup>。电缆施工区总占地面积 3611m<sup>2</sup>，其中永久占地 8m<sup>2</sup>，临时占地 3603m<sup>2</sup>。本工程电缆施工占地面积详见表 1.1-7。

表 1.1-7 本工程电缆施工占地情况

类型	长度 (m)	宽度 (m)			永久占地面积 (m <sup>2</sup> )	临时占地面积 (m <sup>2</sup> )	总占地面积 (m <sup>2</sup> )	
		开挖宽度	盖板直径	施工范围				
电缆井	转角井 (2 座)	11	2.3	0.9	12.3	3	132	135
	直线井 (4 座)	36	2.3	0.9	12.3	5	438	443
排管		35	1.075	/	11.075	0	388	388
直埋		95	1	/	11	0	1045	1045
拉管 (2 处)		648	0.95 (管径)			0	1600	1600
<b>合计</b>		<b>825</b>	<b>/</b>			<b>8</b>	<b>3603</b>	<b>3611</b>

注：电缆井上不覆土，永久占地计列方式为  $(\text{盖板直径}/2)^2 \times \pi$ 。直线井和转角井每座有 2 个盖板。

## (3) 施工道路区

本工程需布设施工临时道路长度约 1510m，平均宽度约 4m，施工临时道路用地为 6040m<sup>2</sup>。

## (4) 牵张场及跨越场区

本工程沿线需设置牵张场 2 处，平均每处占地面积约为 600m<sup>2</sup>。沿线共需设置跨越场地 2 处，跨越六兆河和城北河，占地面积约为 100m<sup>2</sup>。因此，本工程牵

张场及跨越场区总占地面积为 1400m<sup>2</sup>，均为临时占地。

本工程各分区占地情况见表 1.1-8。

表 1.1-8 工程各分区占地情况统计表 单位: m<sup>2</sup>

工程分区	占地类型		面积合计	占地面积	
	永久占地	临时占地		耕地	其他土地
塔基区	3090	6768	9858	6188	3670
电缆施工区	8	3603	3611	1931	1680
施工道路区	0	6040	6040	4240	1800
牵张场及跨越场区	0	1400	1400	1400	0
<b>总计</b>	<b>3098</b>	<b>17811</b>	<b>20909</b>	<b>13759</b>	<b>7150</b>

注:本工程塔基区占用的其他土地为空闲地和设施农用地,其余分区占用的其他土地为空闲地。

### 1.1.5 土石方平衡情况

#### (1) 塔基区

塔基区占用耕地、空闲地和设施农用地,施工前期对塔基区开挖植被良好区域进行表土剥离,剥离面积 3370m<sup>2</sup>,可剥离表土厚度为 30cm,表土剥离量为 1011m<sup>3</sup>。剥离的表土堆放在塔基区的临时堆土区域,临时堆土采用防尘网临时苫盖。施工结束后对塔基区进行土地整治,土地整治后将前期剥离表土全部回覆利用,表土回覆量为 1011m<sup>3</sup>。通过现场勘查和查阅设计资料,本工程新建 5 基塔基位于塘埂边缘,塘中塔位基础施工采用先回土夯实再进行钻孔施工的方式。填土范围为塔基根开外扩 8m,回填深度约 1.8m,本工程需填土 1960m<sup>3</sup>,施工结束后应恢复原本地貌,需将铁塔根开范围外多余的填土清走,需外运土方 1542m<sup>3</sup>。

通过现场勘查和查阅设计资料,挖填土方情况统计见表 1.1-9。

表 1.1-9 线路工程新建杆塔基础挖填方一览表

基础类型	适用塔型	呼高 (m)	基础数量	桩径 (m)	埋深 (m)	泥浆量 (m <sup>3</sup> )	泥浆沉淀池挖方量 (m <sup>3</sup> )	挖方量 (m <sup>3</sup> )	填方量 (m <sup>3</sup> )
<b>瀛洲~凤凰 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程</b>									
灌注桩基础	110-EC21S-Z1	27	4	0.8	10	20	20	40	40
			8	0.8	12	47	47	94	94
	110-EC21S-Z2	30	4	0.8	10	20	20	40	40
			4	0.8	10	20	20	40	40

			12	0.8	12	71	71	142	142
		33	4	0.8	12	24	24	48	48
	110-ED21S-J4	21	8	1.6	16	253	253	506	506
			8	1.6	20	317	317	634	634
		24	4	1.6	16	126	126	252	252
			4	1.6	20	161	161	322	322
		33	2	1.6	16	63	63	126	126
			2	1.6	20	79	79	158	158
	110-ED21S-DJ	18	2	1.6	16	63	63	126	126
			2	1.6	18	71	71	142	142
		21	8	1.6	20	317	317	634	634
			24	4	1.6	16	126	126	252
		4		1.6	18	145	145	290	290
		30	2	1.6	16	63	63	126	126
	2		1.6	20	79	79	158	158	
	110-ED21S-TJ	18	4	1.6	20	158	158	316	316
终端立柱平台			12	0.8	8	46	46	92	92
<b>邓庄~板浦 T 接板浦光伏 110 千伏线路工程</b>									
灌注桩基础	110-ED21S-DJ	21	4	1.6	18	145	145	290	290
<b>合计</b>			<b>104</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>2394</b>	<b>2394</b>	<b>4788</b>	<b>4788</b>

注：位于塘中塔基的泥浆量=基础数量 $\times\pi\times(\text{桩径}/2)^2\times\text{埋深}$ ，位于空闲地和耕地中的塔基泥浆量=基础数量 $\times\pi\times(\text{桩径}/2)^2\times(\text{埋深}-0.3)$ ，灌注桩基础塔基挖方量=泥浆量+泥浆池挖方量。

通过上表计算可得，全线塔基基础开挖产生的土方共约为 4788m<sup>3</sup>。施工期在位于耕地和空闲地的塔基区四周需设置临时土质排水沟，平均单个塔基设置土质排水沟 70m，共计开挖排水沟 1330m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 106m<sup>3</sup>。在每基塔排水沟末端设置土质沉沙池，沉沙池放坡 1: 1 开挖，池口尺寸为 3m $\times$ 2.5m，深 1m，单个沉沙池容积为 3m<sup>3</sup>，共计 19 座，开挖土方 57m<sup>3</sup>。

综上所述，塔基区挖方量 7504m<sup>3</sup>（含表土剥离 1011m<sup>3</sup>），填方量 7922m<sup>3</sup>（含表土回覆 1011m<sup>3</sup>），借方量 1960m<sup>3</sup>，余方量 1542m<sup>3</sup>。

## (2) 电缆施工区

电缆施工区占用空闲地和耕地。施工前对开挖区域进行表土剥离，可剥离表土厚度为 30cm，剥离面积 341m<sup>2</sup>，表土剥离量约为 102m<sup>3</sup>。剥离的表土堆放在开挖区域一侧的临时堆土区域，临时堆土采用防尘网临时苫盖。施工结束后对电缆施工区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土全部回覆利用，表土回覆量约为 102m<sup>3</sup>。

电缆施工主要为电缆井、排管、电缆直埋和拉管的基础开挖，开挖区域扣除剥离表土后，共开挖基础土方 1415m<sup>3</sup>；回填基础土方 1415m<sup>3</sup>，无借方，无余方。

表 1.1-10 本工程电缆挖填土方设计一览表

类型		长度 (m)	开挖宽度 (m)	深度 (m)	泥浆量 (m <sup>3</sup> )	泥浆池 挖方量 (m <sup>3</sup> )	挖方量 (m <sup>3</sup> )	填方量 (m <sup>3</sup> )
电缆井	转角井 (2 座)	11	2.3	3.35	/	/	77	77
	直线井 (4 座)	36	2.3	3.35	/	/	253	253
排管		35	1.075	1.955	/	/	62	62
直埋		95	1	1.4	/	/	105	105
拉管 (2 处)		648	0.95 (管径)		459	459	918	918
合计		825	/	/	/	/	1415	1415

注：电缆井、排管、电缆直埋挖方量=长度×开挖宽度×(深度-0.3m)；拉管泥浆量=长度×π×(管径/2)<sup>2</sup>，泥浆池挖方量=泥浆量。

施工期在电缆施工区一侧设置土质排水沟，共计开挖排水沟 177m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 14m<sup>3</sup>。在土质排水沟末端设置土质沉沙池，沉沙池放坡 1:1 开挖，池口尺寸长×宽为 3m×2.5m，深 1m，容积 3m<sup>3</sup>，共计 3 座，开挖土方 9m<sup>3</sup>。

综上所述，电缆施工区挖方量 1540m<sup>3</sup> (含表土剥离 102m<sup>3</sup>)，填方量 1540m<sup>3</sup> (含表土回覆 102m<sup>3</sup>)，无借方，无余方。

## (3) 施工道路区

施工道路区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)，“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故施工道路区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

## (4) 牵张场及跨越场区

牵张场及跨越场区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土

保持技术标准》(GB 50433-2018)，“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故牵张场及跨越场区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

### (5) 工程土石方汇总

根据本工程的规划设计文件及项目实际情况，建设期内开挖土石方量为 9044m<sup>3</sup>，其中剥离表土 1113m<sup>3</sup>，基础开挖 7931m<sup>3</sup>；回填土石方量为 9462m<sup>3</sup>，其中表土回覆 1113m<sup>3</sup>，基础回填 8349m<sup>3</sup>；借方量 1960m<sup>3</sup>，余方量 1542m<sup>3</sup>。具体土方平衡情况见表 1.1-11。

表 1.1-11 土石方挖填平衡情况表 单位：m<sup>3</sup>

防治分区	挖方		填方		借方	余方
	表土剥离	基础开挖	表土回覆	基础回填		
塔基区	1011	6493	1011	6911	1960	1542
电缆施工区	102	1438	102	1438	0	0
小计	1113	7931	1113	8349	1960	1542
<b>合计</b>	<b>9044</b>		<b>9462</b>		<b>1960</b>	<b>1542</b>

注：各行均可按“挖方+借方=填方+余方”进行平衡。

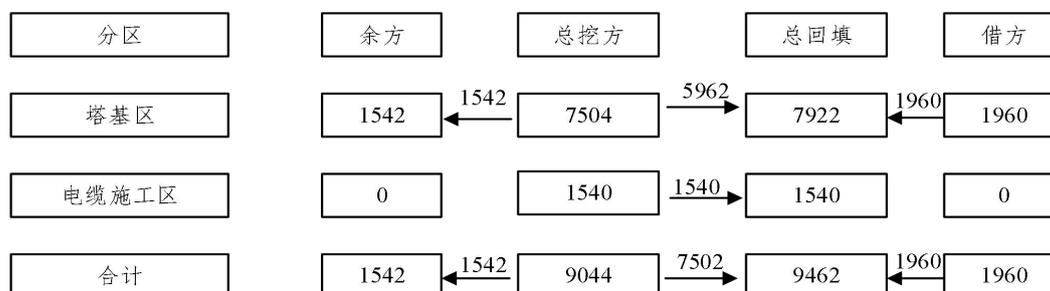
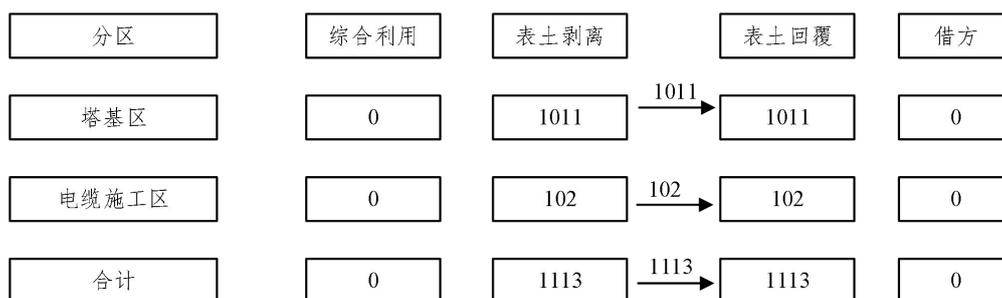


图 1.1-6 土石方平衡流向框图 单位：m<sup>3</sup>

表 1.1-12 表土平衡情况表 单位：m<sup>3</sup>

分区	表土剥离量	表土回覆量	借方量	余方量
塔基区	1011	1011	0	0
电缆施工区	102	102	0	0
<b>合计</b>	<b>1113</b>	<b>1113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

图 1.1-7 表土平衡流向框图 单位: m<sup>3</sup>

### 1.1.6 项目施工进度情况

本项目主体工程施工进度情况见表 1.1-13。

表 1.1-13 项目主体工程施工进度表

工作项目		施工期					
		2026 年					2027 年
		8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
杆塔施工	基础施工	—————					
	杆塔组立				—————		
	架线施工					—————	
	场地整理						—————
电缆施工	基础施工	—————					
	电缆敷设				—————	—————	
	场地整理						—————

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 地形地貌

项目所在区地貌单元属于徐淮黄泛平原区泛滥冲积平原，项目区沿线地面高程一般为 0.00~4.00m，线路沿线地势略有起伏，水系发育，主要为耕地和其他土地。

### 1.2.2 地质地震

根据本次勘探揭示，结合区域地质资料及附近工程勘测资料，沿线地基土主要由第四系冲积沉积成因的上部为粘性土、淤泥、砂层。土层强度一般，为高-中压缩性土，工程地质条件较好，下部为基岩，工程地质条件好，局部地表分布人工堆积成因的素填土。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2016 年版），连云港海州区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第三组。

### 1.2.3 水系情况

本工程位于淮河流域沂沭泗水系。沂沭地区的主要排洪河道新沂河、新沭河等均从市内入海，故有“洪水走廊”之称。境内还有玉带河、龙尾河、兴庄河、青口河、锈针河、柴米河、蔷薇河、善后河、盐河等大小干支河道 40 余条，其中 17 条为直接入海河流，盐河等河流直接与运河及长江相通。新建线路部分涉及跨越六兆河与城北河。

六兆河是江苏省连云港市的一条重要河流，在连云港市的相关规划中，六兆河被确定为东部边界之一。

城北河是连云港市海州区的重要排涝河道之一。

### 1.2.4 气候特征

项目所在地属暖温带季风气候区。地处暖温带南部边缘，冬季受北方高原南下的季风侵袭，以寒冷少雨天气为主，夏季受来自海洋的东南季风控制，天气炎热多雨，春秋两季处于南北季风交替时期，形成四季分明，差异明显，干、湿、冷、暖天气多变的气候特征。根据连云港气象站 1980~2024 年观测资料，项目区多年气象要素情况如下：

表 1.2-1 工程项目区域气象特征值一览表

项目	内容		单位	连云港市
气温	历年年平均气温		°C	14.2
	极端最高气温		°C	37.5 (2002.7.15)
	极端最低气温		°C	-15.3 (1990.2.1)
降水	平均降水	多年	mm	892.4
	最大年降水	多年	mm	1549.7 (2003)
	最大日降水	多年	mm	266.8 (2000.8.30)
风速	历年年均风速		m/s	3.1
风向	全年主导风向		/	ES
相对湿度	多年平均		%	75
无霜期	全年		d	218
蒸发量	全年平均		mm	1469.6

### 1.2.5 土壤和植被

连云港市土壤有棕壤土、砂礓黑土、潮土、盐土 4 个土类、9 个亚类，16 个土属、33 个土种。本项目区土壤类型主要为棕壤土，可剥离表土厚度为 30cm。

项目区地处江苏东北部近海地域，受海洋调节，降水量较多，属暖温带湿润季风气候，植被类型属典型的落叶阔叶林。但是，由于农业开发历史悠久，自然

植被受人类活动的广泛影响，原生自然植被不复存在，绝大多数被农田取代。落叶阔叶等地带性植被类型以人工栽培为主，主要有常绿针叶林、乔木、部分野生灌木和野生草本植物。乔木主要有意杨、枣树、中槐、泡桐等；灌木有野蔷薇、酸枣、花椒等；野生草本植物主要有山扁豆、马唐草、狗尾草、鸡眼草、蒲公英等。项目区占地现状主要为耕地和其他土地，林草覆盖率约 27%。

表 1.2-2 表土调查情况表

防治分区	可剥离表土面积 (m <sup>2</sup> )	剥离表土厚度 (m)	占地类型
塔基区	6502	0.30	耕地、其他土地
电缆施工区	3611	0.30	耕地、其他土地
牵张场及跨越场区	1400	0.30	耕地
施工道路区	6040	0.30	耕地、其他土地

### 1.3 水土保持分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)对工程水土保持制约性因素进行分析和评价。工程所在区不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；不属于水土流失严重、生态脆弱的地区；不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区；不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区和地质公园、森林公园、重要湿地和生态脆弱区等。根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》(苏水农〔2014〕48号)以及《连云港市水土保持规划报告(2016~2030年)》，项目区所在地宁海街道、板浦镇不涉及水土流失重点预防区和重点治理区。

因此，本项目无水土保持制约因素。

### 1.4 水土流失防治目标及防治责任范围

#### 1.4.1 设计水平年

本工程计划 2026 年 8 月开工，2027 年 1 月完工，因此确定本方案设计水平年为主体工程完工后的当年，即 2027 年。

#### 1.4.2 防治目标

项目位于海州区宁海街道、板浦镇境内，根据《江苏省水土保持规划(2015-2030)》，属于北方土石山区——华北平原区——淮北平原岗地农田防

护保土区——灌云灌南平原农田防护土壤保持区，宁海街道和板浦镇全部划入江苏省省级水土流失易发区。根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农〔2014〕48号），项目区所在地不涉及江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区，但涉及县级城市区域，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目水土流失防治标准应执行北方土石山区一级标准。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）4.0.7节规定土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1；4.0.9节规定位于城市区的项目，渣土防护率和林草覆盖率可提高1%~2%。因此本工程水土流失防治目标如下：施工期渣土防护率应达97%，表土保护率应达95%；至设计水平年，水土流失治理度应达95%，土壤流失控制比应达1.0，渣土防护率应达99%，表土保护率应达95%，林草植被恢复率应达97%，林草覆盖率应为27%。防治目标具体情况见表1.4-1：

表 1.4-1 防治标准指标计算表

指标	标准值		侵蚀强度调整	地理位置调整	方案目标值	
	施工期	设计水平年	微度	城市区	施工期	设计水平年
水土流失治理度(%)	/	95	/	/	/	95
土壤流失控制比	/	0.90	+0.10	/	/	1.0
渣土防护率(%)	95	97	/	+2	97	99
表土保护率(%)	95	95	/	/	95	95
林草植被恢复率(%)	/	97	/	/	/	97
林草覆盖率(%)	/	25	/	+2	/	27

### 1.4.3 防治责任范围

按照“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），结合本工程占地概况、水土流失影响分析，对工程建设及生产可能造成水土流失范围进行界定，以确定水土流失防治责任范围。确定本工程水土流失防治责任范围为20909m<sup>2</sup>，其中永久占地为3098m<sup>2</sup>，临时占地为17811m<sup>2</sup>。

表 1.4-2 水土流失防治责任范围表 单位：m<sup>2</sup>

防治分区	占地性质		防治责任范围
	永久占地面积	临时占地面积	
塔基区	3090	6768	9858

1 项目简况

电缆施工区	8	3603	3611
施工道路区	0	6040	6040
牵张场及跨越场区	0	1400	1400
合 计	<b>3098</b>	<b>17811</b>	<b>20909</b>

## 2 水土流失预测与水土保持措施布设

### 2.1 水土流失预测

#### 2.1.1 预测单元

本工程水土流失预测范围为 20909m<sup>2</sup>。预测单元为工程建设扰动地表的时段和形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本工程的预测单元为塔基区、电缆施工区、施工道路区和牵张场及跨越场区。

#### 2.1.2 预测时段

本工程为新建输变电工程，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。各区域水土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，并按照最不利情况考虑。施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。连云港市雨季主要是 6~9 月份。

本工程施工期为 2026 年 8 月~2027 年 1 月，自然恢复期取完工后两年。根据项目本身建设进度，水土流失预测时段情况详见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目水土流失预测分区及时段表

阶段	预测单元	施工时段	预测时段 (a)	主要内容
施工期	塔基区	2026.08-2027.01	0.75	塔基基础施工 (每基塔平均施工3个月)
	电缆施工区	2026.08-2027.01	0.75	电缆基础开挖 (平均每处施工3个月)
	施工道路区	2026.08-2027.01	0.75	车辆占压 (平均每处施工3个月)
	牵张场及跨越场区	2026.12-2027.01	0.50	架线施工
自然恢复期	塔基区	2027.02-2029.01	2.00	无
	电缆施工区	2027.02-2029.01	2.00	无
	施工道路区	2027.02-2029.01	2.00	无
	牵张场及跨越场区	2027.02-2029.01	2.00	无

#### 2.1.3 土壤侵蚀模数

根据现场调查，结合江苏省水土流失分布图和江苏省水土流失动态监测成果，最终确定项目所在区域土壤侵蚀强度为微度，参照项目区同类项目监测数据，确定土壤侵蚀模数背景值为 140t/(km<sup>2</sup>·a)。

本工程施工期各区域侵蚀模数采取类比分析法，通过类比“江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程”获得。类比工程已于

2025年3月通过了国网江苏省电力有限公司组织的水土保持设施验收，并投入运行，本工程水土保持监测单位为江苏方天电力技术有限公司，验收报告编制单位为连云港市水利规划设计院有限公司。参考性分析对照详见表 2.1-2。

表 2.1-2 参考性分析对照表

项目	江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 110 千伏送出工程	江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程	类比结果
地理位置	连云港市海州区	连云港市徐圩新区	相近
气候条件	暖温带季风气候	暖温带季风气候	相同
年平均降水量	892.4mm	910.1mm	相近
地形地貌	平原	平原	相同
土壤类型	棕壤土	黄棕壤土	相同
水土流失强度	微度水蚀	微度水蚀	相同

表 2.1-3 类比项目实际监测侵蚀模数统计表

预测时段	江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程(类比)	
	防治分区	实际监测侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]
施工期	塔基区	662
	牵张场及跨越场区	426
	施工临时道路区	772

本工程与类比工程均为输变电项目，均位于连云港市，年平均降水量相近，气候条件、地形地貌、土壤类型和水土流失强度等相同。因此本工程与类比工程有一定的可比性。根据各区的施工特点对类比工程的侵蚀模数进行修正后可应用于本工程。

针对本工程的环境条件、扰动强度和防护措施条件等实际情况，对扰动地表后侵蚀模数的取值，在下列三个方面进行修正。

(1) 环境条件：本工程多年平均降水量为 892.4mm，类比工程的多年平均降水量为 910.1mm，降雨量相近，因此，设置修正系数为 1.0。

(2) 扰动强度：本工程土石方工程量和扰动地表的强度与类比工程相似，差别较小，因此，设修正系数 1.0-1.1。

(3) 防护措施条件：类比工程所列监测结果是在工程施工过程中采取了一定的水土保持措施的基础上进行监测的，若施工过程中不采取任何措施，则工程扰动后的土壤侵蚀模数将会比监测结果大。而水土流失量预测的基础是按生产建设项目正常的设计功能，在无水土保持工程条件下可能产生的土壤流失量。因此，

设置修正系数为 1.2-2.4。

自然恢复期：项目建成，植被种植完成后，开始发挥保水保土的作用，自然恢复期水土流失治理达标，土壤侵蚀模数达到背景值。各防治分区的侵蚀模数见表 2.1-4。

表 2.1-4 扰动后土壤侵蚀模数类比表

预测时段	江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目配套 110 千伏送出工程（类比工程）			调整系数		江苏连云港日出东方板浦 150 兆瓦渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 110 千伏送出工程（本工程）	
	预测单元	监测土壤侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]	环境条件	扰动强度	防护措施条件	预测单元	预测土壤侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]
施工期	塔基区	662	1.0	1.0	2.4	塔基区	1589
	塔基区	662	1.0	1.1	2.4	电缆施工区	1748
	施工临时道路区	772	1.0	1.0	1.2	施工道路区	926
	牵张场及跨越场区	426	1.0	1.0	2	牵张场及跨越场区	852

#### 2.1.4 预测结果

根据上述确定的土壤侵蚀模数，按公式法进行各分区水土流失量估算。结合项目预测单元及预测时段划分，预测项目建设时如不采取水土保持措施可能产生土壤流失量，结果见表 2.1-5。

根据分时段计算结果可知，如不采取水保措施，项目在整个建设期可能产生土壤流失总量为 33.31t，新增土壤流失量为 25.88t。

表 2.1-5 项目水土流失量预测计算成果表

预测时段	预测单元	面积(m <sup>2</sup> )	预测时段(a)	侵蚀模数背景值[t/(km <sup>2</sup> ·a)]	背景流失量(t)	扰动后侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]	水土流失总量(t)	新增流失量(t)	新增占比(%)
施工期	塔基区	9858	0.75	140	1.04	1589	11.75	10.71	73.88
	电缆施工区	3611	0.75	140	0.38	1748	4.73	4.35	
	施工道路区	6040	0.75	140	0.63	926	4.19	3.56	
	牵张场及跨越场区	1400	0.5	140	0.1	852	0.6	0.5	
小计	/	<b>20909</b>	/	/	<b>2.15</b>	/	<b>21.27</b>	<b>19.12</b>	
自然恢复期第一年	塔基区	7757	1	140	1.09	500	3.88	2.79	26.12
	电缆施工区	3603	1	140	0.5	500	1.8	1.3	
	施工道路区	6040	1	140	0.85	500	3.02	2.17	
	牵张场及跨越场区	1400	1	140	0.2	500	0.7	0.5	

小计	/	<b>18800</b>	/	/	<b>2.64</b>	/	<b>9.4</b>	<b>6.76</b>	
自然恢复期第二年	塔基区	7757	1	140	1.09	140	1.09	0	
	电缆施工区	3603	1	140	0.5	140	0.5	0	
	施工道路区	6040	1	140	0.85	140	0.85	0	
	牵张场及跨越场区	1400	1	140	0.2	140	0.2	0	
小计	/	<b>18800</b>	/	/	<b>2.64</b>	/	<b>2.64</b>	<b>0</b>	
<b>合计</b>					<b>7.43</b>	/	<b>33.31</b>	<b>25.88</b>	<b>100</b>

注：自然恢复期电缆施工区水土流失面积已扣除硬化占地，塔基区水土流失面积已扣除水塘面积和硬化面积。

### 2.1.5 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力的下降、淤积水系等问题，而且治理难度大、费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成水土流失危害进行预测，根据预测结果采取有针对性的防治措施。

工程施工过程中可能造成水土流失危害，主要包括以下几个方面：

(1) 破坏原地貌、加速土壤侵蚀。项目施工过程中扰动原地貌，损坏原有水土保持设施，原地貌破坏后涵养水源、保持水土功能丧失，地表裸露，土壤抗侵蚀能力急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，土壤侵蚀加速。

(2) 项目在基础开挖、机械占压等施工过程中，如遇较强的降雨，若没有防护措施，在降雨及人为因素作用下将会产生大量泥沙，造成较为严重的水土流失，对项目本身的施工安全也会造成一定的威胁。

(3) 工程施工中需开挖、堆置、回填土方，土方装卸堆存过程中易产生粉尘，在风力作用下，也易引起风蚀，并产生大气粉尘污染，对局部生态环境造成不良影响。

## 2.2 水土保持措施布设

### 2.2.1 水土保持措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，补充布设水土保持措施，开发与防治相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时突出重点防治工程措施和临时防治工程措施。各区水土流失防治措施设置情况详见表 2.2-1。

表 2.2-1 防治措施总体布局表

防治分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
塔基区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/
	临时措施	泥浆沉淀池	防尘网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池
电缆施工区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/
	临时措施	泥浆沉淀池	防尘网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池
施工道路区	工程措施	/	土地整治
	植物措施	/	撒播草籽
	临时措施	铺设钢板	/
牵张场及跨越场区	工程措施	/	土地整治
	临时措施	铺设钢板	/

### 2.2.2 分区措施布设

#### (1) 塔基区

##### ①工程措施

表土剥离:本工程主体设计中已考虑在塔基基础施工前先对塔基区开挖植被良好区域进行表土剥离,剥离的表层土堆放于塔基临时施工区域,待土建施工完成后全部用作覆土。塔基区表土剥离面积共 3370m<sup>2</sup>,剥离厚度 0.3m,表土剥离量为 1011m<sup>3</sup>。

土地整治:本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区除硬化和位于塘外的裸露地表进行土地整治,主要包括场地清理、平整、表土回覆,表土回覆量为 1011m<sup>3</sup>,整治面积为 7757m<sup>2</sup>,整治后的土地约 5724m<sup>2</sup>交由土地权所有人进行复耕,其余 2033m<sup>2</sup>进行植被恢复。

##### ②植物措施

撒播草籽:本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区土地整治后占用的空闲地和塘埂处裸露地表进行撒播草籽,撒播面积约 2033m<sup>2</sup>,撒播密度 0.015kg/m<sup>2</sup>,撒播量约为 30.5kg。

##### ③临时措施

泥浆沉淀池:主体为减少钻孔灌注桩施工过程中产生的水土流失,已考虑施工期间在塔基的灌注桩附近设置泥浆沉淀池,对钻渣泥浆进行沉淀和固化处理,设置 25 座,禁止将钻渣泥浆排入周围河流和农田中。泥浆沉淀池采用半挖半填的方式。

防尘网苫盖: 本方案补充在施工期间对施工区域临时堆土以及裸露地表进行苫盖, 苫盖面积约 6000m<sup>2</sup>。

土质排水沟: 本方案补充在施工期间在位于耕地和空闲地塔基施工区域四周设置临时土质排水沟, 排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1, 总长度约 1330m, 开挖土方量约 106m<sup>3</sup>。

土质沉沙池: 本方案补充在施工过程中于土质排水沟末端设置土质沉沙池, 沉沙池放坡 1:1 开挖, 池口尺寸长×宽为 3m×2.5m, 深 1m, 容积 3m<sup>3</sup>, 共计 19 座。

## (2) 电缆施工区

### ①工程措施

表土剥离: 本工程主体设计中已考虑在电缆基础施工前对开挖区域先进行表土剥离, 剥离的表层土堆放于临时施工区域, 待土建施工完成后全部用作覆土。电缆施工区剥离面积为 341m<sup>2</sup>, 剥离厚度约 0.3m, 表土剥离量为 102m<sup>3</sup>。

土地整治: 本工程主体设计中已考虑在施工后期对电缆施工区除硬化外裸露地表进行土地整治, 主要包括场地清理、平整、表土回覆, 表土回覆量为 102m<sup>3</sup>, 整治面积为 3603m<sup>2</sup>, 整治后的土地约 1931m<sup>2</sup> 交由土地权所有人进行复耕, 其余 1672m<sup>2</sup> 进行植被恢复。

### ②植物措施

撒播草籽: 本工程主体设计中已考虑在施工后期对电缆施工区土地整治后占用的空闲地裸露地表进行撒播草籽, 撒播面积约 1672m<sup>2</sup>, 撒播密度 0.015kg/m<sup>2</sup>, 撒播量约为 25.08kg。

### ③临时措施

泥浆沉淀池: 为了减少敷设拉管施工过程中产生的水土流失, 本工程已考虑在拉管施工区域外侧设置泥浆沉淀池, 对泥浆进行沉淀和固化处理, 禁止将钻渣泥浆排入周围农田中, 共设置了泥浆沉淀池 2 座。

防尘网苫盖: 本方案补充在施工期间对电缆施工区域临时堆土以及裸露地表进行防尘网苫盖, 苫盖面积约 2300m<sup>2</sup>。

土质排水沟: 本方案补充在施工期间沿电缆井、排管和直埋施工区域堆土一侧设置临时土质排水沟, 共计开挖排水沟 177m, 排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1, 开挖土方量约 14m<sup>3</sup>。

土质沉沙池：本方案补充在施工期间于排水沟末端设置土质沉沙池，沉沙池放坡 1:1 开挖，池口尺寸长×宽为 3m×2.5m，深 1m，容积 3m<sup>3</sup>，共计 3 座。

### (3) 施工道路区

#### ①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对施工道路区全区进行土地整治，土地整治面积约 6040m<sup>2</sup>，整治后的土地约 4240m<sup>2</sup> 交由土地权所有人进行复耕，其余 1800m<sup>2</sup> 进行植被恢复。

#### ②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期对施工道路区占用的空闲地采取撒播草籽的措施，撒播面积约 1800m<sup>2</sup>，撒播密度 0.015kg/m<sup>2</sup>，撒播草籽总量为 27kg。

#### ③临时措施

铺设钢板：本工程主体设计中已考虑在施工期间对施工道路区内松软路面区域铺设一定数量的钢板，以降低重型机械及车辆对表土的扰动，保护表土。本工程共预计铺设钢板 4000m<sup>2</sup>。

### (4) 牵张场及跨越场区

#### ①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对牵张场及跨越场区全区进行土地整治，土地整治面积约 1400m<sup>2</sup>，整治后交由土地权所有人进行复耕。

#### ②临时措施

铺设钢板：本工程主体设计中已考虑在施工期间对牵张场及跨越场机械占压区域采取铺设钢板的措施，本工程共预计铺设钢板 1000m<sup>2</sup>。

## 2.2.3 水土保持措施工程量汇总

本工程水土保持措施工程量详见表 2.2-2。

表 2.2-2 本项目水土保持措施工程量汇总表

防治分区	措施类型		内容类别	单位	数量	布设位置	结构形式	实施时间
塔基区	工程措施	主体已有	表土剥离	m <sup>3</sup>	1011	塔基区开挖植被良好区域	剥离厚度 0.3m，剥离面积 3370m <sup>2</sup>	2026.08-2026.10
			土地整治	m <sup>2</sup>	7757	除硬化和位于塘外的裸露地表	场地清理、平整、覆土	2027.01
	植物措施	主体已有	撒播草籽	m <sup>2</sup>	2033	占用空闲地和塘埂处裸露地表	狗牙根草籽，密度 0.015kg/m <sup>2</sup>	2027.01
	临时措施	主体已有	泥浆沉淀池	座	25	塔基灌注桩基础旁	半挖半填	2026.08-2026.10

		方案新增	土质排水沟	长度	m	1330	在位于耕地和空闲地塔基四周	上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1	2026.08-2026.10
				土方量	m <sup>3</sup>	106			
			土质沉沙池		座	19	排水沟末端	1:1 放坡, 顶长×顶宽×深为 3m×2.5m×1m	2026.08-2026.10
防尘网苫盖		m <sup>2</sup>	6000	临时堆土及裸露地表	6 针防尘网	2026.08-2026.10			
电缆施工区	工程措施	主体已有	表土剥离		m <sup>3</sup>	102	电缆施工区开挖区域	剥离厚度 0.3m, 剥离面积 341m <sup>2</sup>	2026.08-2026.10
			土地整治		m <sup>2</sup>	3603	除硬化外裸露地表	场地清理、平整、覆土	2027.01
	植物措施	主体已有	撒播草籽		m <sup>2</sup>	1672	占用空闲地处裸露地表	狗牙根草籽, 密度 0.015kg/m <sup>2</sup>	2027.01
	临时措施	方案新增	泥浆沉淀池		座	2	拉管施工区域外侧	半挖半填	2026.08-2026.10
			防尘网苫盖		m <sup>2</sup>	2300	临时堆土及裸露地表	6 针防尘网	2026.08-2026.10
			土质排水沟	长度	m	177	电缆井、排管和电缆直埋施工区域堆土一侧	上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1	2026.08-2026.10
				土方量	m <sup>3</sup>	14			
土质沉沙池		座	3	排水沟末端	1:1 放坡, 顶长×顶宽×深为 3m×2.5m×1m	2026.08-2026.10			
施工道路区	工程措施	方案新增	土地整治		m <sup>2</sup>	6040	全区	场地清理、平整	2027.01
	植物措施	方案新增	撒播草籽		m <sup>2</sup>	1800	占用空闲地区域	狗牙根草籽, 密度 0.015kg/m <sup>2</sup>	2027.01
	临时措施	主体已有	铺设钢板		m <sup>2</sup>	4000	松软路面区域	6mm 厚钢板	2026.08-2026.10
牵张场及跨越场区	工程措施	方案新增	土地整治		m <sup>2</sup>	1400	全区	场地清理、平整	2027.01
	临时措施	主体已有	铺设钢板		m <sup>2</sup>	1000	机械占压区域	6mm 厚钢板	2026.12

#### 2.2.4 防治措施进度安排

参照主体工程施工进度, 各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施, 相互协调, 有序进行。坚持“因地制宜, 因害设防”的原则, 首先安排水土流失严重区域的防治措施, 在措施安排上, 工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑, 施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排, 植物措施可略为滞后, 但须根据植物的生物学特性, 合理安排季节实施, 并在总工期内完成所有水土保持措施。

表2.2-3 主体工程与水土保持工程实施进度表

防治分区	工程名称		施工期					
			2026年					2027年
			8月	9月	10月	11月	12月	1月
塔基区	主体工程							
	工程措施	表土剥离	——	——	——			
		土地整治						——
	植物措施	撒播草籽						——
	临时措施	泥浆沉淀池	——	——	——			
		土质排水沟	——	——	——			
		土质沉沙池	——	——	——			
防尘网苫盖		——	——	——				
电缆施工区	主体工程							
	工程措施	表土剥离	——	——	——			
		土地整治						——
	植物措施	撒播草籽						——
	临时措施	泥浆沉淀池	——	——	——			
		防尘网苫盖	——	——	——			
		土质排水沟	——	——	——			
土质沉沙池		——	——	——				
施工道路区	工程措施	土地整治						——
	植物措施	撒播草籽						——
	临时措施	铺设钢板	——	——	——			
牵张场及跨越场区	工程措施	土地整治						——
	临时措施	铺设钢板					——	

注：“——”为主体工程进度；“——”为水土保持措施进度。

### 3 水土保持投资估算及效益分析

#### 3.1 投资估算成果

本项目水土保持总投资为52.08万元，其中工程措施费用3.92万元；植物措施费用0.79万元；临时措施费用31.44万元，独立费用11.45万元（其中建设管理费5.54万元、工程建设监理费0.91万元、科研勘测设计费5万元），基本预备费2.38万元，水土保持补偿费为20909元，计为2.0909万元。

表 3.1-1 本工程水土保持投资估算总表

单位：万元

序号	工程或费用名称	主体已有	方案新增	合计
1	第一部分工程措施	3.59	0.33	3.92
2	第二部分植物措施	0.53	0.26	0.79
3	第三部分临时措施	26.11	5.34	31.44
4	第四部分独立费用	6.14	5.31	11.45
	一至四部分合计	36.37	11.24	47.60
5	基本预备费 5%	1.82	0.56	2.38
6	水土保持补偿费	2.0909	0	2.0909
7	<b>水土保持总投资</b>	<b>40.28</b>	<b>11.80</b>	<b>52.08</b>

表 3.1-2 水土保持工程措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
<b>一</b>	<b>塔基区</b>	/	/	/	<b>3.14</b>
(一)	表土保护工程				2.79
1	表土剥离*	m <sup>2</sup>	3370	0.75	0.25
2	表土回覆*	m <sup>3</sup>	1011	25.15	2.54
(二)	土地整治工程				0.35
1	土地整治*				0.35
	全面整地	m <sup>2</sup>	7757	0.45	0.35
<b>二</b>	<b>电缆施工区</b>	/	/	/	<b>0.45</b>
(一)	表土保护工程				0.29
1	表土剥离*	m <sup>2</sup>	341	0.75	0.03
2	表土回覆*	m <sup>3</sup>	102	25.15	0.26
(二)	土地整治工程				0.16
1	土地整治*				0.16
	全面整地	m <sup>2</sup>	3603	0.45	0.16
<b>三</b>	<b>牵张场及跨越场区</b>	/			<b>0.06</b>
(一)	土地整治工程				0.06
1	土地整治				0.06
	全面整地	m <sup>2</sup>	1400	0.45	0.06
<b>四</b>	<b>施工道路区</b>	/			<b>0.27</b>

(一)	土地整治工程				0.27
1	土地整治				0.27
	全面整地	m <sup>2</sup>	6040	0.45	0.27
合计	/	/	/	/	<b>3.92</b>

表 3.1-3 水土保持植物措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
<b>一</b>	<b>塔基区</b>	/	/	/	<b>0.29</b>
(一)	植被恢复与建设工程				0.29
1	撒播草籽*				0.29
	直播种草/不覆土	m <sup>2</sup>	2033	1.45	0.29
<b>二</b>	<b>电缆施工区</b>	/	/	/	<b>0.24</b>
(一)	植被恢复与建设工程				0.24
1	撒播草籽*				0.24
	直播种草/不覆土	m <sup>2</sup>	1672	1.45	0.24
<b>三</b>	<b>施工道路区</b>	/	/	/	<b>0.26</b>
(一)	植被恢复与建设工程				0.26
1	撒播草籽				0.26
	直播种草/不覆土	m <sup>2</sup>	1800	1.45	0.26
合计	/	/	/	/	<b>0.79</b>

表 3.1-4 水土保持临时措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
<b>一</b>	<b>临时防护工程</b>				<b>30.47</b>
(一)	塔基区	/	/	/	8.71
1	泥浆沉淀池*	座	25	1960	4.9
2	临时覆盖				3.41
	防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	6000	5.69	3.41
3	土质排水沟				0.27
	土方开挖	m <sup>3</sup>	106	25.38	0.27
4	土质沉沙池				0.13
	土方开挖	m <sup>3</sup>	57	23.60	0.13
(二)	电缆施工区	/	/	/	1.76
1	泥浆沉淀池*	座	2	1960	0.39
2	临时覆盖				1.31
	防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	2300	5.69	1.31
3	土质排水沟	m <sup>3</sup>			0.04
	土方开挖	m <sup>3</sup>	14	25.38	0.04
4	土质沉沙池	m <sup>3</sup>			0.02
	土方开挖	m <sup>3</sup>	9	23.60	0.02
(三)	牵张场及跨越场区	/	/	/	4

1	临时覆盖	/			4
	铺设钢板*	m <sup>2</sup>	1000	40.00	4
(三)	施工道路区	/	/	/	16
1	临时覆盖	/			16
	铺设钢板*	m <sup>2</sup>	4000	40.00	16
二	其他临时工程	%	2	47100	0.09
三	施工安全生产专项	%	2.5	351800	0.88
合计	/	/	/	/	31.44

注：带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-5 本工程水土保持其他费用估算详表

独立费用			
序号	费用名称	计算依据	合计(万元)
一	建设管理费	/	5.54
1	项目经常费	(第一~第三部分)×2.5%	0.90
2	水保专项验收	/	4.5
3	技术咨询费	(第一~第三部分)×0.4%	0.14
二	工程建设监理费	/	0.91
三	科研勘测设计费	/	5
1	工程科学研究试验费	/	/
2	工程勘测设计费	/	/
1)	水土保持方案编制费		5
合计			11.45
水土保持补偿费			
防治责任范围(m <sup>2</sup> )		单价(元/m <sup>2</sup> )	水土保持补偿费(元)
20909		1	20909

## 3.2 效益分析

### 3.2.1 水土流失治理度

至设计水平年，项目建设可能造成水土流失面积 20909m<sup>2</sup>，水土流失治理达标面积 20854m<sup>2</sup>，水土流失治理度可达到 99.7%。具体计算见表 3.2-1。

表 3.2-1 水土流失治理度计算表

分区	防治责任范围面积(m <sup>2</sup> )	水土流失面积(m <sup>2</sup> )	水土流失治理达标面积(m <sup>2</sup> )				水土流失治理度(%)	防治标准(%)	是否达标
			水塘面积、场地硬化面积	工程措施	植物措施	合计			
塔基区	9858	9858	2101	5724	2005	9830	99.7	95	达标
电缆施工区	3611	3611	8	1931	1660	3599			
施工道路区	6040	6040	0	4240	1785	6025			

牵张场及跨越场区	1400	1400	0	1400	0	1400			
<b>综合值</b>	<b>20909</b>	<b>20909</b>	<b>2109</b>	<b>13295</b>	<b>5450</b>	<b>20854</b>			

注：治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再重复计列。

### 3.2.2 土壤流失控制比

通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内治理后每平方公里年平均土壤流失量将小于水土流失防治责任范围内容许土壤流失量，项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量为  $200t/(km^2 \cdot a)$ 。至设计水平年，各项水保措施发挥作用后，治理后每平方公里年平均土壤流失量可达到  $140t/(km^2 \cdot a)$ ，土壤流失控制比可达到 1.4。

### 3.2.3 渣土防护率

本工程永久弃渣和临时堆土总量  $11004m^3$ ，实际挡护的永久弃渣和临时堆土总量约  $10960m^3$ ，渣土防护率可达到 99.6%。

### 3.2.4 表土保护率

本项目可剥离表土总量为  $5266m^3$ ，在采取保护措施后保护表土数量为  $5073m^3$ ，其中剥离保护的表土  $1113m^3$ ，通过苫盖和铺垫保护的表土量为  $3960m^3$ ，表土保护率可达到 96.3%。

### 3.2.5 林草植被恢复率

本项目方案实施后林草类植被面积为  $5450m^2$ ，可恢复植被面积为  $5505m^2$ ，林草植被恢复率可达到 99.0%。具体计算见表 3.2-2。

表 3.2-2 林草植被恢复率计算表

防治分区	可恢复植被面积 ( $m^2$ )	林草植被面积 ( $m^2$ )	林草植被恢 复率 (%)	防治标准 (%)	是否 达标
塔基区	2033	2005	99.0	97	是
电缆施工区	1672	1660			
施工道路区	1800	1785			
<b>合计</b>	<b>5505</b>	<b>5450</b>			

### 3.2.6 林草覆盖率

本项目建设总占地面积约  $20909m^2$ ，根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018) 4.0.5 节规定恢复耕地面积在计算林草覆盖率时可在防治责任范围中扣除，因此本项目扣除恢复耕地后的建设总占地面积  $7614m^2$ ，方案实施后林草类植被面积为  $5450m^2$ ，林草覆盖率可达到 71.6%。

表 3.2-3 林草覆盖率统计表

防治分区	防治责任范围 (m <sup>2</sup> )	恢复耕地面积 (m <sup>2</sup> )	扣除恢复耕地后面积 (m <sup>2</sup> )	林草类植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草覆盖率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	9858	5724	4134	2005	71.6	27	是
电缆施工区	3611	1931	1680	1660			
施工道路区	6040	4240	1800	1785			
牵张场及跨越场区	1400	1400	0	0			
合计	20909	13295	7614	5450			

### 3.2.7 六项指标达标情况

通过计算分析,至设计水平年水土流失防治目标的实现情况为:水土流失治理度 99.7%、土壤流失控制比 1.4、渣土防护率 99.6%、表土保护率 96.3%、林草植被恢复率 99.0%、林草覆盖率 71.6%。六项指标计算情况详见表 3.2-4。

表 3.2-4 防治效果汇总表

评估指标	计算方法	计算依据	单位	数量	计算结果	防治目标	达标情况
水土流失治理度	项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比	水土流失治理达标面积	m <sup>2</sup>	20854	99.7%	95%	达标
		水土流失总面积	m <sup>2</sup>	20909			
土壤流失控制比	项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比	容许土壤流失量	t/(km <sup>2</sup> ·a)	200	1.4	1.0	达标
		治理后每平方公里年平均土壤流失量	t/(km <sup>2</sup> ·a)	140			
渣土防护率	项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣和临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比	实际挡护的永久弃渣和临时堆土数量	m <sup>3</sup>	10960	99.6%	99%	达标
		永久弃渣和临时堆土总量	m <sup>3</sup>	11004			
表土保护率	项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比	保护的表土数量	m <sup>3</sup>	5073	96.3%	95%	达标
		可剥离表土总量	m <sup>3</sup>	5266			
林草植被恢复率	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积	林草类植被面积	m <sup>2</sup>	5450	99.0%	97%	达标
		可恢复林草	m <sup>2</sup>	5505			

评估指标	计算方法	计算依据	单位	数量	计算结果	防治目标	达标情况
	被面积的百分比	植被面积					
林草覆盖率	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比	林草类植被面积	m <sup>2</sup>	5450	71.6%	27%	达标
		项目区建设面积（扣除恢复耕地面积）	m <sup>2</sup>	7614			

### 3.3 水土保持管理

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），确保本水土保持方案防治措施按“三同时”的要求顺利实施，充分发挥水土保持措施的作用，使项目建设过程中的水土流失控制在方案目标值以内，促进项目区及周边生态环境的良性发展，特提出以下保证措施。

#### 3.3.1 组织管理

根据国家有关法律法规，本工程水土保持方案为报告表项目，实施承诺制管理。建设单位承诺已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务；所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求；严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备；依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费；积极配合水土保持监督检查；愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。水土保持方案在报批前，生产建设单位应当通过其网站、生产建设项目所在地公共媒体网站或者相关政府网站向社会公开拟报批的水土保持方案全文，且持续公开期限不得少于10个工作日。对于公众提出的问题和意见，生产建设单位应当逐一处理与回应，并在水土保持行政许可承诺书中予以说明。

报告表经江苏省水利厅批复后，建设单位将成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，全力保证水土

保持工作按计划进行。水土保持方案实施管理机构主要工作职责如下：①认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益；②建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，制定水土保持方案详细实施计划；③工程施工期间，与设计、施工单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持设施的正常建设，最大限度减少人为造成的水土流失与生态环境的破坏；④深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况；⑤建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

### 3.3.2 后续设计

本项目可研已批复，水土保持措施后续应纳入初步设计和施工图设计中。水土保持方案经批准后，对照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号），生产建设项目地点、规模发生重大变化，水土保持措施发生重大变更的，生产建设单位应当补充水土保持方案变更报告或修改水土保持方案，报江苏省水利厅审批。

### 3.3.3 水土保持监测和监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）中相关规定。对报告表项目水土保持监测工作未提出要求，因此，本工程建设单位可依据需要自行开展水土保持监测工作。凡主体工程开展监理工作的生产建设项目，应当按照国家建设监理、水土保持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件、工程施工合同、监理合同等，开展水土保持监理工作，由于本工程征占地面积在50公顷以下且挖填土石方总量在50万立方米以下，因此不对水土保持监理单位的人员配备和资质提出要求。

### 3.3.4 水土保持施工

施工过程中应注重保护表土植被，严格控制和管理车辆机械的运行范围，必要时设立保护地表及植被的警示牌，防止扩大对地表的扰动。对临时排水设施应进行经常性检查维护，保证其排水通畅。对建成的水土保持设施应有明确的管理维护要求。工程措施施工时，应对施工质量实时检查，对不符合设计要求或质量要

求的工程，责令其重建，直到满足要求为止。植物措施工程施工时，应注意加强植物措施的后期管护工作，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。

### 3.3.5 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》的通知（苏水规〔2021〕8号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），生产建设项目的水土保持设施验收，由生产建设单位自主开展。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。存在下列情形之一的，水土保持设施验收结论应当为不合格：①未依法依规履行水土保持方案及重大变更编报审批程序的；②弃土弃渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；③水土保持措施体系、等级和标准或者水土流失防治指标未按照水土保持方案批复要求落实的；④存在水土流失风险隐患的；⑤水土保持设施验收材料明显不实、内容存在重大缺项、遗漏的；⑥水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的；⑦未依法依规缴纳水土保持补偿费的；⑧存在法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形的。


本项目为编制水土保持方案报告表项目，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织验收工作，形成验收鉴定书，明确验收结论。验收合格意见应当经三分之二以上验收组成员同意并签字。实行承诺制或者备案制管理的项目，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收鉴定书，公示时间不得少于20个工作日。生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，在水土保持设施验收通过3个月内向省水利厅报备验收材料。依法编制水土保持报告表和实行承诺制管理的生产建设项目，水土保持设施验收报备时只需提交水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书和向社会公开的时间、地点及方式等材料。

生产建设项目水土保持设施验收合格后,生产建设单位或者运行管理单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失,加强对水土保持设施的管理维护,确保水土保持设施长期发挥效益。

附

图

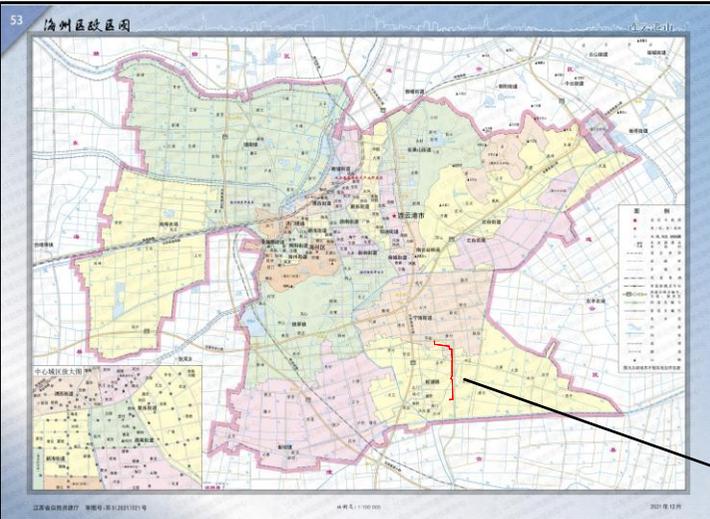

附图1 项目地理位置图
