

南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一  
期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程

# 水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

2024 年 5 月

## 目 录

南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程水土保持方案报告表 .....	1
方案报告表补充说明 .....	1
<b>1 项目简况 .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 项目概况 .....</b>	<b>1</b>
1.1.1 项目基本情况 .....	1
1.1.2 项目组成情况 .....	2
1.1.3 工程布置情况 .....	3
1.1.4 工程占地概况 .....	7
1.1.5 土石方平衡情况 .....	8
1.1.6 项目施工进度情况 .....	13
<b>1.2 项目区概况 .....</b>	<b>13</b>
1.2.1 地形地貌 .....	13
1.2.2 地质地震 .....	14
1.2.3 水系情况 .....	14
1.2.4 气候特征 .....	14
1.2.5 土壤和植被 .....	15
<b>1.3 水土保持分析与评价 .....</b>	<b>15</b>
<b>1.4 水土流失防治目标及防治责任范围 .....</b>	<b>16</b>
1.4.1 设计水平年 .....	16
1.4.2 防治目标 .....	16
1.4.3 防治责任范围 .....	17
<b>2 水土流失量预测与水土保持措施布设 .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1 水土流失量预测 .....</b>	<b>18</b>
2.1.1 预测单元 .....	18
2.1.2 预测时段 .....	18
2.1.3 土壤侵蚀模数 .....	18
2.1.4 预测结果 .....	20

2.1.5 水土流失危害分析 .....	21
<b>2.2 水土保持措施布设 .....</b>	<b>21</b>
2.2.1 水土保持措施总体布局 .....	21
2.2.2 分区措施布设 .....	22
2.2.3 水土保持措施工程量汇总 .....	23
2.2.4 防治措施进度安排 .....	24
<b>3 水土保持投资估算及效益分析 .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 投资估算成果 .....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 效益分析 .....</b>	<b>27</b>
3.2.1 水土流失治理度 .....	27
3.2.2 土壤流失控制比 .....	28
3.2.3 渣土防护率 .....	28
3.2.4 表土保护率 .....	28
3.2.5 林草植被恢复率 .....	28
3.2.6 林草覆盖率 .....	28
3.2.7 六项指标达标情况 .....	29
<b>3.3 水土保持管理 .....</b>	<b>30</b>
3.3.1 组织管理 .....	30
3.3.2 后续设计 .....	31
3.3.3 水土保持监测和监理 .....	31
3.3.4 水土保持施工 .....	31
3.3.5 水土保持设施验收 .....	31

**附图**

附图1 项目地理位置图

# 南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程水土保持方案报告表

项目概况	位置	项目位于南通市启东市吕四港镇、海门区包场镇。启东吕四渔光互补光伏升压站 T 接东洲~中天钢铁 220 千伏线路工程起于启东吕四渔光互补光伏升压站外 T1 (/), 终于 T 接点新建塔 T33 (/)。				
	建设内容	<p>项目分为点型工程和线型工程,共改造 1 个 220 千伏出线间隔(无土建);新建架空线路路径长约 9.90km,新建杆塔 35 基(其中 2 基为裕度,不建设),采用灌注桩基础;拆除杆塔 1 基。</p> <p>(1) 点型工程 东洲 500 千伏变电站 220 千伏间隔保护改造工程:本期 1 回线路保护更换,不涉及土建。</p> <p>(2) 线型工程 启东吕四渔光互补光伏升压站 T 接东洲~中天钢铁 220 千伏线路工程:新建双回架空线路总长约为 9.9km,新建杆塔 35 基(其中 2 基为裕度,不建设);拆除杆塔 1 基。</p>				
	建设性质	新建输变电工程		总投资(万元)	/	
	土建投资(万元)	/		占地面积(m <sup>2</sup> )	永久: 7973 临时: 36898	
	动工时间	2024 年 7 月		完工时间	2024 年 11 月	
	土石方(m <sup>3</sup> )	挖方 15713	填方 15713	借方 0	余(弃)方 0	
	取土(石、砂)场	/				
	弃土(石、砂)场	/				
	项目区概况	涉及重点防治区情况	江苏省省级水土流失重点预防区		地貌类型	平原
		原地貌土壤侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	160		容许土壤流失量 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	500
项目选址(线)水土保持评价		项目选址(线)不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区,不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带,不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。但本工程无法避让江苏省省级水土流失重点预防区,水土流失防治标准将采用南方红壤区一级标准。施工中严格控制占地面积;加强表土资源保护;设置泥浆沉淀池,避免泥浆外排;设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流失。因此,项目无重				

	大水土保持制约因素。			
预测水土流失总量 (t)	53.55			
防治责任范围 (m <sup>2</sup> )	44871			
防治标准等级及目标	防治标准等级		南方红壤区一级标准	
	水土流失治理度 (%)	98	土壤流失控制比	1.0
	渣土防护率 (%)	97	表土保护率 (%)	92
	林草植被恢复率 (%)	98	林草覆盖率 (%)	27
水土保持措施	防治分区	工程措施	植物措施	临时措施
	塔基区	表土剥离 3124m <sup>3</sup> 土地整治 31764m <sup>2</sup>	撒播草籽 1415m <sup>2</sup>	防尘网苫盖 22000m <sup>2</sup> 土质排水沟 3260m 土质沉沙池 32 座 泥浆沉淀池 33 座
	牵张场及跨越场区	土地整治 6200m <sup>2</sup>	撒播草籽 400m <sup>2</sup>	铺设钢板 2400m <sup>2</sup> 彩条布铺垫 3400m <sup>2</sup>
	施工道路区	土地整治 5440m <sup>2</sup>	/	钢板铺设 4200m <sup>2</sup>
水土保持投资估算 (万元)	工程措施	25.70	植物措施	0.37
	临时措施	78.33	水土保持补偿费	4.4871
	独立费用	建设管理费		2.08
		水土保持监理费		2.60
		设计费		7.41
		水土保持设施验收费		5.00
总投资	133.29			
编制单位	江苏辐环环境科技有限公司	建设单位	国网江苏省电力有限公司 南通供电分公司	
法人代表及电话	潘葳 /	法人代表及电话	肖树 /	
地址	南京市建邺区庐山路 168 号 1011 室	地址	南通市青年中路 52 号	
邮编	210019	邮编	210024	
联系人及电话	/	联系人及电话	/	
电子信箱	/	电子信箱	/	
传真	/	传真	/	

## 方案报告表补充说明

### 1 项目简况

#### 1.1 项目概况

##### 1.1.1 项目基本情况

建设地点：项目位于南通市启东市吕四港镇、海门区包场镇。启东吕四渔光互补光伏升压站 T 接东洲~中天钢铁 220 千伏线路工程起于启东吕四渔光互补光伏升压站外 T1 (/)，终于 T 接点新建塔 T33 (/)。

建设必要性：启东市华尔晟新能源科技有限公司启东市吕四海域 1.35GW 滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400 兆瓦位于江苏省启东市吕四外侧海域，由启东市华尔晟新能源科技有限公司投资建设，目前已取得前期环评、规划等手续，尚未开工建设。为满足吕四海域 1.35GW 滩涂渔光互补光伏发电项目一期工程的送电需求，国网江苏省电力有限公司南通供电分公司建设南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程具有必要性。

前期工作：（1）2024 年 2 月，启东市吕四港镇建设局、海门区包场镇建设局同意了本工程路径方案；（2）2024 年 3 月 29 日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司关于南通启东吕四海域滩涂渔光互补光伏项目配套 220 千伏送出工程可行性研究报告的批复》（苏电发展可研批复〔2024〕13 号）对本工程可行性研究报告进行了批复；（3）2024 年 4 月 1 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2024〕367 号）对本工程核准进行了批复。（4）2024 年 4 月 15 日，国网江苏电力设计咨询有限公司以《国网江苏电力设计咨询有限公司关于上报南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400MW 配套 220kV 送出工程初步设计评审意见的报告》（苏电设技术〔2024〕63 号）对本工程初设形成了评审意见。

（5）本工程架空线路跨越东灶港、东灶新河、北串场河以及海堤，建设单位国网江苏省电力有限公司南通供电分公司已开展本工程防洪评价招标工作，涉及防洪段线路需取得洪评许可后方可开工建设，建设单位洪评承诺见附件。

工程规模：项目分为点型工程和线型工程，共改造 1 个 220 千伏出线间隔（无

土建)；新建架空线路路径长约 9.90km，新建杆塔 35 基（均为角钢塔，其中 2 基为裕度，不建设），采用灌注桩基础；拆除杆塔 1 基。

#### (1) 点型工程

东洲 500 千伏变电站 220 千伏间隔保护改造工程：本期 1 回线路保护更换，不涉及土建。

#### (2) 线型工程

启东吕四渔光互补光伏升压站 T 接东洲 ~ 中天钢铁 220 千伏线路工程：新建双回架空线路总长约为 9.9km，新建杆塔 35 基（均为角钢塔，其中 2 基为裕度，不建设）；拆除杆塔 1 基。

工程占地：本工程总占地面积为 44871m<sup>2</sup>，其中永久占地为 7973m<sup>2</sup>，临时占地为 36898m<sup>2</sup>；占地类型为耕地、交通运输用地、其他土地。

工程挖填方：项目挖填方总量 31426m<sup>3</sup>，其中挖方总量 15713m<sup>3</sup>（表土剥离 3124m<sup>3</sup>，基础开挖 12589m<sup>3</sup>），回填总量 15713m<sup>3</sup>（表土回覆 3124m<sup>3</sup>，基础回填 12589m<sup>3</sup>），无余方，无借方。

工期安排：项目计划于 2024 年 7 月开工，计划于 2024 年 11 月完工，总工期 5 个月。

工程总投资：项目总投资 / 万元，其中土建投资约 / 万元。

### 1.1.2 项目组成情况

本工程由国网江苏省电力有限公司南通供电分公司统一建设。经济技术指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 项目主要经济技术指标表

基本概况			
项目名称	南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目 一期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程	工程性质	新建输变电工程
建设单位	国网江苏省电力有限公司南通供电分公司	建设期	2024.07-2024.11
建设地点	南通市启东市吕四港镇、海门区包场镇	总投资	/万元
电压等级	220kV	土建投资	/万元
工程规模	<p>项目分为点型工程和线型工程，共改造 1 个 220 千伏出线间隔（无土建）；新建架空线路路径长约 9.90km，新建杆塔 35 基（其中 2 基为裕度，不建设），采用灌注桩基础；拆除杆塔 1 基。</p> <p>(1) 点型工程 东洲 500 千伏变电站 220 千伏间隔保护改造工程：本期 1 回线路保护更换，不涉及土建。</p> <p>(2) 线型工程</p>		

启东吕四渔光互补光伏升压站 T 接东洲 ~ 中天钢铁 220 千伏线路工程：新建架空线路路径长约 9.90km，新建杆塔 35 基（其中 2 基为裕度，不建设），采用灌注桩基础。	
<b>架空经济技术指标</b>	
电压等级	220kV
新建架空线路长度	9.90km
杆塔使用基数	新建杆塔 35 基（其中 2 基为裕度，不建设）
导线型号	2×NRLH60/LB20A-630/45
地线型号	OPGW-150
拆除杆塔数量	1

### 1.1.3 工程布置情况

#### (1) 平面布置

启东吕四渔光互补光伏升压站 T 接东洲 ~ 中天钢铁 220 千伏线路工程

本工程线路自拟建启东吕四渔光互补光伏升压站采用架空向南出线，跨过 G328 公路后向西走线，经启东吕四国家基准气候站东侧向南绕行，沿途跨越洋吕铁路，至六斧头村委会南侧后向西走线，途经天汾镇村、闸河村，至闸河村四十七组西侧后向北走线再次跨越洋吕铁路后向西，而后依次沿洋吕铁路北侧、S221（旧）北侧、G328 国道南侧向西走线，而后在前哨村委南侧跨过 G328 国道、东灶港河，至中天钢铁 ~ 东洲 26U4 线 008#塔西侧 T 接点。

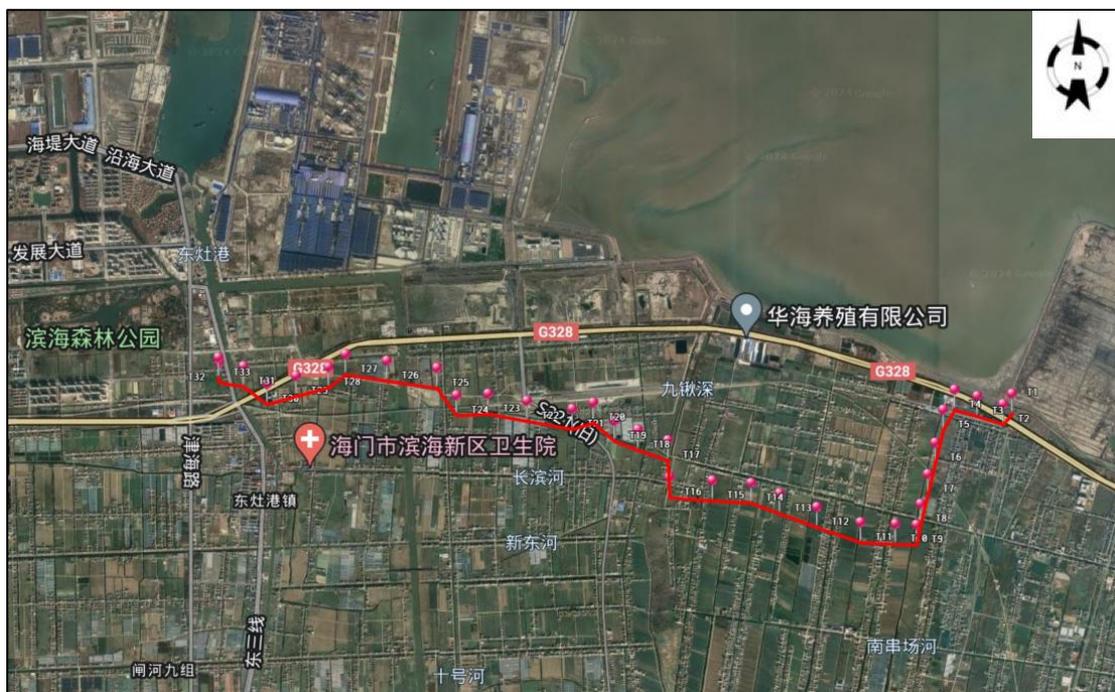


图 1.1-1 启东吕四渔光互补光伏升压站 T 接东洲 ~ 中天钢铁 220 千伏线路工程路径示意图

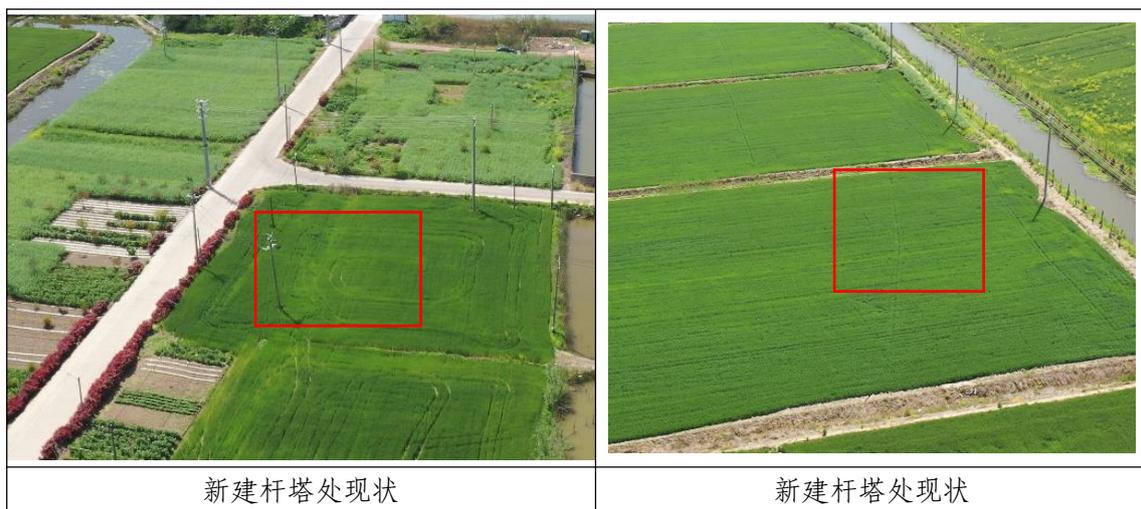


图 1.1-2 线路工程沿线现状照片

本工程新建杆塔经纬度坐标见表 1.1-2。

表 1.1-2 新建杆塔中心经纬度坐标一览表

序号	N (北纬)	E (东经)	行政区划	序号	N (北纬)	E (东经)	行政区划
T1*			启东市 吕四港镇	T17*			海门区 包场镇
T2*				T18			
T3				T19*			
T4*				T20*			
T5*				T21*			
T6				T22			
T7				T23*			
T8				T24*			
T9*				T25*			
T10*				T26			
T11*				T27*			
T12				T28*			
T13				T29			
T14*				T30*			
T15				T31*			
T16*				T32*			
			T33*				

注：\*杆塔为转角塔

## (2) 竖向设计

本工程线路沿线所属地貌类型为苏北滨海平原区，地貌单一，地势平坦，线路沿线高程为 2.54~3.05m，沿线以农田为主，交通条件一般。

## (3) 施工组织

### ①施工用水、排水、用电、通信系统

用水:本工程线路施工水源采取市政自来水取水与附近河流抽水取水相结合的方案。

排水:本工程线路施工临时排水通过排水沟,至沉沙池沉淀后排入临近道路的市政雨污水管网或附近的沟渠中,且外排水量较小,不会对附近的管网、沟渠造成影响。

用电:本工程线路周围已有用电用户区,可按照安全用电规定引接用于施工用电;线路工程周围无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源。

通信:本工程施工场地内施工人员相对较少,可利用无线通信设备进行联络。

### ②施工生产生活区

本工程线路工程根据沿线的交通情况,拟租用已有库房或场地作为材料站,具体地点由施工单位根据施工中具体情况选定,便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。此外线路施工时由于线路塔基及牵张场较分散,施工周期不长,因此工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。

### ③临时堆土

本工程塔基区施工开挖的土方堆放在塔基临时施工场地内设置的临时堆土区,堆土用防尘网进行苫盖,施工后期全部回填并压实平整。表土在区域内单独设置堆土场地与其他土方分开,堆土边坡比不大于 1:1.0,堆土高度不超过 2.5m,施工后期全部回填并压实平整。

### ④施工道路

本工程线路施工对外交通主要解决建筑材料、塔材和牵引张拉设备等运输问题,可充分利用沿线附近的国道、省道、县道、乡道、村道通行。现有交通条件能基本满足建筑材料、塔材和牵引张拉设备运输要求,新建、拆除杆塔位于耕地中,需要临时开辟道路,以满足材料运输要求;新开辟的道路铺设钢板进行保护。本工程需开辟施工临时道路共 1360m,道路平均宽度 4m,占地面积约为 5440m<sup>2</sup>。

### ⑤牵张场设置

为方便机械设备和导线的运输与吊装,在牵张场地内规划出施工通道,通道宽度在 3.0m 左右,一般满足一辆大卡车通行便可,通道做适当平整后铺设钢板,钢板铺设做到横平竖直,钢板搭头无上翘。根据工程路线走向及地形条件,本工程布设牵张场 4 处,平均每处占地面积约为 1000m<sup>2</sup>,总占地面积约为 4000m<sup>2</sup>。

## ⑥跨越施工场地

本工程沿线需跨越 G328 国道 2 次、S221 省道 3 次、X211 县道 1 次、洋吕铁路 2 次、东灶港 1 次、东灶新河 1 次、北串场河 3 次，综合布置 12 处跨越施工场地，平均每处占地面积约 100~400m<sup>2</sup>，总占地面积约为 2200m<sup>2</sup>。

表 1.1-3 工程主要跨越情况统计表

序号	跨越对象	备注
1	道路	G328 国道 2 次、S221 省道 3 次、X211 县道 1 次、洋吕铁路 2 次
2	河流	东灶港 1 次、东灶新河 1 次、北串场河 3 次
合计		有 13 次跨越，综合布设跨越场 12 处，总占地面积约为 2200m <sup>2</sup>



图 1.1-3 跨越处现场照片

## (4) 施工工艺

## ①塔基施工

## 1) 表土剥离保护

塔基开挖前做好表层土壤的剥离和保护，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，顶部采用防尘网进行苫盖。

## 2) 灌注桩基础

灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔：成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注入人工泥浆或利用钻削下来的粘性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。扩壁泥浆与钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。当钻孔达到规定深度后，安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的泥浆被抽吸出来，施工结束后，泥浆在泥浆沉淀池中沉淀干化，深埋于施工区域 1m 以下。每基施工场地需布设一个泥浆沉淀池。

由于本工程仅 1 基杆塔 (T2) 位于鱼塘中, 基础采用承台灌注桩基础, 施工范围和开挖量均较大, 且由于同期建设的江苏南通吕四海域滩涂渔光一期 400MW 光伏 110 千伏送出工程有 1 基杆塔 (J2) 同样位于此鱼塘中, 综合考虑施工条件, 采用干塘施工。

### 3) 杆塔拆除施工

杆塔拆除施工工艺流程为: 现场勘测→停电验电→拆除附件→拆除导、地线→拆除金具、回收导线→拆除杆塔、回收塔材→拆除基础、破碎深埋→施工场地清理。本工程采用分段分片方法拆除铁塔。由于拆除塔基较分散, 每基塔产生的建筑垃圾较少, 考虑就地破碎回填至地表以下 1.0m, 以不影响植被恢复。

#### 1.1.4 工程占地概况

工程总占地面积约为 44871m<sup>2</sup>, 其中永久占地为 7973m<sup>2</sup>, 为塔基区永久占地 7973m<sup>2</sup>; 临时占地为 36898m<sup>2</sup>, 含塔基区临时占地 25258m<sup>2</sup>、牵张场及跨越场区临时占地 6200m<sup>2</sup>、施工道路区临时占地 5440m<sup>2</sup>。占地类型为耕地 41801m<sup>2</sup>、交通运输用地 400m<sup>2</sup>、其他土地 2670m<sup>2</sup>。

##### (1) 塔基区

根据现场勘查和查阅设计文件, 本工程新建杆塔 33 基, 均为角钢塔。其中基础型式为单桩灌注桩的新建角钢塔施工总占地面积按 (根开+基础立柱宽+15m)<sup>2</sup> 计算, 共 13 基; 基础型式为群桩承台灌注桩的新建角钢塔施工总占地面积按 (根开+基础立柱宽+20m)<sup>2</sup> 计算, 共 20 基; 永久占地面积均按 (根开+基础立柱宽+2m)<sup>2</sup> 计算。拆除角钢塔 1 基, 施工总占地面积按每基 100m<sup>2</sup> 计算。

塔基区总占地面积 33231m<sup>2</sup>, 其中永久占地 7973m<sup>2</sup>, 临时占地 25258m<sup>2</sup>。本工程输电线路杆塔型式及占地面积详见表 1.1-4。

表 1.1-4 塔基区占地情况表

铁塔型号	呼高 (m)	数量 (基)	根开/根径 (mm)	基础立柱宽 (m)	永久占地 (m <sup>2</sup> )	临时占地 (m <sup>2</sup> )	总占地 (m <sup>2</sup> )
220-HD21S-Z1*	33	2	8100	0.8	238	904	1142
220-HD21S-Z2*	39	2	10260	1.0	352	1027	1379
220-HD21S-ZK*	48	1	11356	1.0	206	542	748
	51	3	11896	1.0	666	1669	2335
	57	1	12966	1.0	255	584	839
220-HD21S-J1*	27	1	10368	1.2	184	522	706
	30	1	11190	1.2	207	543	750

铁塔型号	呼高 (m)	数量 (基)	根开/根径 (mm)	基础立柱 宽(m)	永久占地 (m <sup>2</sup> )	临时占地 (m <sup>2</sup> )	总占地 (m <sup>2</sup> )
	36	2	12834	1.2	514	1172	1686
220-HD21S-J2	27	3	11267	1.4	645	2556	3201
	33	3	13133	1.4	820	2758	3578
220-HD21S-J1K	27	1	10486	1.2	187	817	1004
	33	1	12157	1.2	236	877	1113
220-HD21S-J2K	36	1	13084	1.4	272	917	1189
	39	1	13889	1.4	299	946	1245
220-HD21S-J3	27	2	11556	1.4	447	1725	2172
220-HD21S-J4	27	4	12022	1.6	976	3546	4522
	36	2	14956	1.6	689	1984	2673
220-HD21S-DJ	36	2	16143	1.6	780	2069	2849
拆除角钢塔	/	1	/	/	0	0	100
<b>合计</b>	/	<b>34</b>	/	/	<b>7973</b>	<b>25258</b>	<b>33231</b>

注：\*塔基基础型式为单桩灌注桩

### (2) 牵张场及跨越场区

根据现场勘查,线路沿线共设置牵张场4处,平均每处占地面积约为1000m<sup>2</sup>;线路沿线共设置跨越场地12处,平均每处占地面积约为100~400m<sup>2</sup>。因此,本工程牵张场及跨越场区总占地面积为6200m<sup>2</sup>,均为临时占地。

### (3) 施工道路区

根据现场勘查,本工程需布设施工临时道路长1360m,道路平均宽度4m。因此,施工临时道路总占地面积为5440m<sup>2</sup>,为临时占地。

本工程各分区占地情况见表1.1-5。

表 1.1-5 工程分区占地情况统计表 单位: m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地面积	占地类型			
	永久	临时		耕地	其他土地		
					交通运输用地 绿化带	空闲地	设施农用地
塔基区	7973	25258	33231	30561	0	1425	1245
牵张场及跨越场区	0	6200	6200	5800	400	0	0
施工道路区	0	5440	5440	5440	0	0	0
<b>合计</b>	<b>7973</b>	<b>36898</b>	<b>44871</b>	<b>41801</b>	<b>400</b>	<b>1425</b>	<b>1245</b>

注:设施农用地为鱼塘。

## 1.1.5 土石方平衡情况

### (1) 塔基区

### 1、表土剥离和回覆

塔基区占用耕地、空闲地和设施农用地，耕地可剥离表土厚度约 0.3m，施工前期对占用耕地、空闲地区域的塔基区塔基永久占地、泥浆沉淀池、拆除基础等开挖区域进行表土剥离，剥离面积 10413m<sup>2</sup>，表土剥离量为 3124m<sup>3</sup>。剥离的表土堆放在塔基区的临时堆土区域，临时堆土采用防尘网临时苫盖。施工后期对塔基区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土全部回覆利用，表土回覆量为 3124m<sup>3</sup>。

### 2、基础土方开挖与回填

通过现场勘查，拆除角钢塔开挖面约 16m<sup>2</sup>/基，挖深约 1.5m，拆除角钢塔产生建筑垃圾约 6m<sup>3</sup>/基，挖方量共 24m<sup>3</sup>（建筑垃圾 6m<sup>3</sup>）。由于拆除单基杆塔产生的建筑垃圾较少，考虑就地破碎回填至地表以下 1.0m，以不影响复耕和植被恢复。填方量共 24m<sup>3</sup>（建筑垃圾 6m<sup>3</sup>），无余方，无借方。

通过表 1.1-6 计算可得，全线塔基基础开挖产生的土方、钻渣和泥浆沉淀池开挖产生的土方共约为 12208m<sup>3</sup>。施工期在新建塔基施工区域四周需设置土质排水沟，共计开挖排水沟 3260m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 261m<sup>3</sup>。在每基塔排水沟末端设置土质沉沙池，尺寸长×宽×高为 2.0m×1.0m×1.5m，单个沉沙池容积为 3m<sup>3</sup>，共计 32 座，开挖土方 96m<sup>3</sup>。

表 1.1-6 塔基区新建杆塔基础土石方挖填情况表

基础类型	杆塔名称	呼高 (m)	基础型号	基础数量 (只)	承台尺寸 (m×m)	承台埋深 (m)	桩径 (m)×根数	桩长 (m)	泥浆量 (m <sup>3</sup> )	泥浆池挖方量 (m <sup>3</sup> )	承台挖方量 (m <sup>3</sup> )	挖方量 (m <sup>3</sup> )	填方量 (m <sup>3</sup> )
单桩	220-HD21S-Z1	33	DZ2	12	/	/	0.8×1	11.5	69	69	/	138	138
	220-HD21S-Z2	39	DZ3	8	/	/	1.0×1	9.5	60	60	/	120	120
	220-HD21S-ZK	48	DZ4	4	/	/	1.0×1	12.5	39	39	/	78	78
		51	DZ5	12	/	/	1.0×1	17	160	160	/	320	320
		57	DZ6	4	/	/	1.0×1	15.5	49	49	/	98	98
	220-HD21S-J1	27	DZ7	4	/	/	1.2×1	21.5	97	97	/	194	194
		30	DZ7	4	/	/	1.2×1	21.5	97	97	/	194	194
		36	DZ8	8	/	/	1.2×1	24	217	217	/	434	434
	群桩承台	220-HD21S-J2	27	CTZ1B	6	4×4	2	0.8×4	14	169	169	192	530
CTZ1Y				6	4×4	2	0.8×4	14.5	175	175	192	542	542
33			CTZ2B	6	4×4	2	0.8×4	15.5	187	187	192	566	566
			CTZ2Y	6	4×4	2	0.8×4	15	181	181	192	554	554
220-HD21S-J1K		27	CTZ3	4	4×4	2	0.8×4	16.5	133	133	128	394	394
		33	CTZ3	4	4×4	2	0.8×4	16.5	133	133	128	394	394
220-HD21S-J2K		36	CTZ4B	2	6.4×4	2.3	0.8×6	15.5	93	93	118	304	304
			CTZ4Y	2	6.4×4	2.3	0.8×6	17	103	103	118	324	324
		39	CTZ4B	2	6.4×4	2.3	0.8×6	15.5	93	93	118	304	304
			CTZ4Y	2	6.4×4	2.3	0.8×6	17	103	103	118	324	324
220-HD21S-J3		27	CTZ5B	4	4×4	2.3	0.8×4	20	161	161	147	469	469
			CTZ5Y	4	4×4	2.3	0.8×4	22	177	177	147	501	501

## 1 项目简况

基础类型	杆塔名称	呼高 (m)	基础型号	基础数量 (只)	承台尺寸 (m×m)	承台埋深 (m)	桩径 (m)×根数	桩长 (m)	泥浆量 (m <sup>3</sup> )	泥浆池挖方量 (m <sup>3</sup> )	承台挖方量 (m <sup>3</sup> )	挖方量 (m <sup>3</sup> )	填方量 (m <sup>3</sup> )
	220-HD21S-J4	27	CTZ6B	8	6.4×4	2.5	0.8×6	16	386	386	512	1284	1284
			CTZ6Y	8	6.4×4	2.5	0.8×6	19	458	458	512	1428	1428
		36	CTZ6B	4	6.4×4	2.5	0.8×6	16	193	193	256	642	642
			CTZ6Y	4	6.4×4	2.5	0.8×6	19	229	229	256	714	714
	220-HD21S-DJ	36	CTZ7	8	6.4×4	2.5	0.8×6	18.5	446	446	512	1404	1404
合计	/		/	<b>132</b>	/	/	/	/	<b>4185</b>	<b>4185</b>	<b>3838</b>	<b>12208</b>	<b>12208</b>

注：承台挖方量=基础数量×承台尺寸×承台埋深；泥浆量=基础数量× $\pi$ ×(桩径/2)<sup>2</sup>×桩长×根数。挖方量=泥浆量+泥浆池挖方量+承台挖方量。

综上所述，塔基区挖方量 15713m<sup>3</sup>（含表土剥离 3124m<sup>3</sup>），填方量 15713m<sup>3</sup>（含表土回覆 3124m<sup>3</sup>），无余方，无借方。

### （2）牵张场及跨越场区

牵张场及跨越场区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故牵张场及跨越场区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

### （3）施工道路区

施工道路区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故施工道路区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

### （4）工程土石方汇总

本工程土石方开挖总量为 15713m<sup>3</sup>（含表土剥离 3124m<sup>3</sup>），回填总量 15713m<sup>3</sup>（含表土回覆 3124m<sup>3</sup>），无余方，无借方。

表 1.1-7 土石方平衡情况表 单位：m<sup>3</sup>

分区	挖方量			填方量			借方量	余方量
	表土	基础	建筑垃圾	表土	基础	建筑垃圾		
塔基区	3124	12583	6	3124	12583	6	0	0
牵张场及跨越场区	0	0	0	0	0	0	0	0
施工道路区	0	0	0	0	0	0	0	0
小计	3124	12583	6	3124	12583	6	0	0
合计	15713			15713			0	0

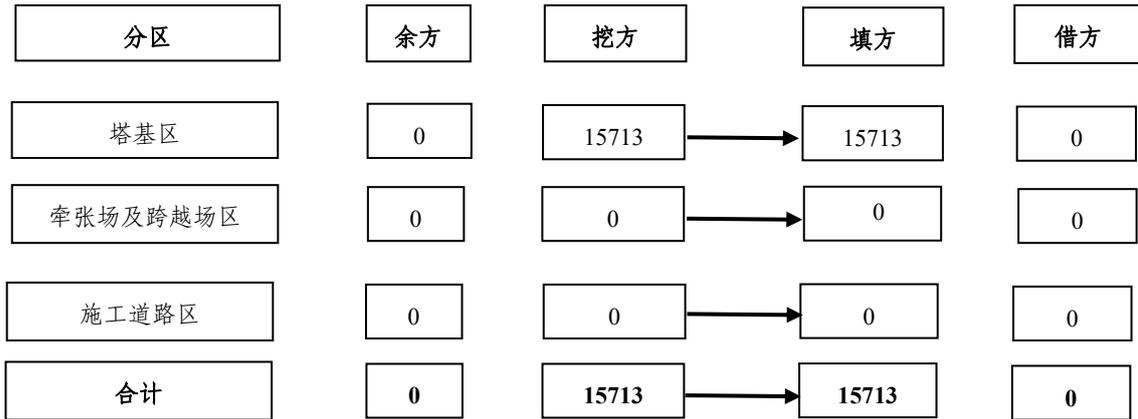


图 1.1-4 土石方平衡流向框图 单位: m<sup>3</sup>

表 1.1-8 表土平衡一览表 单位: m<sup>3</sup>

分区	表土剥离	表土回覆	调入	调出	借方	综合利用
塔基区	3124	3124	/	/	0	0
合计	3124	3124	/	/	0	0



图 1.1-5 表土平衡流向框图 单位: m<sup>3</sup>

### 1.1.6 项目施工进度情况

本项目主体工程施工进度情况见表 1.1-9。

表 1.1-9 项目主体工程施工进度表

工程名称		施工期				
		2024 年				
		7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
杆塔施工	基础施工	—————				
	杆塔组立			—————		
	架线施工				—————	
	拆除施工					—————
	场地整理				—————	

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 地形地貌

线路沿线地貌类型为苏北滨海平原区，地貌单元为滨海平原，地貌单一，地势平坦，线路沿线高程为 2.54~3.05m，沿线以农田为主，交通条件一般。

### 1.2.2 地质地震

根据勘探结果可知，沿线地基土主要由第四系全新统海相沉积成因的粉质黏土、粉砂、粉土、淤泥质粉质黏土夹粉土、粉质黏土夹粉土、粉质黏土夹粉砂、粉砂夹粉土和粉土夹粉砂等组成，表层局部分布一定厚度人工堆积成因的填土。

根据《中国地震动参数区划图》的规定，沿线地区在II类场地条件下基本地震动峰值加速度为 0.05g（相应的地震烈度为VI度），基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.45s（相应的设计地震分组为第三组）。

### 1.2.3 水系情况

本工程水利分区属于九吕高水系。九吕高水系地区地面高程一般在 3.15~4.15m 之间，以通吕运河尾端为主干，由南北串场河向东西延伸，然后以总沟网覆盖全县，主要跨越主海堤、重要入海通道东灶新河、东灶港以及北串场河。

东灶新河是海门市境内重要的入海通道，起点为通吕运河，终点为东灶新河闸，航道长约 5.3km。

本工程 T1 塔因升压站出线限制，导致其位于主海堤南侧，G328 北侧。根据启东市水务局提供资料以及现场测绘资料，启东市人民政府《启东市河道和水利工程管理范围划定项目成果公告》，线路跨越的海堤管理范围为“海堤迎水坡以坡脚外 200 米为界；背水坡有海堤河的以海堤河为界（含水面）；无海堤河的，以坡脚外 30 米为界”。本工程 T1 塔所处位置位于海堤管理范围，需按照相关要求开展防洪评价。

### 1.2.4 气候特征

项目所在地属北亚热带季风气候区，四季分明，雨水充沛，光照较足，无霜期长，根据海门站（1954 年~2020 年）气象资料统计数据，项目区多年气象要素情况如下：

表 1.2-1 工程项目区域气象特征值一览表

编号	气象要素		数值及单位
1	气温	多年平均气温	15.3℃
		多年绝对最高气温极值	39.7℃（2013.8.8）
		多年绝对最低气温极值	-9.3℃（2016.1.24）
2	降水量	多年平均降水量	1041.7mm

编号	气象要素		数值及单位
		多年最大降水量	1724.5mm (2015)
		多年最小降水量	650.9mm (1978)
3	气压	多年平均大气压	1015.8hPa
4	空气湿度	多年平均相对湿度	80%
5	风速	多年平均风速	3.3m/s
		多年最大风速	34.0m/s (2000.5.13)
		多年主导风向	ENE~ESE
		风季时段	7-9
6	积温	≥10°C的积温	4882.1
7	蒸发量	多年平均蒸发量	840
8	无霜期	无霜期	224-239d
9	冻土	最大冻土深度	20cm

### 1.2.5 土壤和植被

南通市主要有四大土壤类型，分别为潮土、盐土、水稻土和棕色石灰土。通过现场勘察，项目区及沿线土壤主要类型为潮土、水稻土。通过前期地勘，项目施工所涉及区域可剥离表土厚度约为 0.3m。

项目区植被类型属北亚热带常绿落叶阔叶混交林。植被资源丰富，长势良好。项目区及周边主要为自然植被，长势良好的乔灌树种有香樟、桂花、紫薇、合欢、紫叶李、女贞、黄杨及红叶石楠等；草有狗牙根、结缕草等。项目施工占地现状主要为耕地，林草覆盖率约 5%。

### 1.3 水土保持分析与评价

本工程线路路径途经南通市启东市和海门区，结合现场情况，经细致踏勘和搜资调查，主体工程设计提出如下两个线路路径方案进行比选。

方案 1: 新建线路采用架空向南出线，跨过 G328 公路后，右转向西走线，经启东吕四国家基准气候站东侧向南绕行，至六斧头村委会南侧后向西走线，在前哨村委南侧跨过 G328 国道、东灶港河，至中洲 26U4 线 008#塔西侧 T 接点。

方案 2: 新建线路采用架空向南出线，跨过 G328 公路后，右转向西走线，经启东吕四国家基准气候站东侧向南绕行，至六斧头村委会南侧后向西走线，至闸河村四十七组西侧后向北走线后左转向西，在前哨村委南侧跨过 G328 国道、东灶港河，至中洲 26U4 线 008#塔西侧 T 接点。

两个方案选址选线均位于南通市启东市吕四港镇、海门区包场镇，但根据经济技术对比，方案一在路径长度及杆塔数量上少于方案二，本体投资略低。跨越

房屋数量略多于方案二，政处难度相对较大。方案二在铁路设计里程 DK55+800 处跨越洋吕铁路，根据与洋吕铁路设计单位对接，该区域已属车站站内道岔咽喉区域，设有信号机。根据 GB 50545-2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》表 13.0.11 要求：不宜在铁路信号机以内跨越。故方案二不具备可行性。

根据上述对比分析结果，综合规划部门的意见，推荐路径方案一作为本次新建线路路径方案。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）对工程水土保持制约性因素进行分析和评价。工程所在区不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；不属于水土流失严重、生态脆弱的地区；不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区；不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地和生态脆弱区等。依据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》的公告（苏水农〔2014〕48号），项目区所在地涉及江苏省省级水土流失重点预防区。

由于项目选址选线无法避让江苏省省级水土流失重点预防区。因此，本工程在主体施工上优化了施工工艺，严格控制占地面积，加强对表土资源的保护；通过设置泥浆沉淀池措施避免了泥浆外排，通过采取苫盖、排水、沉沙等措施减少了水土流失。因此，从水土保持的角度分析，本工程无重大水土保持制约因素。

### 1.4 水土流失防治目标及防治责任范围

#### 1.4.1 设计水平年

本工程计划 2024 年 7 月开工，2024 年 11 月完工，因此确定本方案设计水平年为主体工程完工后的第一年，即 2025 年。

#### 1.4.2 防治目标

项目位于南通市启东市吕四港镇、海门区包场镇境内，根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，项目区属于南方红壤区——江淮丘陵及下游平原区——江淮下游平原农田防护水质维护区——苏中沿江平原农田防护水质维护区。根据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》的公告（苏水农〔2014〕48号），本工程属于江苏省省级水土流失重点预防区。根据

《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本工程水土流失防治标准应执行南方红壤区一级标准。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）4.0.7 节规定土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1；根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）3.2.2 节第 4 条规定对无法避让的水土流失重点治理区和重点预防区的生产建设项目，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点。

因此本工程水土流失防治标准如下：施工期渣土防护率应达 95%，表土保护率应达 92%；至设计水平年，水土流失治理度应达 98%，土壤流失控制比应达 1.0，渣土防护率应达 97%，表土保护率应达 92%，林草植被恢复率应达 98%，林草覆盖率应为 27%。防治目标具体情况见表 1.4-1：

表 1.4-1 防治标准指标计算表

指标	标准值		侵蚀强度调整	两区调整	方案目标值	
	施工期	设计水平年	微度	省级水土流失重点预防区	施工期	设计水平年
水土流失治理度 (%)	/	98	/	/	/	98
土壤流失控制比	/	0.90	+0.1	/	/	1.0
渣土防护率 (%)	95	97	/	/	95	97
表土保护率 (%)	92	92	/	/	92	92
林草植被恢复率 (%)	/	98	/	/	/	98
林草覆盖率 (%)	/	25	/	+2	/	27

### 1.4.3 防治责任范围

按照“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），结合本工程占地概况、水土流失影响分析，对工程建设及生产可能造成水土流失范围进行界定，以确定水土流失防治责任范围。确定本工程水土流失防治责任范围为 44871m<sup>2</sup>，其中永久占地为 7973m<sup>2</sup>，临时占地为 36898m<sup>2</sup>。

表 1.4-2 水土流失防治责任范围 单位：m<sup>2</sup>

防治分区	占地性质		总占地面积
	永久占地面积	临时占地面积	
塔基区	7973	25258	33231
牵张场及跨越场区	0	6200	6200
施工道路区	0	5440	5440
<b>防治责任范围</b>	<b>7973</b>	<b>36898</b>	<b>44871</b>

## 2 水土流失量预测与水土保持措施布设

### 2.1 水土流失量预测

#### 2.1.1 预测单元

本工程水土流失预测范围为 44871m<sup>2</sup>。预测单元为工程建设扰动地表的时段和形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本工程的预测单元可分为塔基区、牵张场及跨越场区和施工道路区。

#### 2.1.2 预测时段

本项目为新建输变电工程，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。各区域水土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，并按照最不利情况考虑。施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。南通市雨季主要是 5~9 月份。

本项目计划 2024 年 7 月开工，计划 2024 年 11 月完工。根据项目本身建设进度，水土流失预测时段情况详见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目水土流失预测单元及时段表

阶段	预测单元	施工时段	预测时段 (a)	主要内容
施工期	塔基区	2024.7-2024.11	0.60	塔基基础建设 (每基塔平均施工 3 个月)
	牵张场及跨越场区	2024.9-2024.11	0.60	架线施工
	施工道路区	2024.7-2024.11	0.60	车辆占压 (平均每处施工 3 个月)
自然恢复期	塔基区	2024.12-2026.11	2.00	无
	牵张场及跨越场区	2024.12-2026.11	2.00	无
	施工道路区	2024.12-2026.11	2.00	无

#### 2.1.3 土壤侵蚀模数

根据《南通市水土保持规划（2015-2030 年）》以及现场调查，项目区地形为平原，结合江苏省水土流失分布图，最终确定项目所在区域土壤侵蚀强度为微度，参照项目区同类项目监测数据，确定土壤侵蚀模数背景值为 160t/(km<sup>2</sup>·a)。

本工程施工期各区域侵蚀模数采取类比分析法，通过类比“南通龙腾 110 千伏输变电工程”获得。类比工程已于 2022 年 10 月通过了国网江苏省电力有限

公司组织的水土保持设施验收，并投入运行，本工程水土保持监测单位为江苏辐环环境科技有限公司，验收报告编制单位为江苏通凯生态科技有限公司。参考性分析对照详见表 2.1-2。

表 2.1-2 参考性分析对照表

项目	南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程	南通龙腾 110 千伏输变电工程	类比结果
地理位置	南通市启东市、海门区	南通市南通经济技术开发区	相近
气候条件	北亚热带季风性气候	北亚热带季风性气候	相同
年平均降水量	1041.7mm	1089.7mm	相近
地形地貌	平原	平原	相同
土壤类型	潮土、水稻土	潮土、水稻土	相同
水土流失强度	微度水蚀	微度水蚀	相同

表 2.1-3 类比项目实际监测侵蚀模数统计表

预测时段	南通龙腾 110 千伏输变电工程	实际监测侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]
施工期	塔基区	780
	牵张场及跨越场区	490
	施工道路区	619

本工程与类比工程均为输变电工程，地理位置相近，均在南通市，多年平均降水量相近，气候条件、土壤类型、地形地貌、水土流失强度等相同，因此本工程与类比工程有一定的可比性。根据各区的施工特点对类比工程的侵蚀模数进行修正后可应用于本工程。

针对本工程的环境条件、施工条件和防护措施条件等实际情况，对扰动地表后侵蚀模数的取值，在下列三个方面进行修正。

1) 环境条件：本工程所在区域多年平均降水量为 1041.7mm，类比工程所在区域多年平均降水量为 1089.7mm，相差极小，因此，设置修正系数为 1.0。

2) 扰动强度：本工程土石方工程量和扰动地表的强度与类比工程相似，差别较小，因此，设修正系数 1.0。

3) 防护措施条件：类比工程所列监测结果是在工程施工过程中采取了一定的水土保持措施的基础上进行监测的，若施工过程中不采取任何措施，则工程扰动后的土壤侵蚀模数将会比监测结果大。而水土流失量预测的基础是按生产建设项目正常的设计功能，在无水土保持工程条件下可能产生的土壤流失量。因此，设置修正系数为 2.0。

自然恢复期：项目建成，植被种植完成后，开始发挥保水保土的作用，塔基区除硬化部分，自然恢复期水土流失治理达标，土壤侵蚀模数达到背景值，各防治分区的侵蚀模数见表 2.1-4。

表 2.1-4 扰动后土壤侵蚀模数类比表

预测时段	南通龙腾 110 千伏输变电工程（类比）		调整系数			南通启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电项目一期 400 兆瓦配套 220 千伏送出工程（本工程）	
	防治分区	监测土壤侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	环境条件	扰动强度	防护措施条件	防治分区	预测土壤侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]
施工期	塔基区	780	1.0	1.0	2.0	塔基区	1560
	牵张场及跨越场区	490	1.0	1.0	2.0	牵张场及跨越场区	980
	施工道路区	619	1.0	1.0	2.0	施工道路区	1238

### 2.1.4 预测结果

根据上述确定的土壤侵蚀模数，按公式法进行各分区水土流失量估算。结合项目预测单元及预测时段划分，预测项目建设时如不采取水土保持措施可能产生土壤流失量，结果见表 2.1-5。

根据分时段计算结果可知，如不采取水保措施，项目在整个建设期可能产生土壤流失总量为 53.55t，新增土壤流失量为 35.36t。

表 2.1-5 项目水土流失量预测计算成果表

预测时段	预测单元	面积 (m <sup>2</sup> )	预测时段 (a)	侵蚀模数背景值 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	背景流失量 (t)	扰动后侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	流失总量 (t)	新增流失量 (t)	新增占比 (%)
施工期	塔基区	33231	0.60	160	3.19	1560	31.10	27.91	97.51
	牵张场及跨越场区	6200	0.60	160	0.60	980	3.65	3.05	
	施工道路区	5440	0.60	160	0.52	1238	4.04	3.52	
小计	/	44871	/	/	4.31	/	38.79	34.48	
自然恢复期第一年	塔基区	31764	1.00	160	5.08	180	5.72	0.64	2.49
	牵张场及跨越场区	6200	1.00	160	0.99	180	1.12	0.13	
	施工道路区	5440	1.00	160	0.87	180	0.98	0.11	
小计	/	43404	/	/	6.94	/	7.82	0.88	
自然恢复期第二年	塔基区	31764	1.00	160	5.08	160	5.08	/	/
	牵张场及跨越场区	6200	1.00	160	0.99	160	0.99	/	
	施工道路区	5440	1.00	160	0.87	160	0.87	/	
小计	/	43404	/	/	6.94	/	6.94	/	
合计					18.19	/	53.55	35.36	100

注：自然恢复期塔基区水土流失面积已扣除恢复鱼塘及硬化占地。

### 2.1.5 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力的下降、淤积水系等问题，而且治理难度大、费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成水土流失危害进行预测，根据预测结果采取有针对性的防治措施。

工程施工过程中可能造成水土流失危害，主要包括以下几个方面：

(1) 破坏原地貌、加速土壤侵蚀。项目施工过程中扰动原地貌，损坏原有水土保持设施，原地貌破坏后涵养水源、保持水土功能丧失，地表裸露，土壤抗侵蚀能力急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，土壤侵蚀加速。

(2) 项目在基础开挖、机械占压等施工过程中，如遇较强的降雨，若没有防护措施，在降雨及人为因素作用下将会产生大量泥沙，造成较为严重的水土流失，对项目本身的施工安全也会造成一定的威胁。

(3) 工程施工中需开挖、堆置、回填土方，土方装卸堆存过程中易产生粉尘，在风力作用下，也易引起风蚀，并产生大气粉尘污染，对局部生态环境造成不良影响。

## 2.2 水土保持措施布设

### 2.2.1 水土保持措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，补充布设水土保持措施，开发与防治相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时突出重点防治工程措施和临时防治工程措施。各区水土流失防治措施设置情况详见表 2.2-1。

表 2.2-1 防治措施总体布局表

分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
塔基区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/
	临时措施	泥浆沉淀池	防尘网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池
牵张场及跨越场区	工程措施	/	土地整治
	植物措施	/	撒播草籽
	临时措施	铺设钢板	彩条布铺垫
施工道路区	工程措施	/	土地整治

分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
	植物措施	/	/
	临时措施	铺设钢板	/

### 2.2.2 分区措施布设

#### (1) 塔基区

##### ①工程措施

表土剥离:本工程主体设计中已考虑在施工前期对植被良好区域塔基区永久占地、泥浆沉淀池和拆除基础等开挖区域进行表土剥离,剥离面积 10413m<sup>2</sup>,剥离厚度 0.3m,表土剥离量为 3124m<sup>3</sup>。

土地整治:本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区除硬化外裸露地表进行土地整治,主要包括场地清理、平整、表土回覆,整治面积约 31764m<sup>2</sup>,表土回覆量为 3124m<sup>3</sup>,整治后的土地约 1415m<sup>2</sup>进行植被恢复,其余 30349m<sup>2</sup>交由土地权所有人进行复耕。

##### ②植物措施

撒播草籽:本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区占用空闲地区域采取撒播草籽的措施,撒播面积约 1415m<sup>2</sup>,撒播草籽密度 0.015kg/m<sup>2</sup>,撒播总量约 21.225kg。

##### ③临时措施

泥浆沉淀池:为减少钻孔灌注桩施工过程中产生的水土流失,本工程主体设计中已考虑在施工过程中于塔基区灌注桩基础旁设置泥浆沉淀池,对钻渣泥浆进行沉淀和固化处理,禁止将钻渣泥浆排入周围农田和河流,共设置 33 座。泥浆沉淀池采用半挖半填的方式,尺寸根据钻渣泥浆量确定。典型角钢塔泥浆沉淀池尺寸为 12.5m(长)×12m(宽)×2m(深)。

防尘网苫盖:本方案补充在施工过程中对塔基区临时堆土及裸露地表进行防尘网苫盖,苫盖面积约 22000m<sup>2</sup>。

土质排水沟:本方案补充在施工过程中于除占用鱼塘外的塔基区四周设置土质排水沟,平均单桩基础的杆塔每基按 90m 计,共 13 基;群桩承台基础的杆塔每基按 110m 计,共 19 基。塔基区共计开挖排水沟 3260m,排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m,下底宽 0.2m,深 0.2m,边坡比 1:1,开挖土方量约 261m<sup>3</sup>。

土质沉沙池:本方案补充在施工过程中于除占用鱼塘外每基杆塔排水沟末端

设置土质沉沙池，尺寸长×宽×高为 2.0m×1.0m×1.5m，单个沉沙池容积为 3.0m<sup>3</sup>，共计 32 座。

## (2) 牵张场及跨越场区

### ①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对牵张场及跨越场区全区进行土地整治，整治面积 6200m<sup>2</sup>，主要包括场地清理、平整，整治后的土地均交由土地权所有人进行复耕。

### ②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期对塔基区占用绿化带区域采取撒播草籽的措施，撒播面积约 400m<sup>2</sup>，撒播草籽密度 0.015kg/m<sup>2</sup>，撒播总量约 6kg。

### ③临时措施

铺设钢板：为方便机械设备和导线的运输与吊装，本工程主体设计中已考虑在架线期间牵张场地铺设 6mm 厚钢板，以降低重型机械及车辆对表土的扰动，保护表土。施工结束后土地整治即可恢复地表植被。每处牵张场平均铺设钢板 600m<sup>2</sup>，牵张场及跨越场区共需铺设钢板 2400m<sup>2</sup>。

彩条布铺垫：本方案补充在施工过程中对牵张场及跨越场区域裸露地表进行彩条布铺垫，铺垫面积约 3400m<sup>2</sup>。

## (3) 施工道路区

### ①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对施工道路区全区进行土地整治，整治面积 5440m<sup>2</sup>，主要包括场地清理、平整，整治后的土地均交由土地权所有人进行复耕。

### ②临时措施

铺设钢板：为减少对地表的扰动，本工程主体设计中已考虑在施工过程中对施工道路区内松软路面区域铺设一定数量的 6mm 厚钢板，沿线施工道路共需铺设钢板 4200m<sup>2</sup>。

### 2.2.3 水土保持措施工程量汇总

工程水土流失防治措施工程量详见表 2.2-2。

表 2.2-2 本工程水土保持措施工程量汇总表

防治分区	措施类型		内容类别	单位	数量	布设位置	结构形式	实施时间		
塔基区	工程措施	主体 已有	表土剥离	m <sup>3</sup>	3124	塔基永久占地、泥浆沉淀池和拆除塔基等开挖植被良好区域	剥离厚度 0.3m, 剥离面积 10413m <sup>2</sup>	2024.7-2024.9		
			土地整治	m <sup>2</sup>	31764	除硬化和鱼塘外裸露地表	覆土、机械翻耕、施肥	2024.10-2024.11		
	植物措施	主体 已有	撒播草籽	m <sup>2</sup>	1415	占用空闲地区区域	狗牙根草籽 0.015kg/m <sup>2</sup>	2024.11		
	临时措施	主体 已有	方案 新增	泥浆沉淀池	座	33	灌注桩基础旁	半挖半填	2024.7-2024.9	
				防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	22000	临时堆土及裸露地表	6 针, 长×宽: 8m×40m	2024.7-2024.9	
				土质排水沟	长度 土方量	m m <sup>3</sup>	3260 261	除占用鱼塘外的塔基区四周	上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1	2024.7-2024.9
				土质沉沙池	座	32	除占用鱼塘外的塔基排水沟末端	土质, 2.0m×1.0m×1.5m	2024.7-2024.9	
牵张场及跨越场区	工程措施	方案 新增	土地整治	m <sup>2</sup>	6200	全区	机械翻耕、施肥	2024.11		
	植物措施	方案 新增	撒播草籽	m <sup>2</sup>	400	占用道路绿化带区域	狗牙根草籽 0.015kg/m <sup>2</sup>	2024.11		
	临时措施	主体 已有	铺设钢板	m <sup>2</sup>	2400	机器压占区域	6mm 厚钢板	2024.9-2024.10		
			彩条布铺垫	m <sup>2</sup>	3400	裸露地表	加厚三色彩条布	2024.9-2024.10		
施工道路区	工程措施	方案 新增	土地整治	m <sup>2</sup>	5440	全区	机械翻耕、施肥	2024.11		
	临时措施	主体 已有	铺设钢板	m <sup>2</sup>	4200	松软路面区域	6mm 厚钢板	2024.7-2024.9		

2.2.4 防治措施进度安排

参照主体工程施工进度, 各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施, 相互协调, 有序进行。坚持“因地制宜, 因害设防”的原则, 首先安排水土流失严重区域的防治措施, 在措施安排上, 工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑, 施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排, 植物措施可略为滞后, 但须根据植物的生物学特性, 合理安排季节实施, 并在总工期内完成所有水土保持措施。

表 2.2-3 主体工程与水土保持工程实施进度表

防治分区	工程名称	施工期					
		2024 年					
		7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	
塔基区	主体工程		—	—	—	—	—
	工程措施	表土剥离	—	—	—		
		土地整治				—	—

2 水土流失量预测与水土保持措施布设

防治分区	工程名称		施工期				
			2024年				
			7月	8月	9月	10月	11月
	植物措施	撒播草籽					-----
	临时措施	泥浆沉淀池	-----	-----	---		
		防尘网苫盖	-----	-----	---		
		土质排水沟	-----	-----	---		
		土质沉沙池	-----	-----	---		
牵张场及跨越场区	工程措施	土地整治					-----
	植物措施	撒播草籽					---
	临时措施	铺设钢板			-----	-----	
		彩条布铺垫			-----	-----	
施工道路区	工程措施	土地整治					-----
	植物措施	铺设钢板	---	-----	---		

注：“——”为主体工程进度；“-----”为水土保持措施进度。

### 3 水土保持投资估算及效益分析

#### 3.1 投资估算

根据投资估算成果，本方案水土保持工程总投资 133.29 万元，其中主体已有水土保持投资 104.52 万元，方案新增水土保持投资 28.77 万元。在总投资中，工程措施投资 25.70 万元；植物措施投资 0.37 万元；临时措施投资 78.33 万元；独立费用 17.11 万元（其中建设管理费 2.09 万元，设计费 7.41 万元，水土保持监理费 2.61 万元，水土保持设施验收费 5.00 万元），基本预备费 7.29 万元，水土保持补偿费 44871 元。

表 3.1-1 本工程水土保持投资估算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	主体已有	方案新增	合计
1	第一部分工程措施	20.89	4.81	25.70
2	第二部分植物措施	0.29	0.08	0.37
3	第三部分临时措施	62.04	16.29	78.33
4	第四部分独立费用	11.15	5.96	17.11
	一至四部分合计	94.37	27.14	121.51
5	基本预备费 6%	5.66	1.63	7.29
6	水土保持补偿费	4.49	0	4.49
7	水土保持总投资	104.52	28.77	133.29

表 3.1-2 水土保持工程措施投资估算表 单位：万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
<b>1</b>	<b>塔基区</b>	/	/	/	20.89
1.1	表土剥离*	100m <sup>3</sup>	31.24	2490.80	7.78
1.2	土地整治*	hm <sup>2</sup>	3.18	41271.31	13.11
<b>2</b>	<b>牵张场及跨越场区</b>	/	/	/	2.56
2.1	土地整治	hm <sup>2</sup>	0.62	41271.31	2.56
<b>3</b>	<b>施工道路区</b>	/	/	/	2.25
3.1	土地整治	hm <sup>2</sup>	0.54	41271.31	2.25
合计	/	/	/	/	25.70

注：带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-3 水土保持植物措施投资估算表 单位: 万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
<b>1</b>	<b>塔基区</b>	/	/	/	0.29
1.1	撒播草籽*	hm <sup>2</sup>	0.14	20191.11	0.29
<b>2</b>	<b>牵张场及跨越场区</b>	/	/	/	0.08
2.1	撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.04	20191.11	0.08
<b>合计</b>	/	/	/	/	<b>0.37</b>

注: 带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-4 水土保持临时措施投资估算表 单位: 万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
<b>1</b>	<b>塔基区</b>	/	/	/	22.92
1.1	泥浆沉淀池*	座	33	2800	9.24
1.2	防尘网苫盖	100m <sup>2</sup>	220	538.60	11.85
1.3	土质排水沟	100m <sup>3</sup>	2.59	3428.47	0.89
1.4	土质沉沙池	座	32	293.45	0.94
<b>2</b>	<b>牵张场及跨越场区</b>	/	/	/	21.81
2.1	铺设钢板*	m <sup>2</sup>	2400	80	19.20
2.2	彩条布铺垫	100m <sup>2</sup>	34	768.64	2.61
<b>3</b>	<b>施工道路区</b>	/	/	/	33.60
3.1	铺设钢板*	m <sup>2</sup>	4200	80	33.60
<b>合计</b>	/	/	/	/	<b>78.33</b>

注: 带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-5 本工程水土保持其他费用估算详表

编号	工程或费用名称	计算依据	合计
1	建设管理费	(第一~第三部分)×2%	2.09
2	水土保持监理费	(第一~第三部分)×2.5%	2.61
3	设计费	/	7.41
4	水土保持设施验收费	/	5.00
合计			17.11
防治责任范围(m <sup>2</sup> )		单价(元/m <sup>2</sup> )	水土保持补偿费(元)
44871		1.00	44871

## 3.2 效益分析

### 3.2.1 水土流失治理度

至设计水平年,项目建设可能造成水土流失面积 44871m<sup>2</sup>,水土流失治理达标面积 44836m<sup>2</sup>,水土流失治理度可达到 99.9%。具体计算见表 3.2-1。

表 3.2-1 水土流失治理度计算表

防治分区	扰动土地面积 (m <sup>2</sup> )	水土流失面积 (m <sup>2</sup> )	水土流失治理达标面积 (m <sup>2</sup> )				水土流失治理度 (%)	防治标准 (%)	是否达标
			建筑物及场地道路硬化、水域面积	工程措施	植物措施	小计			
塔基区	33231	33231	1467	30349	1390	33206	99.9	98	达标
牵张场及跨越场区	6200	6200	0	5800	390	6190			
施工道路区	5440	5440	0	5440	0	5440			
<b>合计</b>	<b>44871</b>	<b>44871</b>	<b>1467</b>	<b>41589</b>	<b>1780</b>	<b>44836</b>			

注：水土流失治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再重复计列。

### 3.2.2 土壤流失控制比

通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内的每平方公里年平均土壤流失量将小于本工程容许土壤流失量为 500t/(km<sup>2</sup>·a)。至设计水平年各项水保措施发挥作用后，每平方公里年平均土壤流失量可达到 150t/(km<sup>2</sup>·a)，土壤流失控制比可达到 3.3。

### 3.2.3 渣土防护率

本项目临时堆土总量约 15713m<sup>3</sup>，实际挡护临时堆土总量约 15603m<sup>3</sup>，渣土防护率可达到 99.3%。

### 3.2.4 表土保护率

本项目可剥离表土总量为 12420m<sup>3</sup>，在采取保护措施后保护表土数量为 11547m<sup>3</sup>，其中剥离保护的表土 3124m<sup>3</sup>，通过苫盖和铺垫保护的表土量为 8423m<sup>3</sup>，表土保护率可达到 93.0%。

### 3.2.5 林草植被恢复率

本工程可恢复林草植被面积 1815m<sup>2</sup>，林草类植被面积 1780m<sup>2</sup>，林草植被恢复率可达到 98.1%。

表 3.2-2 林草植被恢复率计算表

防治分区	可恢复植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草植被恢复率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	1415	1390	98.1	98	是
牵张场及跨越场区	400	390			
<b>合计</b>	<b>1815</b>	<b>1780</b>			

### 3.2.6 林草覆盖率

本工程建设区总面积 44871m<sup>2</sup>，恢复耕地面积为 41589m<sup>2</sup>，扣除恢复耕地后

面积 3282m<sup>2</sup>，林草类植被面积 1780m<sup>2</sup>，林草覆盖率可达到 54.2%。

表 3.2-3 林草覆盖率统计表

防治分区	防治责任范围 (m <sup>2</sup> )	恢复耕地面积 (m <sup>2</sup> )	扣除恢复耕地后面积 (m <sup>2</sup> )	林草类植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草覆盖率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	33231	30349	2782	1390	54.2	27	是
牵张场及跨越场区	6200	5800	400	390			
施工道路区	5440	5440	0	0			
合计	44871	41589	3282	1780			

### 3.2.7 六项指标达标情况

通过计算分析，至设计水平年水土流失防治目标的实现情况为：水土流失治理度 99.9%、土壤流失控制比 3.3、渣土防护率 99.3%、表土保护率 93.0%、林草植被恢复率 98.1%、林草覆盖率 54.2%。六项指标计算情况详见表 3.2-4。

表 3.2-4 防治效果汇总表

评估指标	计算方法	计算依据	单位	数量	计算结果	防治目标	达标情况
水土流失治理度 (%)	项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比	水土流失治理达标面积	m <sup>2</sup>	44836	99.9	98	达标
		水土流失总面积	m <sup>2</sup>	44871			
土壤流失控制比	项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比	容许土壤流失量	t/(km <sup>2</sup> ·a)	500	3.3	1.0	达标
		侵蚀模数达到值	t/(km <sup>2</sup> ·a)	150			
渣土防护率 (%)	项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比	拦挡临时堆土量	m <sup>3</sup>	15603	99.3	97	达标
		临时堆土总量	m <sup>3</sup>	15713			
表土保护率 (%)	项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比	保护的表土数量	m <sup>3</sup>	11547	93.0	92	达标
		可剥离表土总量	m <sup>3</sup>	12420			
林草植被恢复率 (%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比	林草类植被面积	m <sup>2</sup>	1780	98.1	98	达标
		可恢复林草植被面积	m <sup>2</sup>	1815			
林草覆盖率 (%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比	林草类植被面积	m <sup>2</sup>	1780	54.2	27	达标
		项目建设区面积 (扣除恢复耕地后面积)	m <sup>2</sup>	3282			

### 3.3 水土保持管理

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），确保本水土保持方案防治措施按“三同时”的要求顺利实施，充分发挥水土保持措施的作用，使项目建设过程中的水土流失控制在方案目标值以内，促进项目区及周边生态环境的良性发展，特提出以下保证措施。

#### 3.3.1 组织管理

根据国家有关法律法规，本工程水土保持方案为报告表项目，实施承诺制管理。建设单位承诺已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务；所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求；严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备；依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费；积极配合水土保持监督检查；愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。水土保持方案在报批前，生产建设单位应当通过其网站、生产建设项目所在地公共媒体网站或者相关政府网站向社会公开拟报批的水土保持方案全文，且持续公开期限不得少于10个工作日。对于公众提出的问题和意见，生产建设单位应当逐一处理与回应，并在水土保持行政许可承诺书中予以说明。

报告表经江苏省水利厅批复后，建设单位将成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，全力保证水土保持工作按计划进行。水土保持方案实施管理机构主要工作职责如下：①认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益；②建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，制定水土保持方案详细实施计划；③工程施工期间，与设计、施工单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持设施的正常建设，最大限度减少人为造成的水土流失与生态环境的破坏；④深入

工程现场进行检查,掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况;⑤建立、健全各项档案,积累、分析整编资料,为水土保持工程验收提供相关资料。

### 3.3.2 后续设计

本项目初步设计已取得评审意见,水土保持措施后续应纳入施工图设计中。水土保持方案经批准后,对照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号),生产建设项目地点、规模发生重大变化,水土保持措施发生重大变更的,生产建设单位应当补充水土保持方案变更报告或修改水土保持方案,报江苏省水利厅审批。

### 3.3.3 水土保持监测和监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)和《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号)中相关规定。对报告表项目水土保持监测工作未提出要求,因此,本工程建设单位可依据需要自行开展水土保持监测工作。凡主体工程开展监理工作的生产建设项目,应当按照国家建设监理、水土保持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件、工程施工合同、监理合同等,开展水土保持监理工作,由于本工程征占地面积在50公顷以下且挖填土石方总量在50万立方米以下,因此不对水土保持监理单位的人员配备和资质提出要求。

### 3.3.4 水土保持施工

施工过程中应注重保护表土植被,严格控制和管理车辆机械的运行范围,必要时设立保护地表及植被的警示牌,防止扩大对地表的扰动。对临时排水设施应进行经常性检查维护,保证其排水通畅。对建成的水土保持设施应有明确的管理维护要求。工程措施施工时,应对施工质量实时检查,对不符合设计要求或质量要求的工程,责令其重建,直到满足要求为止。植物措施工程施工时,应注意加强植物措施的后期管护工作,确保各种植物的成活率,发挥植物措施的水土保持效益。

### 3.3.5 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)、《水利部关于进一步深化“放管服”改革

全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）和《生产建设项目水土保持管理办法》（水利部令第53号），生产建设项目的水土保持设施验收，由生产建设单位自主开展。

生产建设单位应当根据水土保持方案（含重大变更）及其审批决定等，组织第三方机构依法编制水土保持设施验收报告。

同一项目的水土保持方案技术评审、水土保持方案编制单位、监理单位、监测单位不得承担水土保持设施验收报告编制工作。

实行承诺制或备案制管理的项目，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。

水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。存在下列情形之一的，水土保持设施验收结论应当为不合格：

- （一）未依法依规履行水土保持方案编报审批程序或者开展水土保持监测、监理的；
- （二）弃土弃渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；
- （三）水土保持措施体系、等级和标准或者水土流失防治指标未按照水土保持方案批复要求落实的；
- （四）存在水土流失风险隐患的；
- （五）水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的；
- （六）水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的；
- （七）未依法依规缴纳水土保持补偿费的；
- （八）存在法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形的。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收鉴定书，公示时间不得少于20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时处理或者回应。生产建设单位、水土保持设施验收单位和水土保持监测单位分别对各自所出具材料的真实性负责。

生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向审批水土保持方案的江苏省水利厅报备验收材料。依法编制水土保持报告表和实行承诺制管理的生产建设项目，水土保持设施验收报备时只需提交水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书和向社会公开的时间、地点及方式等材料。

生产建设项目水土保持设施验收合格后，生产建设单位或者运行管理单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

附

图

